


Sixhaven Conceptplanning obv overleg 9.5.2023

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Timeline											
							apr '23	mei '23	jun '23	jul '23	aug '23	sep '23	okt '23	nov '23	dec '23	jan '24	feb '24	mrt '24
1	<b>Sixhaven planning detail</b>																	
2																		
3	<b>Stipo placemaking</b>	<b>240 dagen</b>	<b>4-4-2023</b>	<b>4-3-2024</b>														
4	Startbijeenkomst	0 dagen	15-5-2023	15-5-2023	11	12;8												
5	kleinschalige gratis activiteiten	240 dagen	4-4-2023	4-3-2024														
6																		
7	<b>Raming</b>	<b>14 dagen</b>	<b>15-5-2023</b>	<b>1-6-2023</b>														
8	Raming aanpassen	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023	4	20												
9																		
10	<b>Ontwerp</b>	<b>109 dagen</b>	<b>2-5-2023</b>	<b>2-10-2023</b>														
11	Schetsontwerp	9 dagen	2-5-2023	12-5-2023		4												
12	Vo opstellen	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023	4	20;13												
13	VO vaststellen	10 dagen	2-6-2023	15-6-2023	12	14												
14	VO vastgesteld	0 dagen	15-6-2023	15-6-2023	13	21;25												
15	Definitief VO	0 dagen	3-7-2023	3-7-2023	21	22												
16	Do uitwerken	20 dagen	4-9-2023	29-9-2023	22	17												
17	Definitief DO	0 dagen	2-10-2023	2-10-2023	16	30												
18																		
19	<b>Toetsen</b>	<b>66 dagen</b>	<b>2-6-2023</b>	<b>1-9-2023</b>														
20	Toetsteam + BAP	10 dagen	2-6-2023	15-6-2023	8;12	21												
21	Naar OG	12 dagen	16-6-2023	3-7-2023	20;14	15												
22	DB + Portefeuillehouder + SD commissie (en vakantierecess)	44 dagen	4-7-2023	1-9-2023	15	16;26BE-2 wkn												
23	Do toetsen?																	
24	<b>Bestek</b>	<b>60 dagen</b>	<b>7-8-2023</b>	<b>27-10-2023</b>														
25	Uitvragen bestek uitvoering	2 wkn	7-8-2023	18-8-2023	14	26												
26	Uitvoeren bestek uitvoering	8 wkn	21-8-2023	13-10-2023	25;22BE-2 wkn	27												
27	Toetsen bestek uitvoering	2 wkn	16-10-2023	27-10-2023	26	30												
28																		
29	<b>Aanbesteden</b>	<b>60 dagen</b>	<b>30-10-2023</b>	<b>19-1-2024</b>														
30	Aanbesteden (duur ntb door <sup>5.1, 2, e</sup> 5.1, 2, e)	60 dagen	30-10-2023	19-1-2024	27;17	34;31GB+4 wkn												
31	opdracht vergeven bomen	10 dagen	27-11-2023	8-12-2023	30GB+4 wkn	35												
32																		
33	<b>Uitvoering</b>	<b>70 dagen</b>	<b>19-1-2024</b>	<b>26-4-2024</b>														
34	Start uitvoering	0 dagen	19-1-2024	19-1-2024	30	35BE+4 wkn												
35	Bomen plaatsen	10 dagen	19-2-2024	1-3-2024	31;34BE+4 wkn	36												
36	uitvoering maaiveld	40 dagen	4-3-2024	26-4-2024	35	37												
37	Uitvoering gereed	0 dagen	26-4-2024	26-4-2024	36													
38																		
39	<b>Randvoorwaarden</b>	<b>0 dagen</b>	<b>2-5-2023</b>	<b>2-5-2023</b>														
40	ntb																	
41																		
42	<b>Data uit projectplan</b>	<b>0 dagen</b>	<b>2-5-2023</b>	<b>2-5-2023</b>														
43	ntb																	

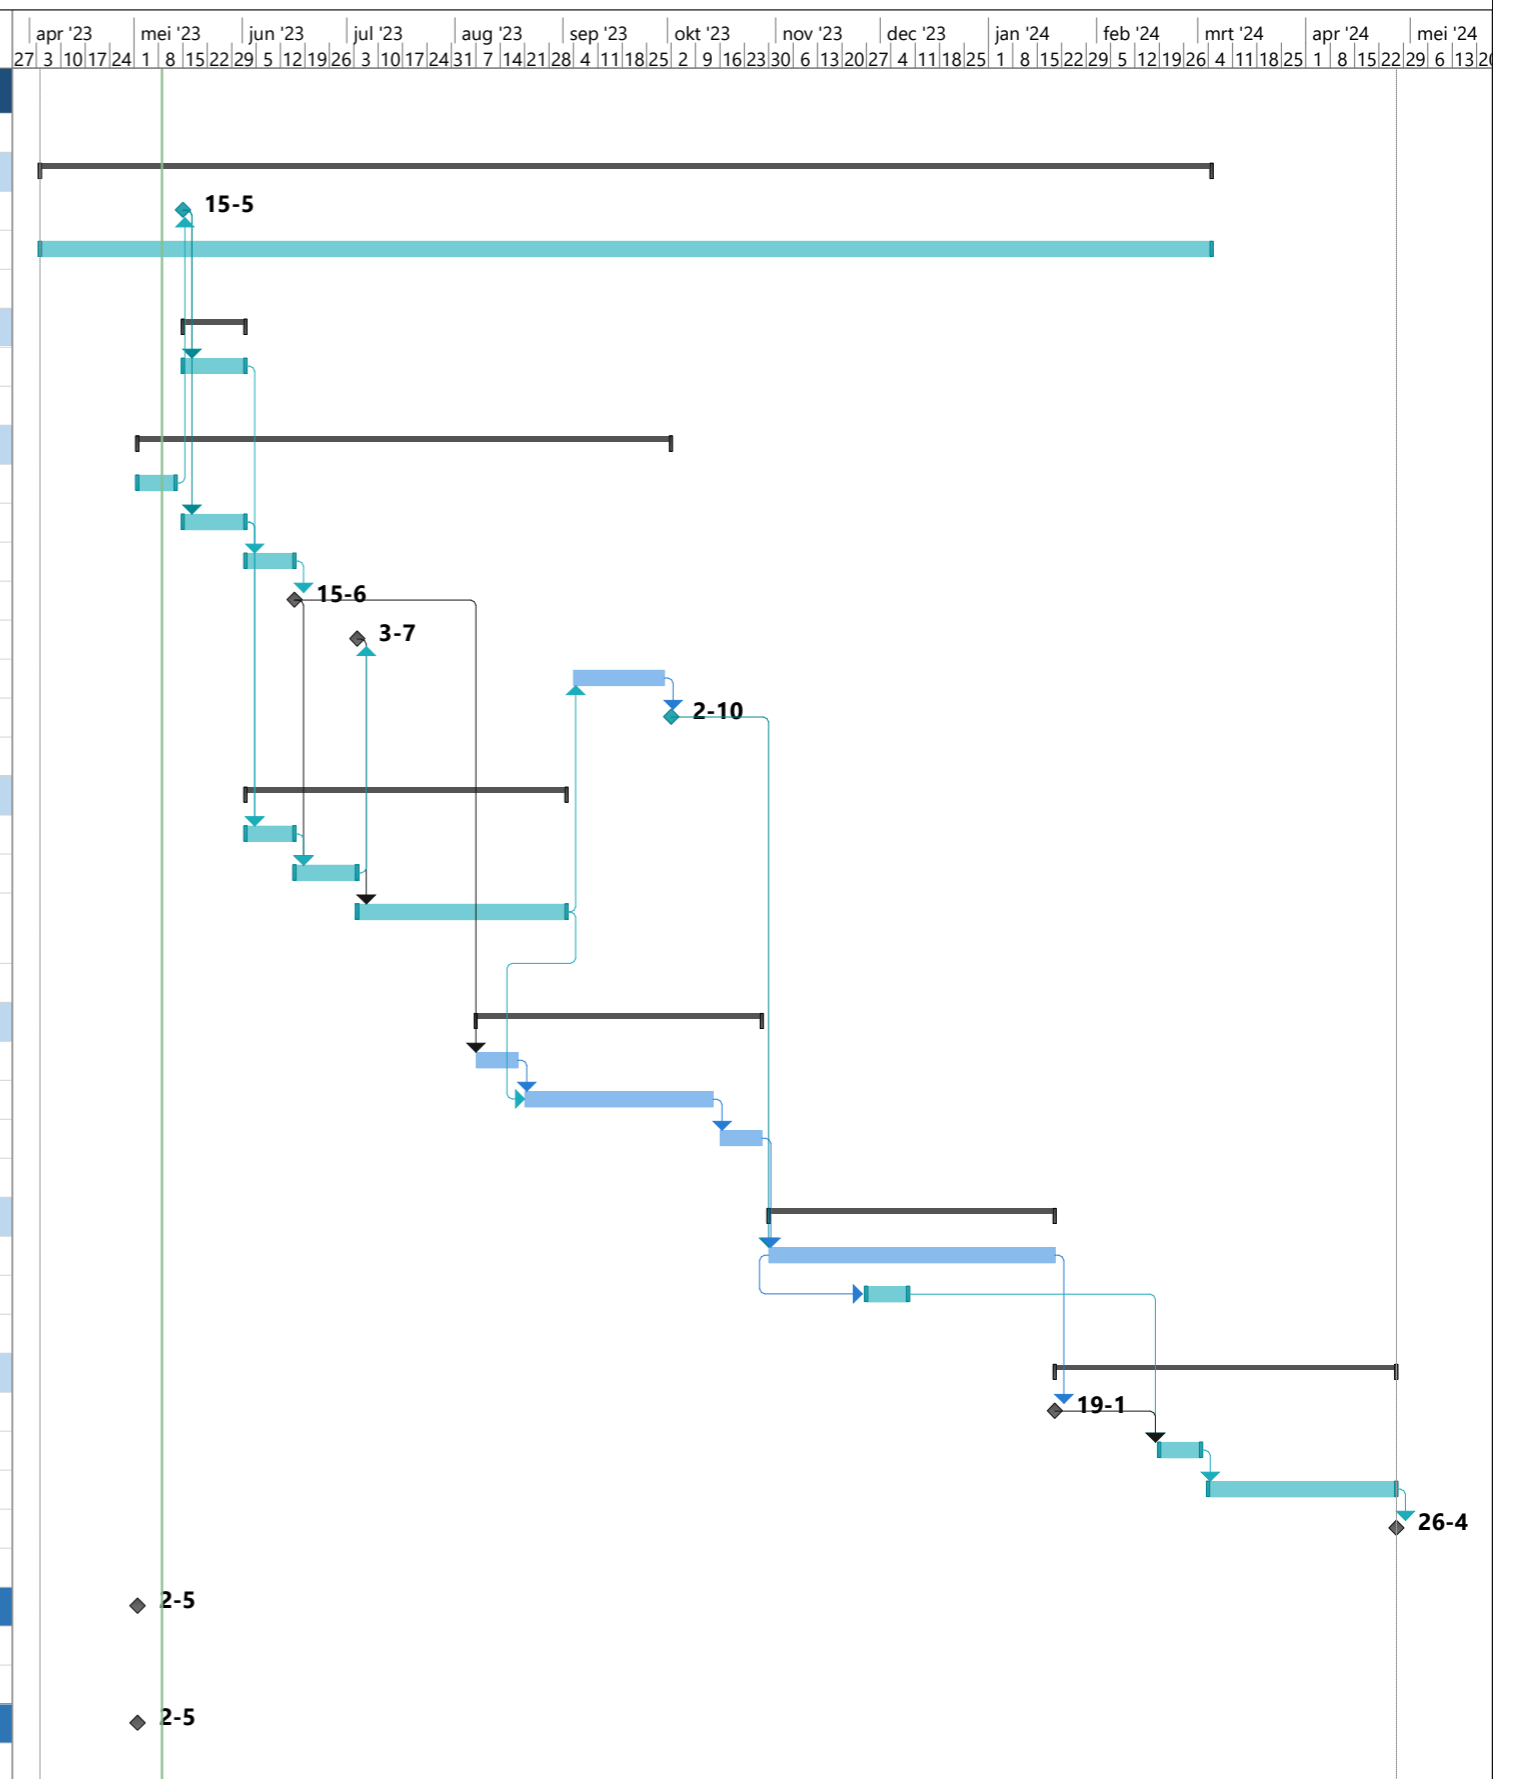

Project: Sixhaven planning 9.5 Datum: 9-5-2023	Taak		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Alleen begindatum		Deadline	
	Splitting		Inactieve taken		Alleen duur		Alleen einddatum		Voortgang	
	Mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang, handmatig	
	Samenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal			
