


Wildemanbuurt - Detailplanning

19/7/2024 Door: Triode


Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	Wildemanbuurt	571,8 wkn	woe 1-5-24	maa 14-1-41	
2	Participatie (Sociaal plan)	571,6 wkn	din 18-6-24	vri 1-6-35	
3	Buurt meet-ups	571,6 wkn	din 18-6-24	vri 1-6-35	
4	Meet up	0 wkn	din 18-6-24	din 18-6-24	
5	Meet up	0 wkn	din 16-7-24	din 16-7-24	
6	Meet up	0 wkn	din 17-12-24	din 17-12-24	
7	Buurt meet-ups	521,8 wkn	zon 1-6-25	vri 1-6-35	
8	Meet up 1	0 wkn	zon 1-6-25	zon 1-6-25	
9	Meet up 2	0 wkn	maa 1-12-25	maa 1-12-25	
10	Meet up 3	0 wkn	maa 1-6-26	maa 1-6-26	
11	Meet up 4	0 wkn	din 1-12-26	din 1-12-26	
12	Meet up 5	0 wkn	din 1-6-27	din 1-6-27	
13	Meet up 6	0 wkn	woe 1-12-27	woe 1-12-27	
14	Meet up 7	0 wkn	don 1-6-28	don 1-6-28	
15	Meet up 8	0 wkn	vri 1-12-28	vri 1-12-28	
16	Meet up 9	0 wkn	vri 1-6-29	vri 1-6-29	
17	Meet up 10	0 wkn	zat 1-12-29	zat 1-12-29	
18	Meet up 11	0 wkn	zat 1-6-30	zat 1-6-30	
19	Meet up 12	0 wkn	zon 1-12-30	zon 1-12-30	
20	Meet up 13	0 wkn	zon 1-6-31	zon 1-6-31	
21	Meet up 14	0 wkn	maa 1-12-31	maa 1-12-31	
22	Meet up 15	0 wkn	din 1-6-32	din 1-6-32	
23	Meet up 16	0 wkn	woe 1-12-32	woe 1-12-32	
24	Meet up 17	0 wkn	woe 1-6-33	woe 1-6-33	
25	Meet up 18	0 wkn	don 1-12-33	don 1-12-33	
26	Meet up 19	0 wkn	don 1-6-34	don 1-6-34	
27	Meet up 20	0 wkn	vri 1-12-34	vri 1-12-34	
28	Meet up 21	0 wkn	vri 1-6-35	vri 1-6-35	
29	Contractering gemeente	15,3 wkn	maa 29-7-24	din 12-11-24	
30	Afspraakenbrief	15,3 wkn	maa 29-7-24	din 12-11-24	
31	Opstellen afspraakenbrief	15 wkn	maa 29-7-24	vri 8-11-24	54GE-0,2 wkn
32	Ondertekenen afspraakenbrief	0 wkn	din 12-11-24	din 12-11-24	54BE+0,1 wkn
33	Conceptontwikkeling	12,9 wkn	woe 17-7-24	din 15-10-24	
34	Opdracht uitzetten voor begeleiden traject	2 wkn	woe 17-7-24	din 30-7-24	39
35	Sessies starten intern/extern met betrokkenen	2 wkn	woe 31-7-24	din 13-8-24	34
36	Conceptdocument incl plan van aanpak/visie	4,4 wkn	woe 14-8-24	don 12-9-24	35
37	Start placemaking en verder	4,5 wkn	vri 13-9-24	din 15-10-24	36
38	Besluitvorming SGN	376,2 wkn	woe 1-5-24	woe 16-7-31	
39	Kaderbesluit en herijking jaarlijks (2024)	11 wkn	woe 1-5-24	din 16-7-24	
40	Kaderbesluit en herijking jaarlijks (2025)	11 wkn	don 1-5-25	woe 16-7-25	39BE+41,2 wkn
41	derbesluit en herijking jaarlijks (2026)	11 wkn	vri 1-5-26	don 16-7-26	40BE+41,2 wkn
42	derbesluit en herijking jaarlijks (2027)	11 wkn	maa 3-5-27	vri 16-7-27	41BE+41,2 wkn
43	derbesluit en herijking jaarlijks (2028)	11 wkn	maa 1-5-28	maa 17-7-28	42BE+41,1 wkn
44	derbesluit en herijking jaarlijks (2029)	11 wkn	din 1-5-29	maa 16-7-29	43BE+41,1 wkn
45	derbesluit en herijking jaarlijks (2030)	11 wkn	woe 1-5-30	din 16-7-30	44BE+41,2 wkn
46	Kaderbesluit en herijking jaarlijks (2031)	11 wkn	don 1-5-31	woe 16-7-31	45BE+41,2 wkn
47	RO procedures	187 wkn	maa 2-9-24	vri 31-3-28	
48	Onderzoeken (voor M.E.R aanmeldnotitie)	8,6 wkn	maa 2-9-24	woe 30-10-24	
49	M.E.R aanmeldnotitie	20 wkn	don 31-10-24	woe 19-3-25	
50	Opstellen en indienen aanmeldnotitie	8 wkn	don 31-10-24	woe 25-12-24	48
51	Beslissing screening (of een volledige MER noodzakelijk is)	12 wkn	don 26-12-24	woe 19-3-25	50
52	Update alles onderzoeken	12 wkn	maa 10-1-28	vri 31-3-28	147
53	Stedenbouwkundig plan	24 wkn	din 1-10-24	maa 17-3-25	
54	Inspraak SP	6 wkn	din 1-10-24	maa 11-11-24	
55	Verwerken reacties	4,6 wkn	din 12-11-24	don 12-12-24	54
56	Opstellen SP definitief	4,4 wkn	vri 13-12-24	maa 13-1-25	55
57	SP definitief gereed	0 wkn	maa 13-1-25	maa 13-1-25	56
58	Gemeenteraad besluitvorming	9 wkn	din 14-1-25	maa 17-3-25	57
59	Fase 1	280 wkn	woe 1-5-24	din 11-9-29	
60	Haalbaarheid	136,4 wkn	woe 1-5-24	don 10-12-26	
61	Investeringsbesluit fase 1	8,6 wkn	woe 1-5-24	vri 28-6-24	39GB
62	Projectbesluit fase 1	8 wkn	vri 4-4-25	don 29-5-25	76GE
63	Sociaalplan & participatie	28,2 wkn	maa 2-9-24	maa 17-3-25	
64	Woonwensenonderzoek 1	2 wkn	maa 2-9-24	vri 13-9-24	
65	Uitwerking sociaalplan fase 1	26,2 wkn	maa 16-9-24	maa 17-3-25	64
66	Herhuisvesting	90,6 wkn	din 18-3-25	don 10-12-26	
67	1e peildatum aanvragen	8 wkn	din 18-3-25	maa 12-5-25	65
68	Besluit peildatum 1e herhuisvesting	0 wkn	maa 12-5-25	maa 12-5-25	67
69	Herhuisvesting fase 1	82,6 wkn	din 13-5-25	don 10-12-26	68
70	Architecten selectie	12 wkn	vri 13-12-24	don 6-3-25	
71	Voorbereiding voor architectenselectie	4 wkn	vri 13-12-24	don 9-1-25	55
72	Betrokkenheid huurders selectie architect	8 wkn	vri 10-1-25	don 6-3-25	71
73	Ontwerp	101 wkn	vri 7-3-25	don 11-2-27	
74	Bouwplan	89 wkn	vri 7-3-25	don 19-11-26	
75	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	vri 7-3-25	don 29-5-25	72
76	SO gereed	0 wkn	don 29-5-25	don 29-5-25	75
77	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	vri 30-5-25	don 10-7-25	76
78	Aannemersselectie (op basis van SO)	12,8 wkn	vri 11-7-25	woe 8-10-25	77
79	Aannemer geselecteerd	0 wkn	woe 8-10-25	woe 8-10-25	78
80	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	13 wkn	don 9-10-25	woe 7-1-26	79
81	VO gereed	0 wkn	woe 7-1-26	woe 7-1-26	80
82	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13,2 wkn	don 8-1-26	don 9-4-26	81
83	DO gereed	0 wkn	don 9-4-26	don 9-4-26	82
84	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	vri 10-4-26	don 21-5-26	83
85	Opstellen technische ontwerp (TO)	26 wkn	vri 22-5-26	don 19-11-26	84
86	TO gereed	0 wkn	don 19-11-26	don 19-11-26	85
87	Wenstace procedure	52 wkn	vri 13-2-26	don 11-2-27	112GB-78 wkn
88	Voorbereiding	109 wkn	vri 11-7-25	don 12-8-27	
89	RO procedures	89 wkn	vri 11-7-25	don 25-3-27	
90	Afwijkingsprocedure (na SO)	26 wkn	vri 11-7-25	don 8-1-26	
91	Documenten voorbereiding en aanvraag indienen	8 wkn	vri 11-7-25	don 4-9-25	51;77

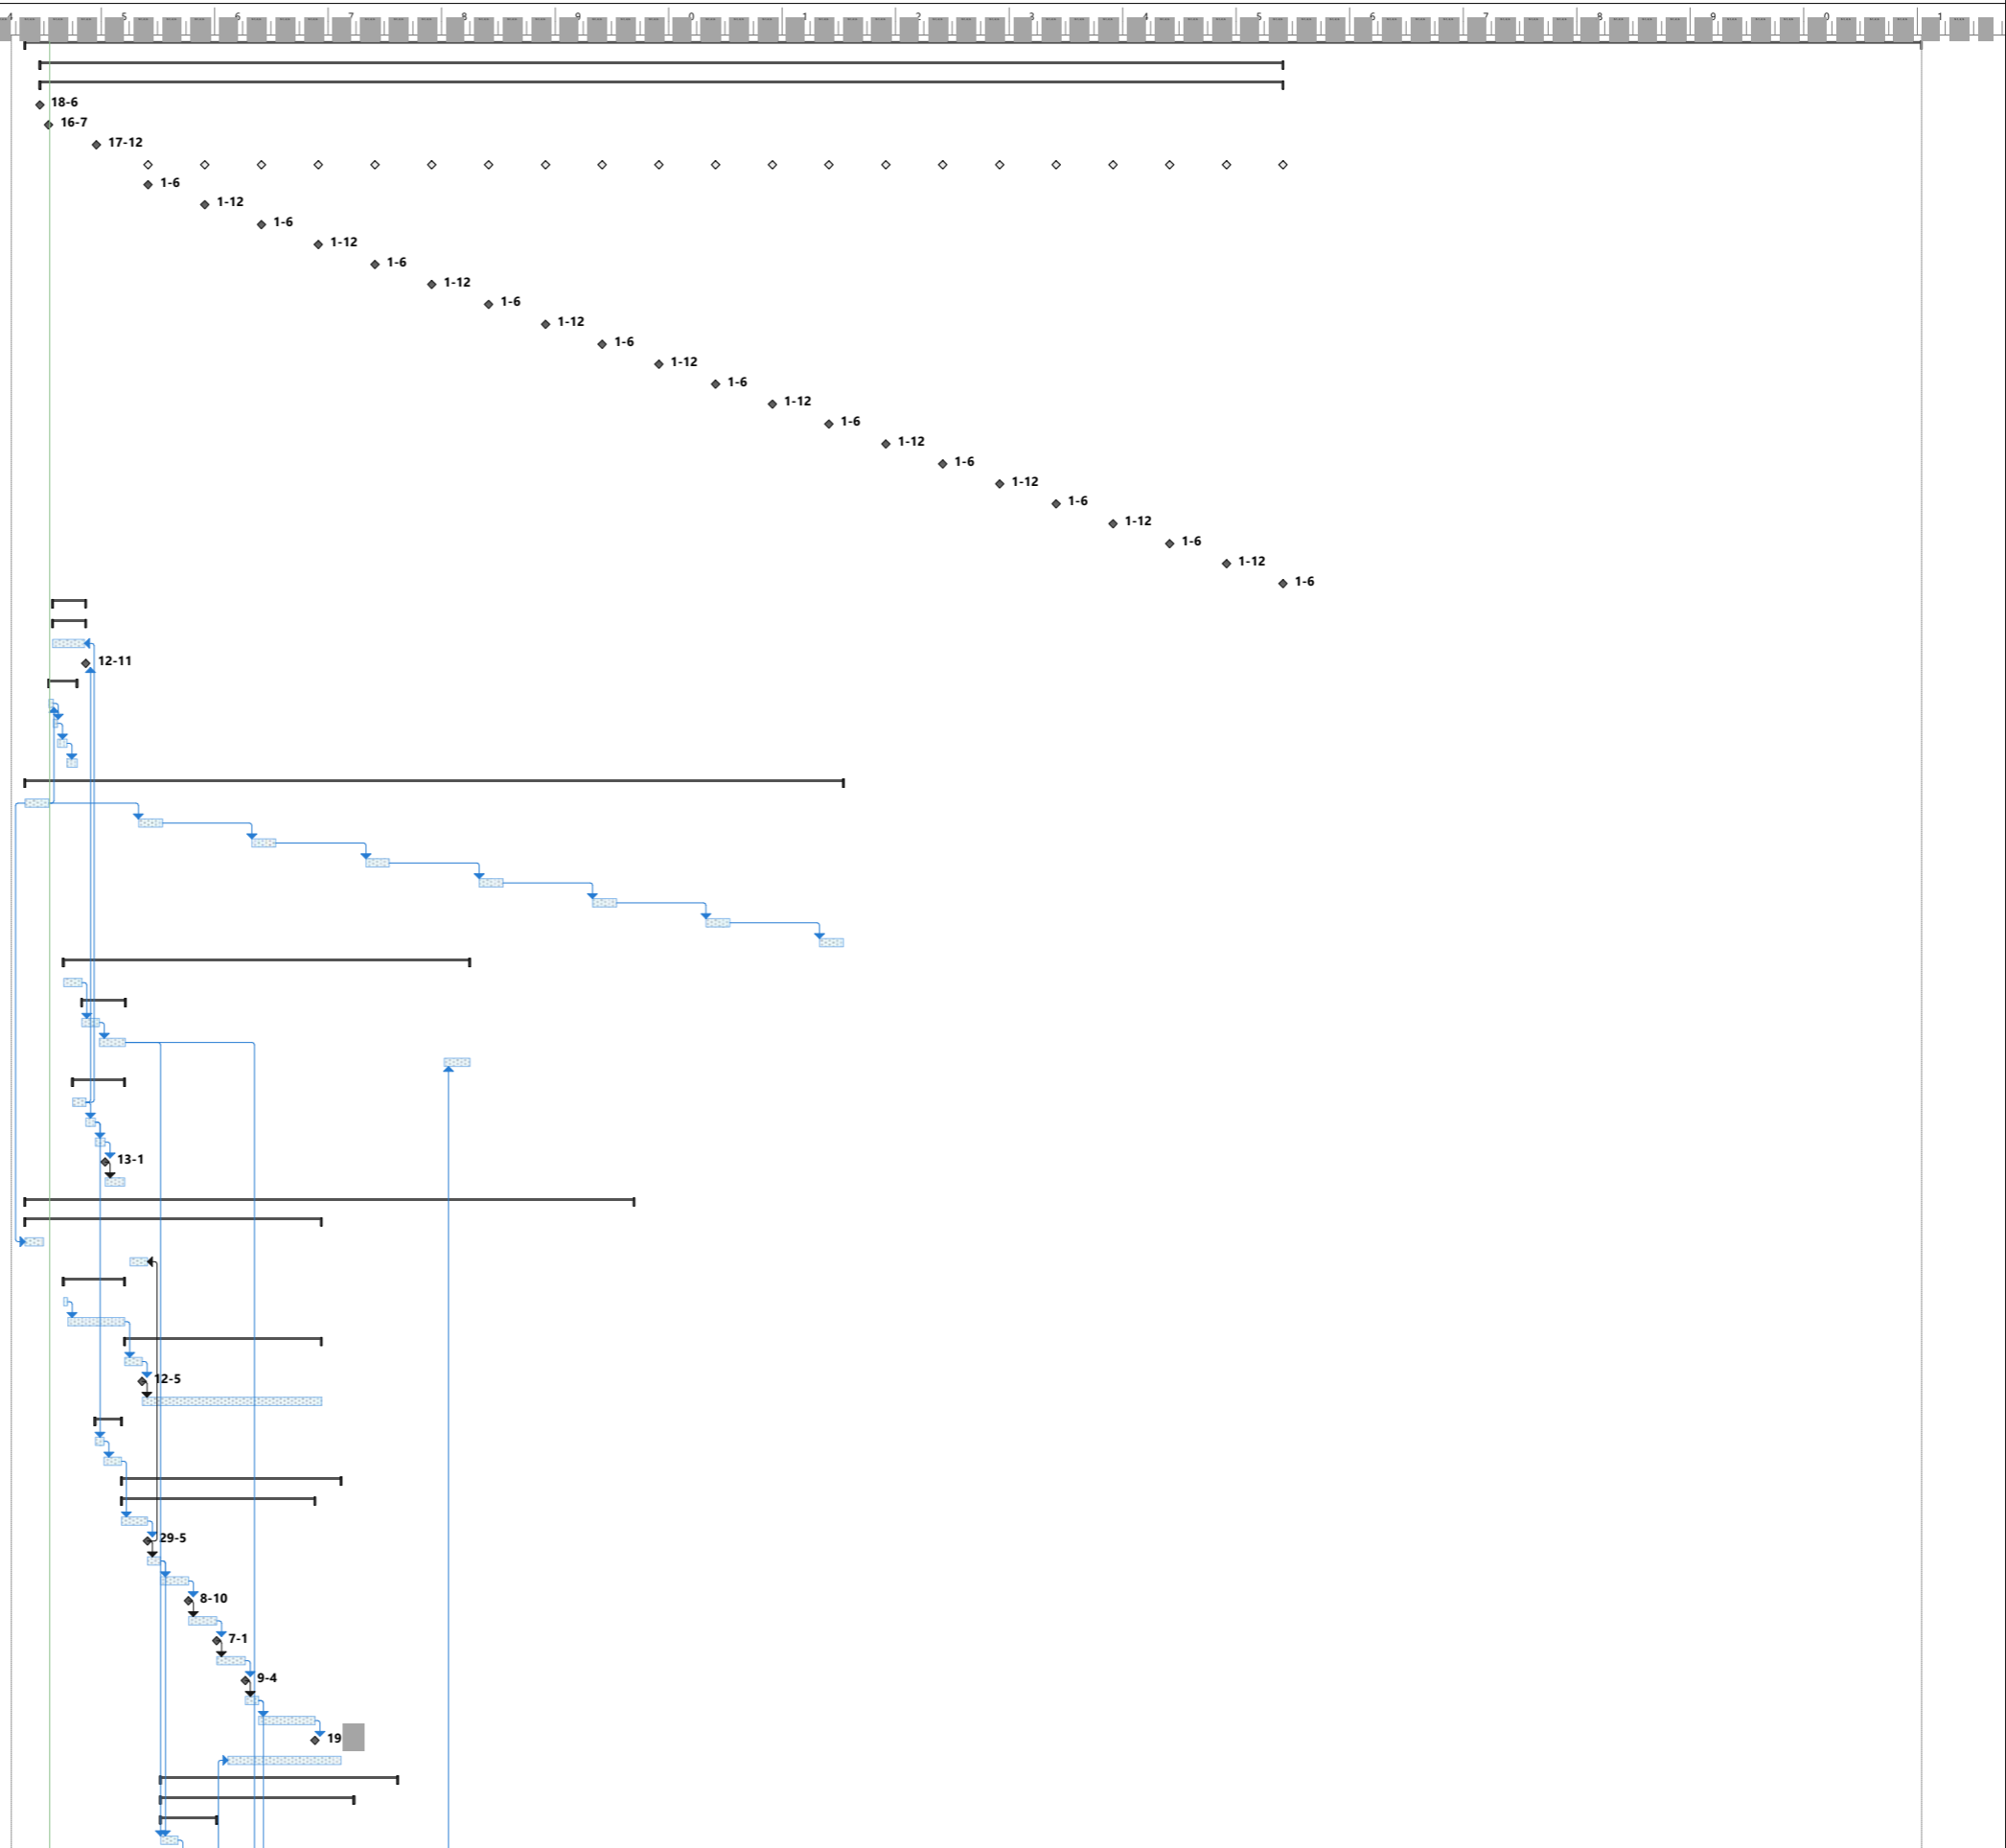

Wildemanbuurt - Detailplanning

19/7/2024 Door: Triode


Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
92	Ter inzage legging en consultatie	6 wkn	vri 5-9-25	don 16-10-25	91
93	Beoordeling	8 wkn	vri 17-10-25	don 11-12-25	92
94	Besluit	4 wkn	vri 12-12-25	don 8-1-26	93
95	Afwijking verleend	0 wkn	don 8-1-26	don 8-1-26	94
96	Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	don 21-5-26	don 19-11-26	
97	Indienen aanvraag omgevingsvergunning	0 wkn	don 21-5-26	don 21-5-26	84,51
98	Behandeling aanvraag	20 wkn	vri 22-5-26	don 8-10-26	97
99	Vergunning verleend	0 wkn	don 8-10-26	don 8-10-26	98
100	Bezwaartermijn	6 wkn	vri 9-10-26	don 19-11-26	99
101	Vergunning onherroepelijk	0 wkn	don 19-11-26	don 19-11-26	100
102	Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	don 19-11-26	don 25-3-27	
103	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	don 19-11-26	don 19-11-26	101
104	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	vri 20-11-26	don 11-2-27	103
105	Erfpacht acceptatie	4 wkn	vri 12-2-27	don 11-3-27	104
106	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	vri 12-3-27	don 25-3-27	105
107	Sloop en bouwrijp maken	24 wkn	vri 26-2-27	don 12-8-27	
108	Sloophmelding	0 wkn	vri 26-2-27	vri 26-2-27	109GB-4 wkn
109	Sloop	12 wkn	vri 26-3-27	don 17-6-27	106
110	Bouwrijp maken	8 wkn	vri 18-6-27	don 12-8-27	109
111	Realisatie	108,6 wkn	vri 13-8-27	din 11-9-29	
112	Bouw	104,6 wkn	vri 13-8-27	din 14-8-29	110
113	Bouw gereed	0 wkn	din 14-8-29	din 14-8-29	112
114	Oplevering	4 wkn	woe 15-8-29	din 11-9-29	113
115	Oplevering fase 1 gereed	0 wkn	din 11-9-29	din 11-9-29	114
116	Fase 2	245 wkn	maa 2-2-26	vri 11-10-30	
117	Definitie	125,4 wkn	maa 2-2-26	din 27-6-28	
118	Investeringsbesluit fase 2	8,8 wkn	maa 2-2-26	don 2-4-26	
119	Projectbesluit fase 2	8 wkn	maa 25-5-26	vri 17-7-26	132GE
120	Sociaalplan & participatie	32,4 wkn	vri 20-3-26	maa 2-11-26	
121	Woonwensenonderzoek 2	2 wkn	vri 20-3-26	don 2-4-26	118GE
122	Uitwerking sociaalplan fase 2	26,4 wkn	vri 1-5-26	maa 2-11-26	121
123	Herhuisvesting	86,2 wkn	din 3-11-26	din 27-6-28	
124	2e peildatum aanvragen	8 wkn	din 3-11-26	maa 28-12-26	122
125	Besluit peildatum 2de herhuisvesting	0 wkn	maa 28-12-26	maa 28-12-26	124
126	Herhuisvesting fase 2	78,2 wkn	din 29-12-26	din 27-6-28	125
127	Architecten selectie (fase 2 & 4)	12 wkn	maa 2-2-26	vri 24-4-26	
128	Voorbereiding voor architectenselectie	4 wkn	maa 2-2-26	vri 27-2-26	
129	Betrokkenheid huurders selectie architect	8 wkn	maa 2-3-26	vri 24-4-26	128
130	Ontwerp	101 wkn	maa 27-4-26	vri 31-3-28	
131	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	maa 27-4-26	vri 17-7-26	129;118
132	SO gereed	0 wkn	vri 17-7-26	vri 17-7-26	131
133	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	maa 20-7-26	vri 28-8-26	132
134	Aannemerselectie (op basis van SO)	13,2 wkn	maa 31-8-26	maa 30-11-26	133
135	Aannemer geselecteerd	0 wkn	maa 30-11-26	maa 30-11-26	134
136	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	12,8 wkn	din 1-12-26	vri 26-2-27	135
137	VO gereed	0 wkn	vri 26-2-27	vri 26-2-27	136
138	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13 wkn	maa 1-3-27	vri 28-5-27	137
139	DO gereed	0 wkn	vri 28-5-27	vri 28-5-27	138
140	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	maa 31-5-27	vri 9-7-27	139
141	Opstellen technische ontwerp (TO)	26,2 wkn	maa 31-5-27	maa 29-11-27	139
142	TO gereed	0 wkn	maa 29-11-27	maa 29-11-27	141
143	Wenstrace procedure	52 wkn	maa 5-4-27	vri 31-3-28	158GB-78 wkn
144	Voorbereiding	109 wkn	maa 31-8-26	vri 29-9-28	
145	RO procedures	89 wkn	maa 31-8-26	vri 12-5-28	
146	Fase 2: Afwijkingprocedure (na SO)	26 wkn	maa 31-8-26	vri 26-2-27	133
147	Fase 2: Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	maa 12-7-27	vri 7-1-28	140
148	Fase 2: Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	vri 7-1-28	vri 12-5-28	
149	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	vri 7-1-28	vri 7-1-28	147
150	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	maa 10-1-28	vri 31-3-28	149
151	Erfpacht acceptatie	4 wkn	maa 3-4-28	vri 28-4-28	150
152	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	maa 1-5-28	vri 12-5-28	151
153	Sloop & Bouwrijpmaken	24 wkn	maa 17-4-28	vri 29-9-28	
154	Sloophmelding	0 wkn	maa 17-4-28	maa 17-4-28	155GB-4 wkn
155	Sloop	12 wkn	maa 15-5-28	vri 4-8-28	152
156	Bouwrijp maken	8 wkn	maa 7-8-28	vri 29-9-28	155
157	Realisatie	106 wkn	maa 2-10-28	vri 11-10-30	
158	Bouw	102 wkn	maa 2-10-28	vri 13-9-30	156
159	Bouw gereed	0 wkn	vri 13-9-30	vri 13-9-30	158
160	Oplevering	4 wkn	maa 16-9-30	vri 11-10-30	159
161	Oplevering fase 2 gereed	0 wkn	vri 11-10-30	vri 11-10-30	160
162	Fase 3	245 wkn	maa 1-11-27	vri 9-7-32	
163	Definitie	121,4 wkn	maa 1-11-27	din 26-2-30	
164	Investeringsbesluit fase 3	8,6 wkn	woe 3-11-27	vri 31-12-27	
165	Projectbesluit fase 3	8 wkn	maa 21-2-28	vri 14-4-28	178GE
166	Sociaalplan & participatie	28,4 wkn	maa 20-12-27	din 4-7-28	
167	Woonwensenonderzoek 3	2 wkn	maa 20-12-27	vri 31-12-27	164GE
168	Uitwerking sociaalplan fase 3	26,4 wkn	maa 3-1-28	din 4-7-28	167
169	Herhuisvesting	86 wkn	woe 5-7-28	din 26-2-30	
170	3e peildatum aanvragen	8 wkn	woe 5-7-28	din 29-8-28	168
171	Besluit peildatum 3e herhuisvesting	0 wkn	din 29-8-28	din 29-8-28	170
172	Herhuisvesting fase 3	78 wkn	woe 30-8-28	din 26-2-30	171
173	Architecten selectie	12 wkn	maa 1-11-27	vri 21-1-28	
174	Voorbereiding voor architectenselectie	4 wkn	maa 1-11-27	vri 26-11-27	
175	Betrokkenheid huurders selectie architect	8 wkn	maa 29-11-27	vri 21-1-28	174
176	Ontwerp	101 wkn	maa 24-1-28	vri 28-12-29	
177	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	maa 24-1-28	vri 14-4-28	175;164
178	SO gereed	0 wkn	vri 14-4-28	vri 14-4-28	177
179	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	maa 17-4-28	vri 26-5-28	178
180	Aannemerselectie (op basis van SO)	13 wkn	maa 29-5-28	vri 25-8-28	179
181	Aannemer geselecteerd	0 wkn	vri 25-8-28	vri 25-8-28	180
182	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	13 wkn	maa 28-8-28	vri 24-11-28	181

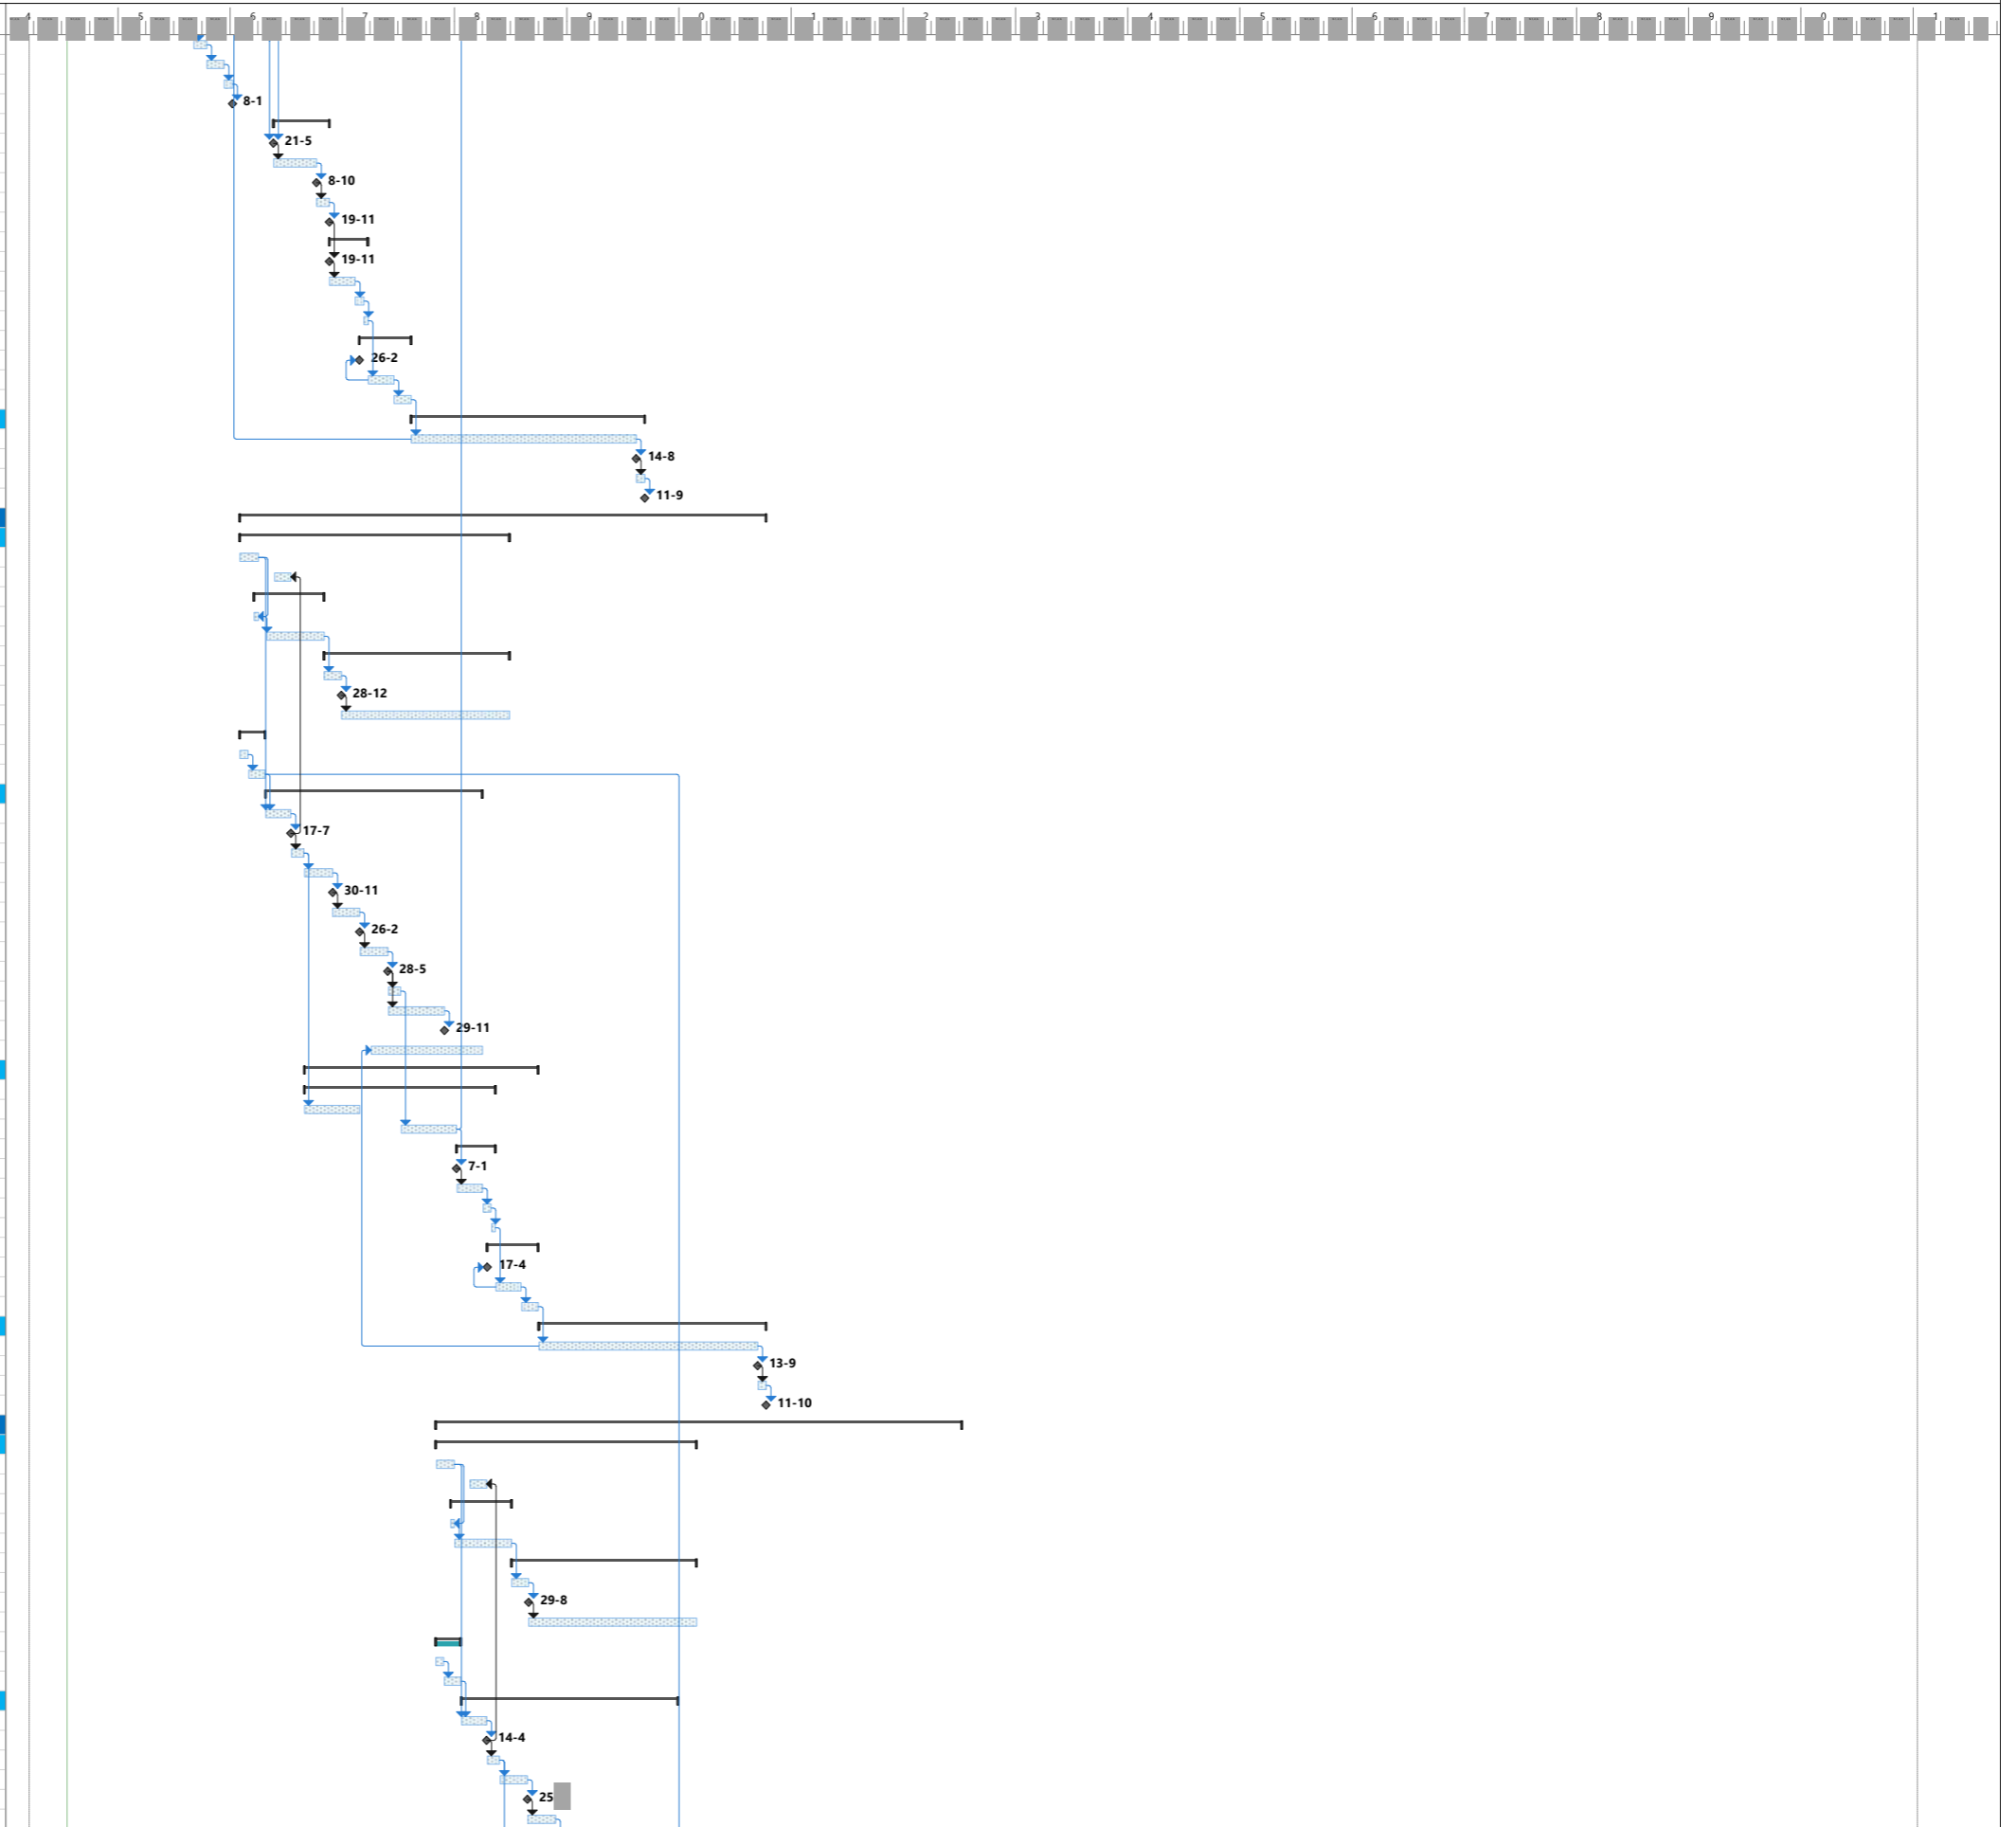

Wildemanbuurt - Detailplanning

19/7/2024 Door: Triode


Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
183	VO gereed	0 wkn	vri 24-11-28	vri 24-11-28	182
184	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13 wkn	maa 27-11-28	vri 23-2-29	183
185	DO gereed	0 wkn	vri 23-2-29	vri 23-2-29	184
186	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	maa 26-2-29	vri 6-4-29	185
187	Opstellen technische ontwerp (TO)	26 wkn	maa 9-4-29	vri 5-10-29	186
188	TO gereed	0 wkn	vri 5-10-29	vri 5-10-29	187
189	Wenstrace procedure	52 wkn	maa 1-1-29	vri 28-12-29	204GB-78 wkn
190	Voorbereiding	109 wkn	maa 29-5-28	vri 28-6-30	
191	RO procedures	89 wkn	maa 29-5-28	vri 8-2-30	
192	Fase 3: Afwijkingsprocedure (na SO)	26 wkn	maa 29-5-28	vri 24-11-28	179
193	Fase 3: Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	maa 9-4-29	vri 5-10-29	186
194	Fase 3: Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	vri 5-10-29	vri 8-2-30	
195	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	vri 5-10-29	vri 5-10-29	193
196	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	maa 8-10-29	vri 28-12-29	195
197	Erfpacht acceptatie	4 wkn	maa 31-12-29	vri 25-1-30	196
198	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	maa 28-1-30	vri 8-2-30	197
199	Sloop & Bouwrijpmaken	24 wkn	maa 14-1-30	vri 28-6-30	
200	Sloopmelding	0 wkn	maa 14-1-30	maa 14-1-30	201GB-4 wkn
201	Sloop	12 wkn	maa 11-2-30	vri 3-5-30	198
202	Bouwrijp maken	8 wkn	maa 6-5-30	vri 28-6-30	201
203	Realisatie	106 wkn	maa 1-7-30	vri 9-7-32	
204	Bouw	102 wkn	maa 1-7-30	vri 11-6-32	202
205	Bouw gereed	0 wkn	vri 11-6-32	vri 11-6-32	204
206	Oplevering	4 wkn	maa 14-6-32	vri 9-7-32	205
207	Oplevering fase 3 gereed	0 wkn	vri 9-7-32	vri 9-7-32	206
208	Fase 4	241,7 wkn	don 1-11-29	din 20-6-34	
209	Definitie	121,1 wkn	don 1-11-29	don 26-2-32	
210	Investeringsbesluit fase 4	8,7 wkn	don 1-11-29	din 1-1-30	
211	Projectbesluit fase 4	8 wkn	din 29-1-30	din 26-3-30	221GE
212	Sociaalplan & participatie	27,8 wkn	din 18-12-29	maa 1-7-30	
213	Woonwensenonderzoek 4	2 wkn	din 18-12-29	din 1-1-30	210GE
214	Uitwerking sociaalplan fase 4	25,8 wkn	din 1-1-30	maa 1-7-30	213
215	Herhuisvesting	86,6 wkn	maa 1-7-30	don 26-2-32	
216	4e peildatum aanvragen	8 wkn	maa 1-7-30	maa 26-8-30	214
217	Besluit peildatum 4e herhuisvesting	0 wkn	maa 26-8-30	maa 26-8-30	216
218	Herhuisvesting fase 4	78,6 wkn	maa 26-8-30	don 26-2-32	217
219	Ontwerp	101 wkn	din 1-1-30	din 9-12-31	
220	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	din 1-1-30	din 26-3-30	129;210
221	SO gereed	0 wkn	din 26-3-30	din 26-3-30	220
222	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	din 26-3-30	din 7-5-30	221
223	Aannemerselectie (op basis van SO)	13 wkn	din 7-5-30	din 6-8-30	222
224	Aannemer geselecteerd	0 wkn	din 6-8-30	din 6-8-30	223
225	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	13 wkn	din 6-8-30	din 5-11-30	224
226	VO gereed	0 wkn	din 5-11-30	din 5-11-30	225
227	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13 wkn	din 5-11-30	din 4-2-31	226
228	DO gereed	0 wkn	din 4-2-31	din 4-2-31	227
229	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	din 4-2-31	din 18-3-31	228
230	Opstellen technische ontwerp (TO)	26,4 wkn	din 18-3-31	don 18-9-31	229
231	TO gereed	0 wkn	don 18-9-31	don 18-9-31	230
232	Wenstrace procedure	52 wkn	din 10-12-30	din 9-12-31	247GB-78 wkn
233	Voorbereiding	109 wkn	din 7-5-30	din 8-6-32	
234	RO procedures	89 wkn	din 7-5-30	din 20-1-32	
235	Fase 4: Afwijkingsprocedure (na SO)	26 wkn	din 7-5-30	din 5-11-30	222
236	Fase 4: Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	din 18-3-31	din 16-9-31	229
237	Fase 4: Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	din 16-9-31	din 20-1-32	
238	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	din 16-9-31	din 16-9-31	236
239	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	din 16-9-31	din 9-12-31	238
240	Erfpacht acceptatie	4 wkn	din 9-12-31	din 6-1-32	239
241	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	din 6-1-32	din 20-1-32	240
242	Sloop & Bouwrijpmaken	24 wkn	din 23-12-31	din 8-6-32	
243	Sloopmelding	0 wkn	din 23-12-31	din 23-12-31	244GB-4 wkn
244	Sloop	12 wkn	din 20-1-32	din 13-4-32	241
245	Bouwrijp maken	8 wkn	din 13-4-32	din 8-6-32	244
246	Realisatie	106 wkn	din 8-6-32	din 20-6-34	
247	Bouw	102 wkn	din 8-6-32	din 23-5-34	245
248	Bouw gereed	0 wkn	din 23-5-34	din 23-5-34	247
249	Oplevering	4 wkn	din 23-5-34	din 20-6-34	248
250	Oplevering fase 4 gereed	0 wkn	din 20-6-34	din 20-6-34	249
251	Fase 5	245,2 wkn	vri 1-8-31	vri 11-4-36	
252	Definitie	121,3 wkn	vri 1-8-31	maa 28-11-33	
253	Investeringsbesluit en dispositiebesluit fase 5	8,7 wkn	vri 1-8-31	woe 1-10-31	
254	Projectbesluit fase 5	8 wkn	vri 21-11-31	don 15-1-32	267GE
255	Sociaalplan & participatie	28,2 wkn	woe 17-9-31	don 1-4-32	
256	Woonwensenonderzoek 5	2 wkn	woe 17-9-31	woe 1-10-31	253GE
257	Uitwerking sociaalplan fase 5	26,2 wkn	woe 1-10-31	don 1-4-32	256
258	Herhuisvesting	86,4 wkn	don 1-4-32	maa 28-11-33	
259	5e peildatum aanvragen	8 wkn	don 1-4-32	don 27-5-32	257
260	Besluit peildatum 5e herhuisvesting	0 wkn	don 27-5-32	don 27-5-32	259
261	Herhuisvesting fase 5	78,4 wkn	don 27-5-32	maa 28-11-33	260
262	Architecten selectie (fase 5 & 6)	12 wkn	vri 1-8-31	don 23-10-31	
263	Voorbereiding voor architectenselectie	4 wkn	vri 1-8-31	don 28-8-31	
264	Betrokkenheid huurders selectie architect	8 wkn	vri 29-8-31	don 23-10-31	263
265	Ontwerp	101,2 wkn	vri 24-10-31	vri 30-9-33	
266	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	vri 24-10-31	don 15-1-32	264;253
267	SO gereed	0 wkn	don 15-1-32	don 15-1-32	266
268	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	vri 16-1-32	don 26-2-32	267
269	Aannemerselectie (op basis van SO)	13 wkn	vri 27-2-32	don 27-5-32	268
270	Aannemer geselecteerd	0 wkn	don 27-5-32	don 27-5-32	269
271	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	13,2 wkn	vri 28-5-32	vri 27-8-32	270
272	VO gereed	0 wkn	vri 27-8-32	vri 27-8-32	271
273	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13 wkn	maa 30-8-32	vri 26-11-32	272

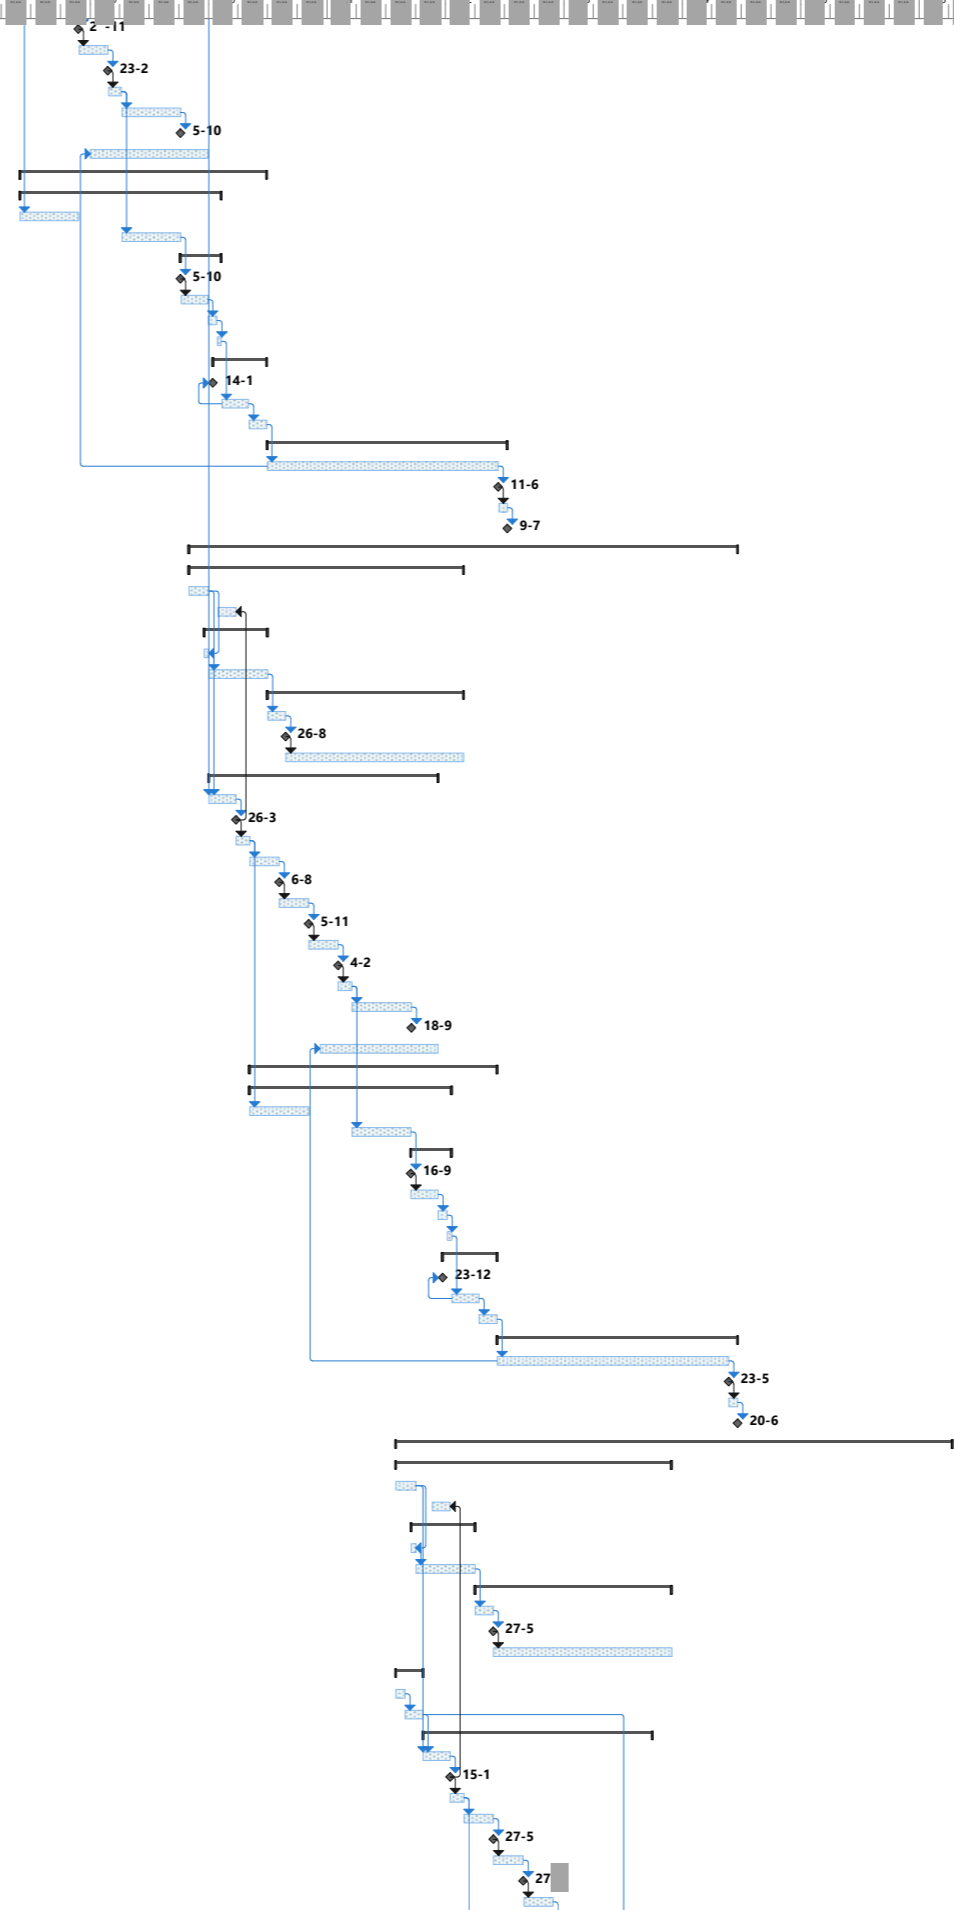

Wildemanbuurt - Detailplanning

19/7/2024 Door: Triode

id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
274	DO gereed	0 wkn	vri 26-11-32	vri 26-11-32	273
275	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	maa 29-11-32	vri 7-1-33	274
276	Opstellen technische ontwerp (TO)	26 wkn	maa 10-1-33	vri 8-7-33	275
277	TO gereed	0 wkn	vri 8-7-33	vri 8-7-33	276
278	Wenstrace procedure	52 wkn	maa 4-10-32	vri 30-9-33	293GB-78 wkn
279	Voorbereiding	109,2 wkn	vri 27-2-32	vri 31-3-34	
280	RO procedures	89,2 wkn	vri 27-2-32	vri 11-11-33	
281	Fase 5: Afwijkingsprocedure (na SO)	26 wkn	vri 27-2-32	don 26-8-32	268
282	Fase 5: Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	maa 10-1-33	vri 8-7-33	275
283	Fase 5: Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	vri 8-7-33	vri 11-11-33	
284	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	vri 8-7-33	vri 8-7-33	282
285	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	maa 11-7-33	vri 30-9-33	284
286	Erfpacht acceptatie	4 wkn	maa 3-10-33	vri 28-10-33	285
287	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	maa 31-10-33	vri 11-11-33	286
288	Sloop & Bouwrijpmaken	24 wkn	maa 17-10-33	vri 31-3-34	
289	Sloopmelding	0 wkn	maa 17-10-33	maa 17-10-33	290GB-4 wkn
290	Sloop	12 wkn	maa 14-11-33	vri 3-2-34	287
291	Bouwrijp maken	8 wkn	maa 6-2-34	vri 31-3-34	290
292	Realisatie	106 wkn	maa 3-4-34	vri 11-4-36	
293	Bouw	102 wkn	maa 3-4-34	vri 14-3-36	291
294	Bouw gereed	0 wkn	vri 14-3-36	vri 14-3-36	293
295	Oplevering	4 wkn	maa 17-3-36	vri 11-4-36	294
296	Oplevering fase 5 gereed	0 wkn	vri 11-4-36	vri 11-4-36	295
297	Fase 6	242 wkn	maa 2-5-33	vri 18-12-37	
298	Definitie	121,2 wkn	maa 2-5-33	maa 27-8-35	
299	Investeringsbesluit en dispositiebesluit fase 6	9 wkn	maa 2-5-33	vri 1-7-33	
300	Projectbesluit fase 6	8 wkn	maa 1-8-33	vri 23-9-33	310GE
301	Sociaalplan & participatie	28,2 wkn	maa 20-6-33	maa 2-1-34	
302	Woonwensenonderzoek 6	2 wkn	maa 20-6-33	vri 1-7-33	299GE
303	Uitwerking sociaalplan fase 6	26,2 wkn	maa 4-7-33	maa 2-1-34	302
304	Herhuisvesting	86 wkn	din 3-1-34	maa 27-8-35	
305	6e peildatum aanvragen	8 wkn	din 3-1-34	maa 27-2-34	303
306	Besluit peildatum 6e herhuisvesting	0 wkn	maa 27-2-34	maa 27-2-34	305
307	Herhuisvesting fase 6	78 wkn	din 28-2-34	maa 27-8-35	306
308	Ontwerp	101 wkn	maa 4-7-33	vri 8-6-35	
309	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	maa 4-7-33	vri 23-9-33	264;299
310	SO gereed	0 wkn	vri 23-9-33	vri 23-9-33	309
311	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	maa 26-9-33	vri 4-11-33	310
312	Aannemerselectie (op basis van SO)	13 wkn	maa 7-11-33	vri 3-2-34	311
313	Aannemer geselecteerd	0 wkn	vri 3-2-34	vri 3-2-34	312
314	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	13 wkn	maa 6-2-34	vri 5-5-34	313
315	VO gereed	0 wkn	vri 5-5-34	vri 5-5-34	314
316	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13 wkn	maa 8-5-34	vri 4-8-34	315
317	DO gereed	0 wkn	vri 4-8-34	vri 4-8-34	316
318	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	maa 7-8-34	vri 15-9-34	317
319	Opstellen technische ontwerp (TO)	26 wkn	maa 18-9-34	vri 16-3-35	318
320	TO gereed	0 wkn	vri 16-3-35	vri 16-3-35	319
321	Wenstrace procedure	52 wkn	maa 12-6-34	vri 8-6-35	336GB-78 wkn
322	Voorbereiding	109 wkn	maa 7-11-33	vri 7-12-35	
323	RO procedures	89 wkn	maa 7-11-33	vri 20-7-35	
324	Fase 6: Afwijkingsprocedure (na SO)	26 wkn	maa 7-11-33	vri 5-5-34	311
325	Fase 6: Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	maa 18-9-34	vri 16-3-35	318
326	Fase 6: Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	vri 16-3-35	vri 20-7-35	
327	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	vri 16-3-35	vri 16-3-35	325
328	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	maa 19-3-35	vri 8-6-35	327
329	Erfpacht acceptatie	4 wkn	maa 11-6-35	vri 6-7-35	328
330	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	maa 9-7-35	vri 20-7-35	329
331	Sloop & Bouwrijpmaken	24 wkn	maa 25-6-35	vri 7-12-35	
332	Sloopmelding	0 wkn	maa 25-6-35	maa 25-6-35	333GB-4 wkn
333	Sloop	12 wkn	maa 23-7-35	vri 12-10-35	330
334	Bouwrijp maken	8 wkn	maa 15-10-35	vri 7-12-35	333
335	Realisatie	106 wkn	maa 10-12-35	vri 18-12-37	
336	Bouw	102 wkn	maa 10-12-35	vri 20-11-37	334
337	Bouw gereed	0 wkn	vri 20-11-37	vri 20-11-37	336
338	Oplevering	4 wkn	maa 23-11-37	vri 18-12-37	337
339	Oplevering fase 6 gereed	0 wkn	vri 18-12-37	vri 18-12-37	338
340	Fase 7 (met parkeergarage)	271 wkn	don 1-2-35	woe 11-4-40	
341	Definitie	121 wkn	don 1-2-35	woe 27-5-37	
342	Investeringsbesluit fase 7	8,6 wkn	don 1-2-35	maa 2-4-35	
343	Projectbesluit fase 7	8 wkn	don 24-5-35	woe 18-7-35	356GE
344	Sociaalplan & participatie	28 wkn	din 20-3-35	maa 1-10-35	
345	Woonwensenonderzoek 7	2 wkn	din 20-3-35	maa 2-4-35	342GE
346	Uitwerking sociaalplan fase 7	26 wkn	din 3-4-35	maa 1-10-35	345
347	Herhuisvesting	86,4 wkn	din 2-10-35	woe 27-5-37	
348	7e peildatum aanvragen	8 wkn	din 2-10-35	maa 26-11-35	346
349	Besluit peildatum 7e herhuisvesting	0 wkn	maa 26-11-35	maa 26-11-35	348
350	Herhuisvesting fase 7	78,4 wkn	din 27-11-35	woe 27-5-37	349
351	Architecten selectie	12 wkn	don 1-2-35	woe 25-4-35	
352	Voorbereiding voor architectenselectie	4 wkn	don 1-2-35	woe 28-2-35	
353	Betrokkenheid huurders selectie architect	8 wkn	don 1-3-35	woe 25-4-35	352
354	Ontwerp	101 wkn	don 26-4-35	woe 1-4-37	
355	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	don 26-4-35	woe 18-7-35	353;342
356	SO gereed	0 wkn	woe 18-7-35	woe 18-7-35	355
357	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	don 19-7-35	woe 29-8-35	356
358	Aannemerselectie (op basis van SO)	13 wkn	don 30-8-35	woe 28-11-35	357
359	Aannemer geselecteerd	0 wkn	woe 28-11-35	woe 28-11-35	358
360	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	13 wkn	don 29-11-35	woe 27-2-36	359
361	VO gereed	0 wkn	woe 27-2-36	woe 27-2-36	360
362	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13 wkn	don 28-2-36	woe 28-5-36	361
363	DO gereed	0 wkn	woe 28-5-36	woe 28-5-36	362
364	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	don 29-5-36	woe 9-7-36	363

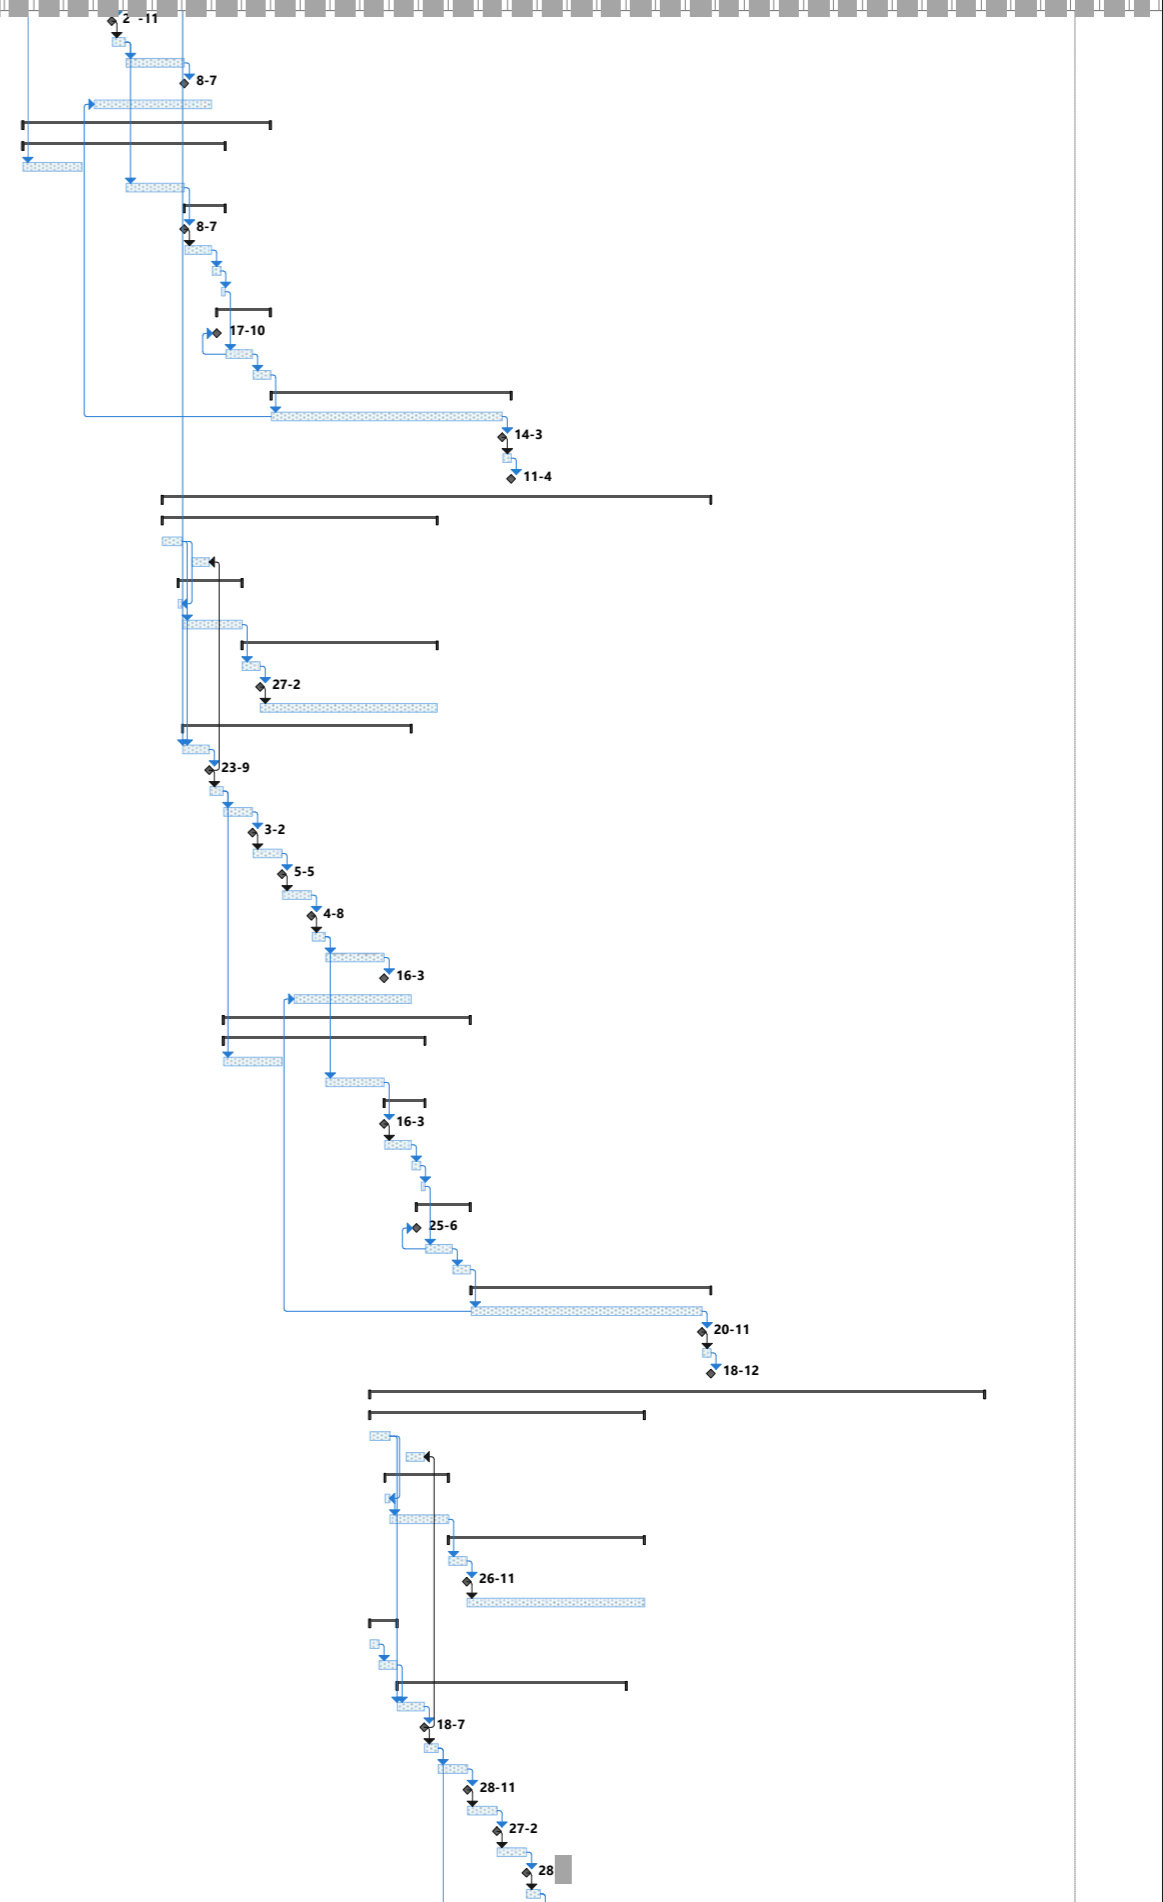

Wildemanbuurt - Detailplanning

19/7/2024 Door: Triode

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
365	Opstellen technische ontwerp (TO)	26,2 wkn	don 10-7-36	don 8-1-37	364
366	TO gereed	0 wkn	don 8-1-37	don 8-1-37	365
367	Wenstrace procedure	52 wkn	don 3-4-36	woe 1-4-37	382GB-78 wkn
368	Voorbereiding	109 wkn	don 30-8-35	woe 30-9-37	
369	RO procedures	89 wkn	don 30-8-35	woe 13-5-37	
370	Fase 7: Afwijkingsprocedure (na SO)	26 wkn	don 30-8-35	woe 27-2-36	357
371	Fase 7: Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	don 10-7-36	woe 7-1-37	364
372	Fase 7: Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	woe 7-1-37	woe 13-5-37	
373	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	woe 7-1-37	woe 7-1-37	371
374	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	don 8-1-37	woe 1-4-37	373
375	Erfpacht acceptatie	4 wkn	don 2-4-37	woe 29-4-37	374
376	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	don 30-4-37	woe 13-5-37	375
377	Sloop & Bouwrijpmaken	24 wkn	don 16-4-37	woe 30-9-37	
378	Sloopmelding	0 wkn	don 16-4-37	don 16-4-37	379GB-4 wkn
379	Sloop	12 wkn	don 14-5-37	woe 5-8-37	376
380	Bouwrijp maken	8 wkn	don 6-8-37	woe 30-9-37	379
381	Realisatie	132 wkn	don 1-10-37	woe 11-4-40	
382	Bouw	128 wkn	don 1-10-37	woe 14-3-40	380
383	Bouw gereed	0 wkn	woe 14-3-40	woe 14-3-40	382
384	Oplevering	4 wkn	don 15-3-40	woe 11-4-40	383
385	Oplevering fase 7 gereed	0 wkn	woe 11-4-40	woe 11-4-40	384
386	Fase 8	245,2 wkn	maa 5-5-36	maa 14-1-41	
387	Definitie	24 wkn	maa 5-5-36	vri 17-10-36	
388	Investeringsbesluit en dispositiebesluit fase 8	8,6 wkn	maa 5-5-36	woe 2-7-36	
389	Projectbesluit fase 8	8 wkn	maa 25-8-36	vri 17-10-36	395GE
390	Architecten selectie	12 wkn	maa 5-5-36	vri 25-7-36	
391	Voorbereiding voor architectenselectie	4 wkn	maa 5-5-36	vri 30-5-36	
392	Betrokkenheid huurders selectie architect	8 wkn	maa 2-6-36	vri 25-7-36	391
393	Ontwerp	101,2 wkn	maa 28-7-36	maa 5-7-38	
394	Opstellen schets ontwerp (SO)	12 wkn	maa 28-7-36	vri 17-10-36	392;388
395	SO gereed	0 wkn	vri 17-10-36	vri 17-10-36	394
396	Toetsen SO door gemeente	6 wkn	maa 20-10-36	vri 28-11-36	395
397	Aannemersselectie (op basis van SO)	13 wkn	maa 1-12-36	vri 27-2-37	396
398	Aannemer geselecteerd	0 wkn	vri 27-2-37	vri 27-2-37	397
399	Opstellen voorlopig ontwerp (VO)	13 wkn	maa 2-3-37	vri 29-5-37	398
400	VO gereed	0 wkn	vri 29-5-37	vri 29-5-37	399
401	Opstellen definitief ontwerp (DO)	13,2 wkn	maa 1-6-37	maa 31-8-37	400
402	DO gereed	0 wkn	maa 31-8-37	maa 31-8-37	401
403	Toetsen DO door gemeente	6 wkn	din 1-9-37	maa 12-10-37	402
404	Opstellen technische ontwerp (TO)	26,2 wkn	din 13-10-37	din 13-4-38	403
405	TO gereed	0 wkn	din 13-4-38	din 13-4-38	404
406	Wenstrace procedure	52 wkn	din 7-7-37	maa 5-7-38	421GB-78 wkn
407	Voorbereiding	109,2 wkn	maa 1-12-36	maa 3-1-39	
408	RO procedures	89,2 wkn	maa 1-12-36	maa 16-8-38	
409	Fase 8: Afwijkingsprocedure (na SO)	26 wkn	maa 1-12-36	vri 29-5-37	396
410	Fase 8: Omgevingsvergunning bouwen (na DO)	26 wkn	din 13-10-37	maa 12-4-38	403
411	Fase 8: Erfpachtaanbieding (na onherroepelijk omgevingsvergunning)	18 wkn	maa 12-4-38	maa 16-8-38	
412	Erfpachtaanbieding aanvraag	0 wkn	maa 12-4-38	maa 12-4-38	410
413	Erfpacht aanbieding opstellen	12 wkn	din 13-4-38	maa 5-7-38	412
414	Erfpacht acceptatie	4 wkn	din 6-7-38	maa 2-8-38	413
415	Notarieel transport erfpacht akte	2 wkn	din 3-8-38	maa 16-8-38	414
416	Sloop & Bouwrijpmaken	24 wkn	din 20-7-38	maa 3-1-39	
417	Sloopmelding	0 wkn	din 20-7-38	din 20-7-38	418GB-4 wkn
418	Sloop	12 wkn	din 17-8-38	maa 8-11-38	415
419	Bouwrijp maken	8 wkn	din 9-11-38	maa 3-1-39	418
420	Realisatie	106 wkn	din 4-1-39	maa 14-1-41	
421	Bouw	102 wkn	din 4-1-39	maa 17-12-40	419
422	Bouw gereed	0 wkn	maa 17-12-40	maa 17-12-40	421
423	Oplevering	4 wkn	din 18-12-40	maa 14-1-41	422
424	Oplevering fase 8 gereed	0 wkn	maa 14-1-41	maa 14-1-41	423

