


Sixhaven Conceptplanning obv overleg 1.5.2023

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Timeline (months)																							
							apr '23	mei '23	jun '23	jul '23	aug '23	sep '23	okt '23	nov '23	dec '23	jan '24	feb '24	mrt '24	apr '24	mei '24	jun '24	jul '24	aug '24	sep '24	okt '24	nov '24	dec '24	jan '25		
1	<b>Sixhaven planning detail</b>						[Timeline bar]																							
2							[Timeline bar]																							
3	<b>Stipo placemaking</b>	240 dagen	4-4-2023	4-3-2024			[Timeline bar]																							
4	Startbijeenkomst	0 dagen	15-5-2023	15-5-2023		12;8	[Timeline bar]																							
5	kleinschalige gratis activiteiten	240 dagen	4-4-2023	4-3-2024			[Timeline bar]																							
6							[Timeline bar]																							
7	<b>Raming</b>	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023			[Timeline bar]																							
8	Raming aanpassen	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023	4	20	[Timeline bar]																							
9							[Timeline bar]																							
10	<b>Ontwerp</b>	109 dagen	2-5-2023	2-10-2023			[Timeline bar]																							
11	VO	5 dagen	2-5-2023	8-5-2023			[Timeline bar]																							
12	Ontwerp aanpassen	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023	4	20;13	[Timeline bar]																							
13	VO vaststellen	10 dagen	2-6-2023	15-6-2023	12	14	[Timeline bar]																							
14	VO vastgesteld	0 dagen	15-6-2023	15-6-2023	13	21	[Timeline bar]																							
15	Definitief VO	0 dagen	3-7-2023	3-7-2023	21	23	[Timeline bar]																							
16	Do uitwerken	20 dagen	4-9-2023	29-9-2023	23	17	[Timeline bar]																							
17	Definitief DO	0 dagen	2-10-2023	2-10-2023	16	31	[Timeline bar]																							
18							[Timeline bar]																							
19	<b>Toetsen</b>	66 dagen	2-6-2023	1-9-2023			[Timeline bar]																							
20	Toetsteam + BAP	10 dagen	2-6-2023	15-6-2023	8;12	21	[Timeline bar]																							
21	Naar OG	12 dagen	16-6-2023	3-7-2023	20;14	15	[Timeline bar]																							
22							[Timeline bar]																							
23	DB + Portefeuillehouder + SD commissie (en vakantierecess)	44 dagen	4-7-2023	1-9-2023	15	16	[Timeline bar]																							
24							[Timeline bar]																							
25	<b>Bestek</b>	50 dagen	24-7-2023	29-9-2023			[Timeline bar]																							
26	Uitvragen bestek uitvoering	2 wkn	24-7-2023	4-8-2023		27	[Timeline bar]																							
27	Uitvoeren bestek uitvoering	6 wkn	7-8-2023	15-9-2023	26	28	[Timeline bar]																							
28	Toetsen bestek uitvoering	2 wkn	18-9-2023	29-9-2023	27	31	[Timeline bar]																							
29							[Timeline bar]																							
30	<b>Aanbesteden</b>	320 dagen	2-10-2023	23-12-2024			[Timeline bar]																							
31	Aanbesteden (ntb door <sup>5.1, 2, e</sup> 3.1, 2, e)	120 dagen	2-10-2023	15-3-2024	28;17	34	[Timeline bar]																							
32							[Timeline bar]																							
33	<b>Uitvoering</b>	200 dagen	18-3-2024	23-12-2024			[Timeline bar]																							
34	Start uitvoering	0 dagen	18-3-2024	18-3-2024	31	35	[Timeline bar]																							
35	Uitvoering	200 dagen	18-3-2024	20-12-2024	34	36	[Timeline bar]																							
36	Uitvoering gereed	0 dagen	23-12-2024	23-12-2024	35		[Timeline bar]																							
37							[Timeline bar]																							
38	<b>Randvoorwaarden</b>	0 dagen	2-5-2023	2-5-2023			[Timeline bar]																							
39	ntb						[Timeline bar]																							
40							[Timeline bar]																							
41	<b>Data uit projectplan</b>	0 dagen	2-5-2023	2-5-2023			[Timeline bar]																							
42	ntb						[Timeline bar]																							

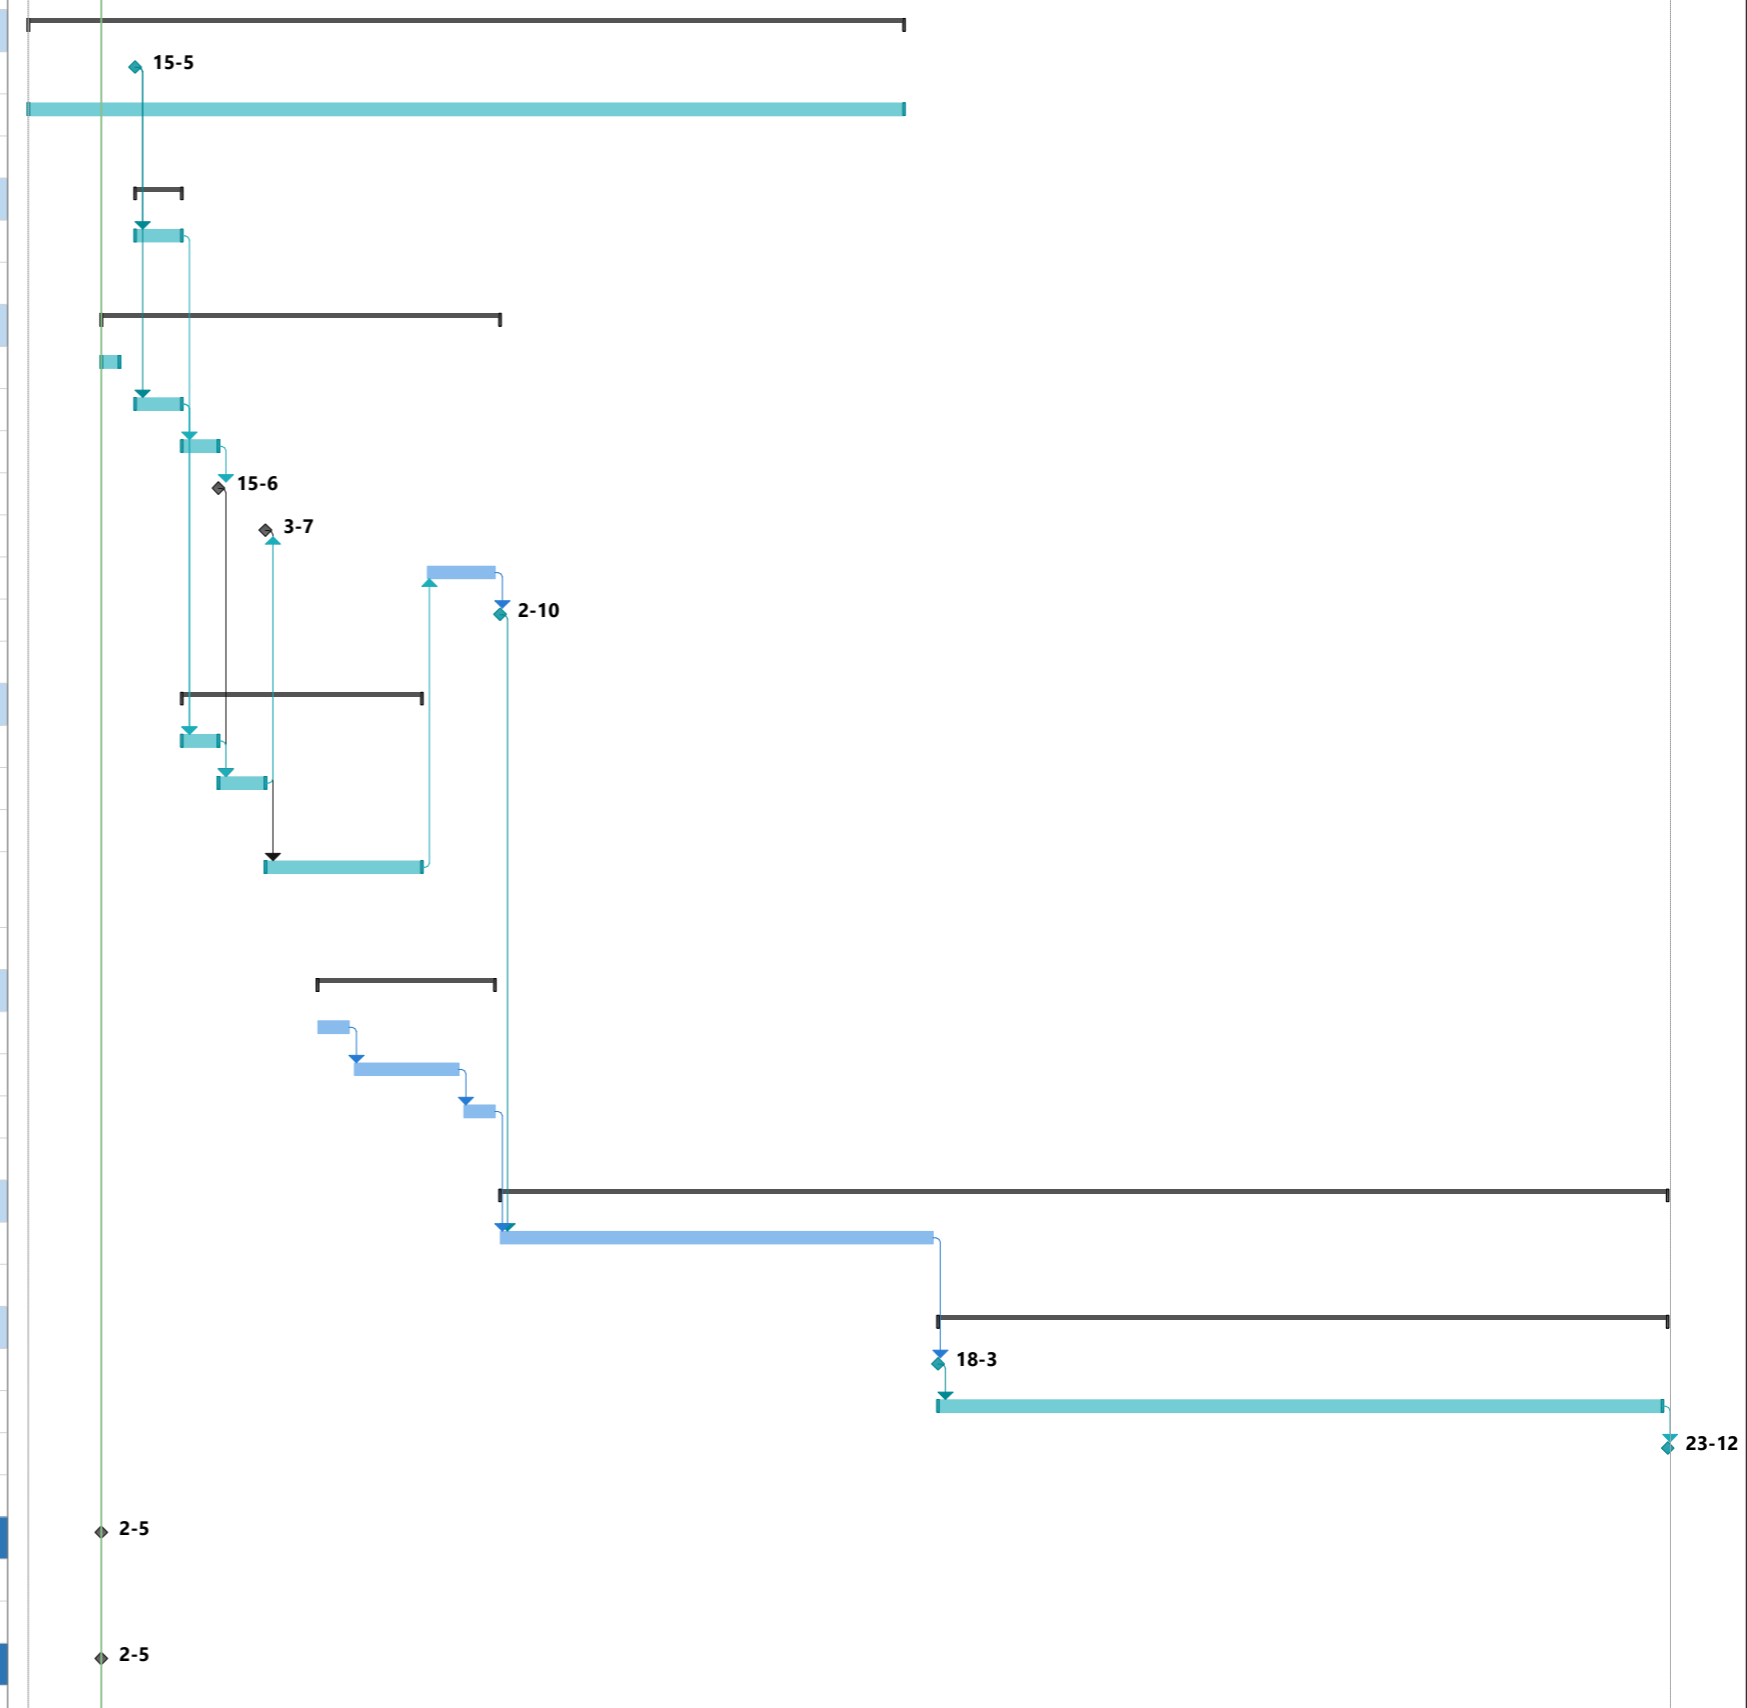

Project: planning 2.5 Datum: 2-5-2023	Taak		Samenvatting		Inactieve mijlpaal		Alleen duur		Alleen begindatum		Externe mijlpaal		Voortgang, handmatig
	Splitsing		Projectsamenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Alleen einddatum		Deadline		
	Mijlpaal		Inactieve taken		Handmatig taak		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang		
