


#	Project	Start	werkdagen	Finish	2024		2025				2026				
							Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	Cacaokwartier	02-09-24	460	09-06-26											
2	Algemeen	02-09-24	0	02-09-24											
3	Reparatie projectbesluit Weesp	02-09-24	0	02-09-24											
4	Gemeente Amsterdam	02-09-24	0	02-09-24											
5	Collegebesluit reparatie projectbesluit Weesp		0	02-09-24*											
6	Omgevingsplan	28-10-24	381	13-04-26											
7	Voorontwerp omgevingsplan	28-10-24	155	30-05-25											
8	Ontwikkelaar	28-10-24	95	07-03-25											
9	Onderzoekswerkzaamheden	28-10-24	65	24-01-25											
10	Afronden voorontwerp bestemmingplan	14-01-25	39	07-03-25											
11	Gemeente Amsterdam	10-03-25	60	30-05-25											
12	Toetsen of product wel of niet in behandeling kan worden genomen	10-03-25	10	21-03-25											
13	Vrijgeven voorontwerp bestemmingsplan (door weth ? college)	24-03-25	20	18-04-25											
14	311-overleg	21-04-25	30	30-05-25											
15	Ontwerp omgevingsplan	02-06-25	131	01-12-25											
16	Ontwikkelaar	02-06-25	56	18-08-25											
17	Opstellen NvB	02-06-25	15	20-06-25											
18	Verwerken in ontwerp bestemmingplan	22-07-25	20	18-08-25											
19	Gemeente Amsterdam	19-08-25	75	01-12-25											
20	Toetsen of product wel of niet in behandeling kan worden genomen	19-08-25	10	01-09-25											
21	Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan (door weth ? college)	02-09-25	20	29-09-25											
22	Tervisielegging en opstellen NvB	30-09-25	45	01-12-25											
23	Definitief omgevingsplan	02-12-25	95	13-04-26											
24	Ontwikkelaar	02-12-25	20	29-12-25											
25	Verwerken in bestemmingsplan	02-12-25	20	29-12-25											
26	Gemeente Amsterdam	30-12-25	75	13-04-26											
27	Toetsen of product wel of niet in behandeling kan worden genomen	30-12-25	10	12-01-26											
28	Vaststellen bestemmingsplan (ntd)	13-01-26	65	13-04-26											
29	PB2 Haalbaarheidsfase	03-09-24	280	29-09-25											
30	Stedenbouwkundig plan	03-09-24	115	10-02-25											
31	Ontwikkelaar	03-09-24	115	10-02-25											
32	Opstellen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan	03-09-24	65	02-12-24											
33	Scope gereed voor uitzetten laatste onderzoek en opstarten participatie		0	25-10-24											
34	Participatie stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan	28-10-24	56	13-01-25											
35	Afronden stedenbouwkundig plan	14-01-25	20	10-02-25											
36	Gemeente Amsterdam	03-12-24	30	13-01-25											
37	Toetsen stedenbouwkundig plan	03-12-24	30	13-01-25											
38	Overeenkomsten	11-02-25	165	29-09-25											
39	Gemeente Amsterdam	11-02-25	165	29-09-25											
40	Opstellen concept anterieure ovk (incl. zakelijke omschrijving)	11-02-25	40	07-04-25											
41	Afronden anterieure ovk (kostenverhaal en zakelijke beschrijving)	05-08-25	20	01-09-25											
42	Vaststelling anterieure ovk door college (evt. voor besluit)	02-09-25	20	29-09-25											
43	Besluitvorming	14-01-25	145	04-08-25											
44	Gemeente Amsterdam	14-01-25	145	04-08-25											
45	Stedenbouwkundig plan verwerken in projectnota	14-01-25	60	07-04-25											
46	Definitief maken besluitvormingsstukken projectbesluit	08-04-25	20	05-05-25											
47	Besluitvorming staf-college-raad	06-05-25	65	04-08-25											
48	Vaststelling projectnota door Raad		0	04-08-25											
49	PB4 Uitvoeringsfase	17-02-26	80	09-06-26											
50	Reparatie projectbesluit Weesp	17-02-26	80	09-06-26											
51	Ontwikkelaar	17-02-26	80	09-06-26											
52	Gemeente Amsterdam	13-04-26	40	08-06-26											
53	Bestemmingsplan vastgesteld		0	13-04-26											
54	Behandeling vergunningaanvraag	14-04-26	40	08-06-26											
55	Besluit omgevingsvergunning		0	08-06-26											

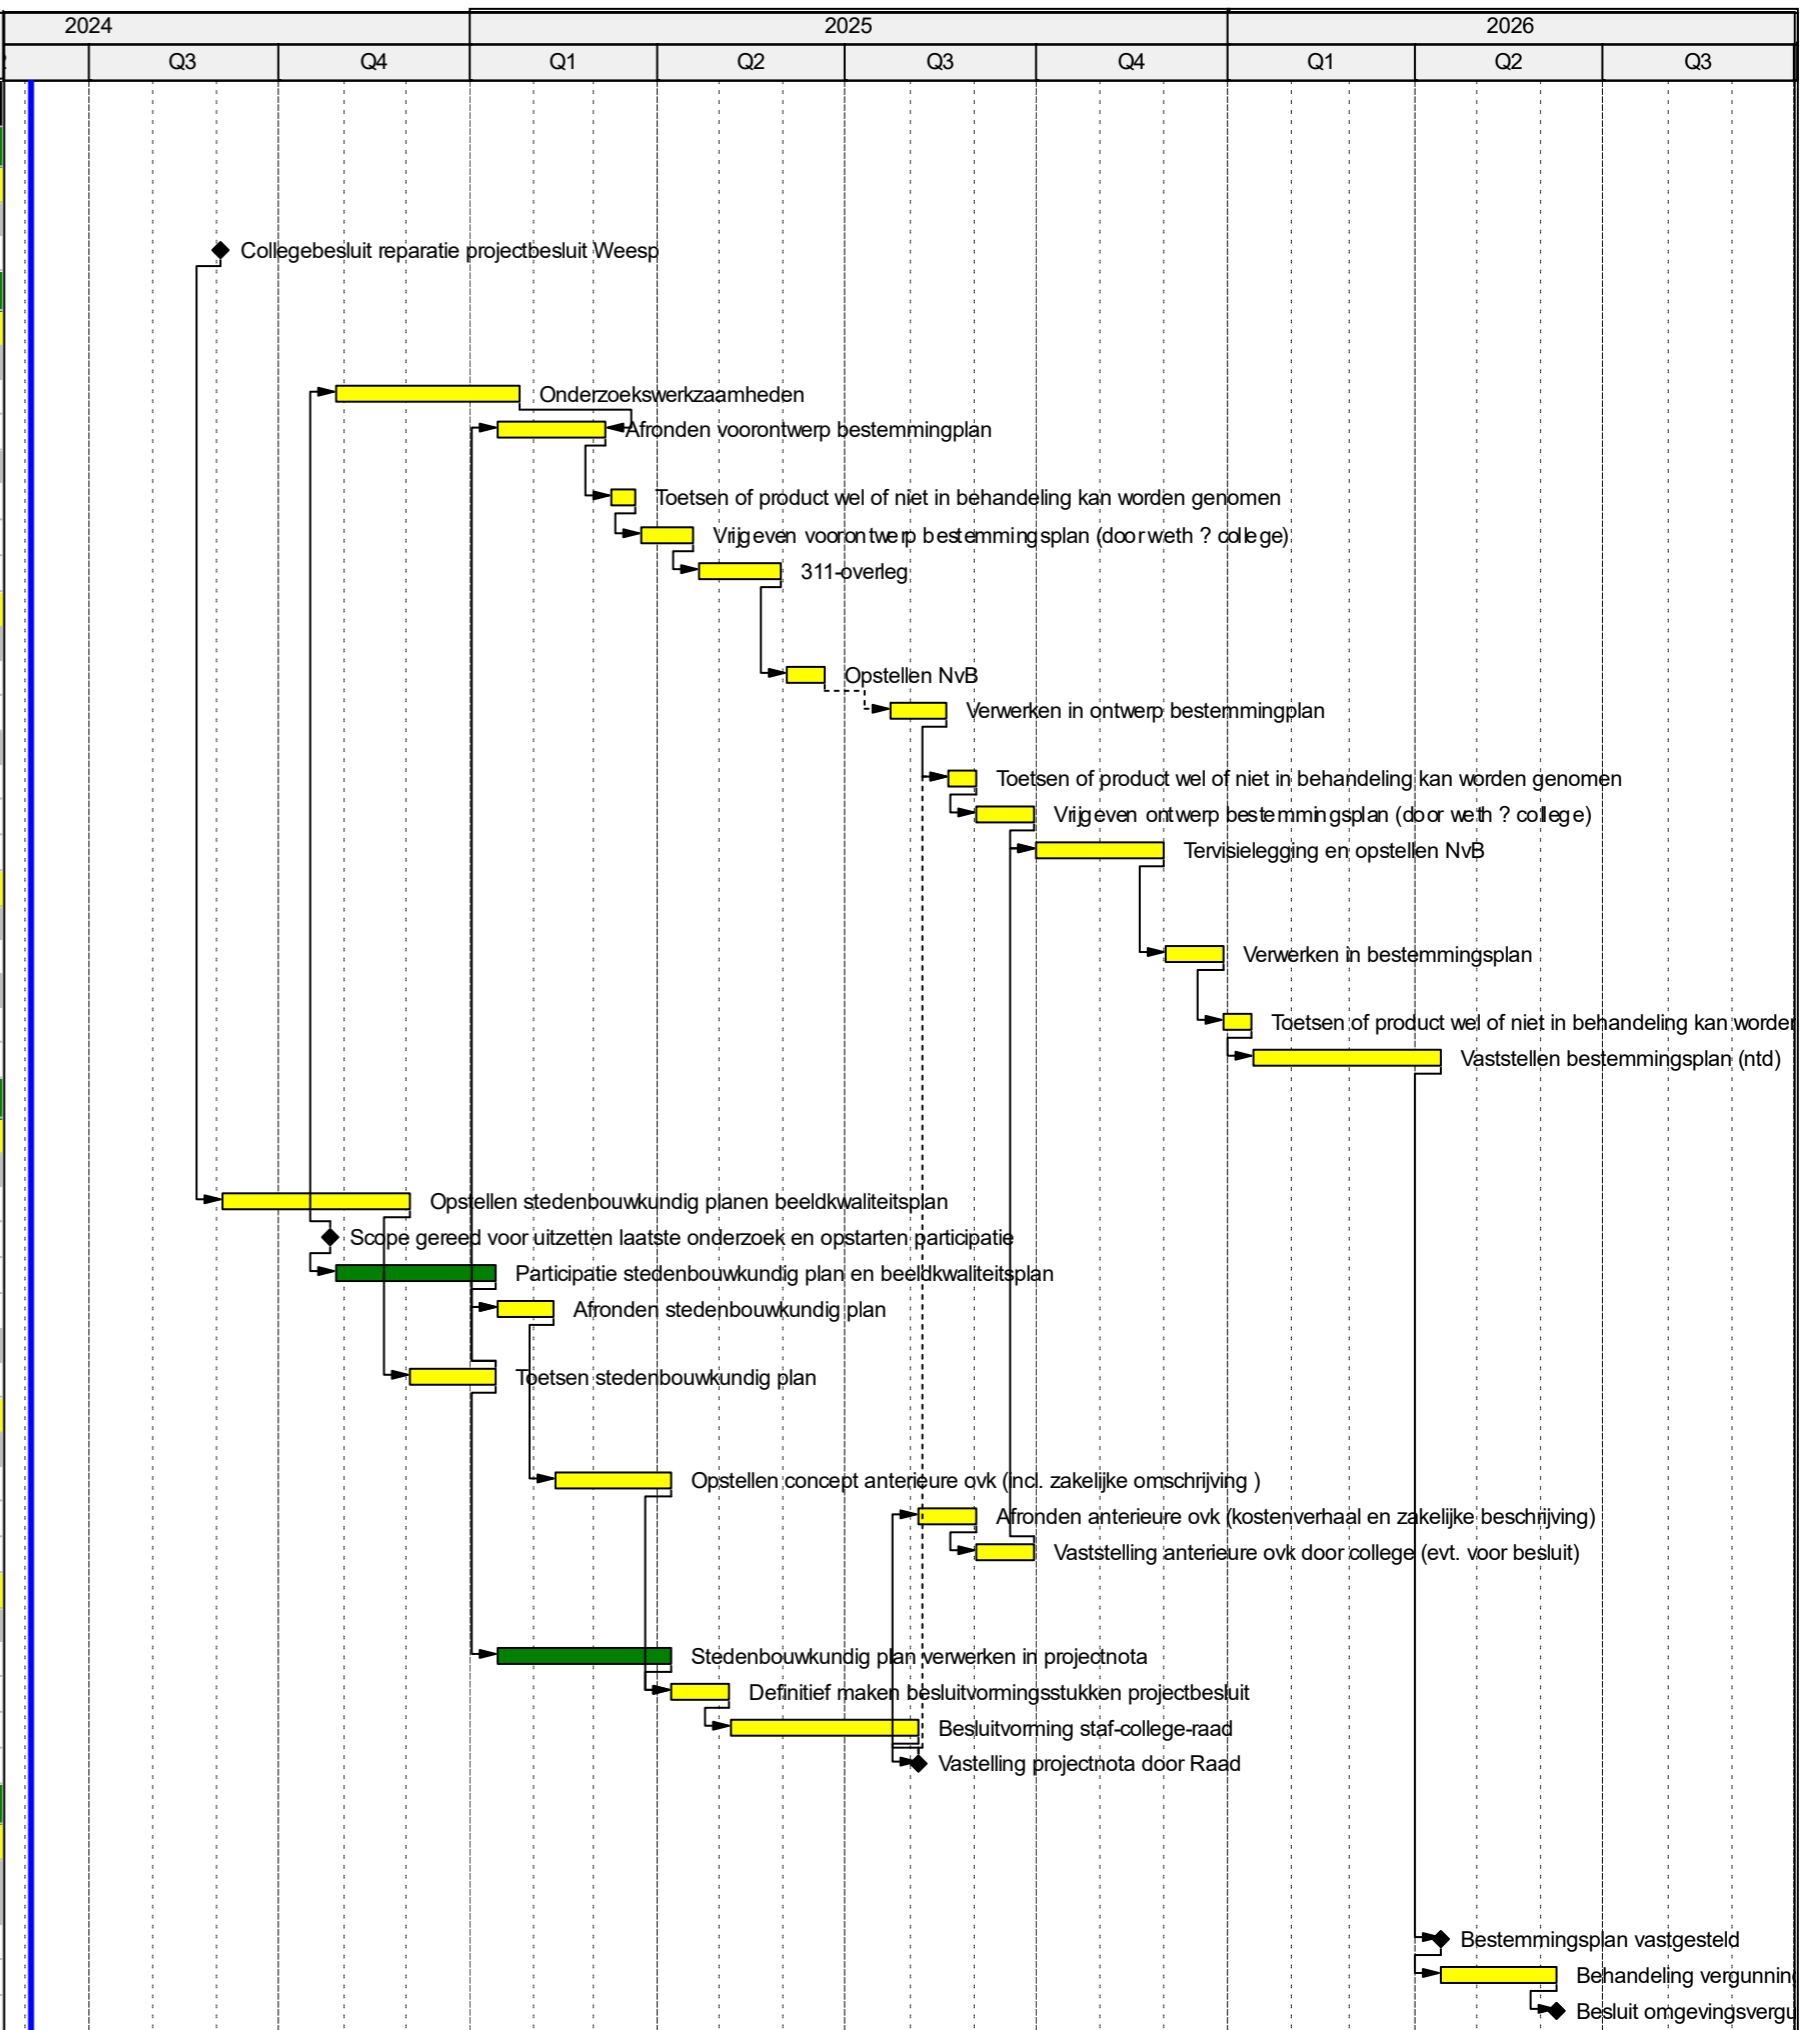

 Remaining Level of Effort	 Remaining Work
 Actual Work	 Critical Remaining Work

**Cacaokwartier
opzet projectplanning**
