

datum

12 november
2015

Bemalingsadvies

Heinekenhoek te Amsterdam

status : definitief

versie : 1

opdrachtgever

Crux Engineering BV

5.1.2.e

Pedro Medinalaan 3c

1086 XK Amsterdam

adviseur

5.1.2.e

5.1.2.e@lootsqwt.com

5.1.2.e

Loots Grondwatertechniek

Pedro de Medinalaan 1B

1086XK Amsterdam

kenmerk

10170215B.2



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
1 Inleiding.....	2
2 Situatieanalyse project	3
2.1 Project: afmetingen en fasering.....	3
2.2 Project: bodemopbouw.....	3
2.3 Project: grondwater.....	4
2.4 Project: omgeving	5
3 Maatregelen stabiliteit grondwater.....	7
3.1 Maatregelen: verticaal evenwicht.....	7
3.2 Maatregelen: hydraulische groundbreuk.....	7
3.3 Maatregelen: piping	7
4 Grondwaterbeheersing implementatie.....	9
4.1 Grondwaterbeheersing: methode	9
4.2 Grondwaterbeheersing: omgevingsbeïnvloeding	10
4.3 Grondwaterbeheersing: wetgeving, onttrekking en lozing	12
5 Aanbevelingen, actieprogramma	13
5.1 Risicocheck	13
5.2 Aanbevelingen: onderzoek en/of monitoring	13
5.3 Aanbevelingen: uitvoering	14
5.4 Actieprogramma	15
Gebruikte literatuur en bronnen.....	16
Bijlage 1 – Algemene voorwaarden rapport	17
Bijlage 2 – Methode van bepalen van benodigde data	18
Bijlage 3 – (input) Grondwaterberekeningen/-model.....	19
Bijlage 4 – Tekeningen project en omgeving	25
Bijlage 5 – Grondonderzoeken	26
Bijlage 6 – Grondwater eigenschappen.....	27

1 Inleiding

Een ontwerp voor het project “Heinekenhoek te Amsterdam” is gemaakt door de MVSE Architects. Door het toepassen van een tijdelijke grondwaterstand verlagings wordt het mogelijk een kelder met een goede fundering en levensduur aan te leggen.

Bij het toepassen van een bemaling wenst de opdrachtgever duidelijkheid op het gebied van geotechniek en grondwater: namelijk hoe de grondwaterstand verlaagd zou worden en welke consequenties dat zou hebben voor de omgeving en welke overheidsnormen van toepassing zijn bij deze werkwijze. Helderheid op deze punten is van belang, de opdrachtgever wenst in november dit jaar een verantwoorde beslissing over de aanleg van de kelder kunnen nemen.

Doel van rapport

Het doel van dit rapport is het presenteren van de benodigde maatregelen om de grondwaterstand op de locatie te beheersen tijdens de bouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van derden met oog op belendingen en schades in de nabije omgeving.

Op basis van de uitgangspunten ontvangen van de opdrachtgever, algemeen gehanteerde normen zoals Eurocode (1) en SBR-richtlijnen (2) (3) en lokaal grondonderzoek zijn de mogelijkheden voor grondwater te beheersen onderzocht.

Leeswijzer

Algemene lezer: Om de hoofdvraag van dit rapport te beantwoorden, wordt eerst in hoofdstuk 2 beschreven welke projectdimensies zijn gebruikt en welke bodemopbouw, grondwaterstanden en objecten in de omgeving zijn gevonden. Het derde hoofdstuk beschrijft de benodigde grondwater maatregelen voor een stabiele bouwput. Conclusies over de methode die het meest geschikt is om het grondwater te beheersen tijdens de bouw zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de aanbevelingen opgenomen om de risico's te beheersen tijdens de bouw.

Technische data voor specialisten: Voor uitgebreide details met betrekking tot rekenparameters wordt verwezen naar bijlage 2, 3, 4, 5 en 6. In bijlage 2 kunt u vinden hoe de parameters zijn gevonden of bepaald. In bijlage 3 staan de rekenparameters samengevat. In bijlage 4 kunt u tekeningen vinden van het project en omgeving. In bijlage 5 zijn de grondonderzoeken bijgevoegd en tot slot in bijlage 6 is de grondwaterstand data bijgevoegd.

De algemene voorwaarden van dit rapport zijn bijgevoegd in bijlage 1.


2 Situatieanalyse project

Voor een optimale beoordeling van grondwaterbeheersing maatregelen is de criteria een zo goed mogelijk begrip van de volgende parameters: de projectafmetingen, de fasering, de bodemopbouw, de grondwater eigenschappen en tot slot de aanwezige objecten en belendingen in de omgeving. Dit hoofdstuk geeft inzicht welke uitgangspunten zijn gebruikt, door deze vast te stellen kunnen berekeningen worden uitgevoerd.

In bijlage 2 is samengevat waar de data is afgeleid.

2.1 Project: afmetingen en fasering

Het project is opgedeeld in onderdelen met een verschillende bouwtijd en/of afmeting. De onderdelen zijn weergegeven in tabel 2.1 en de onderstaande figuur. Voor het gebruik van het bemalingsadvies dient worden gecontroleerd of deze uitgangspunten nog overeenkomen met de laatste uitgangspunten.

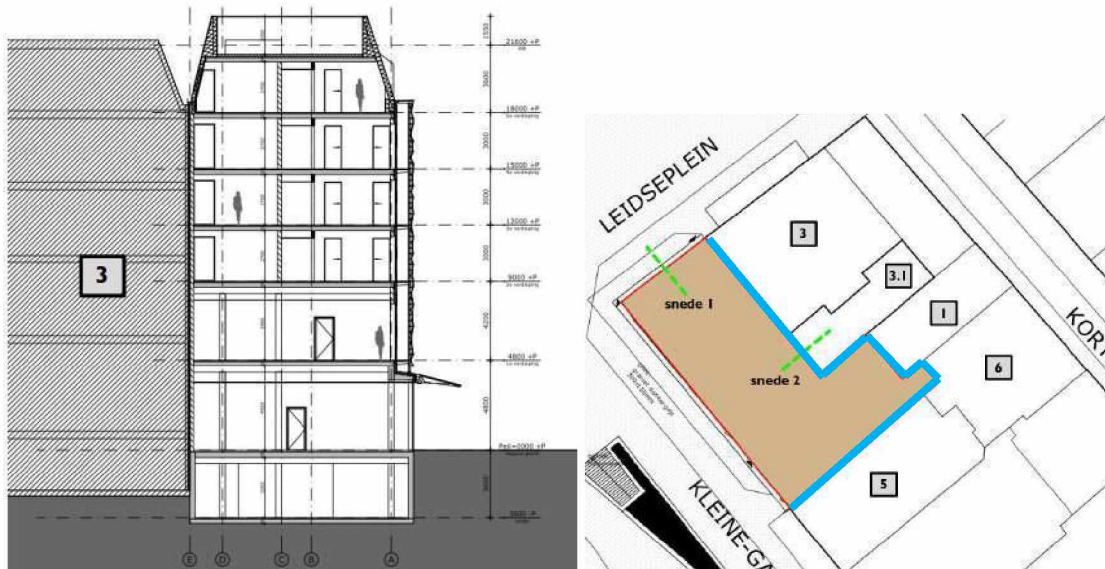

Figuur 1 – (links) dwarsdoorsnede nieuwbouw Heinekenhoek, zicht vanuit Leidseplein en (rechts) bovenaanzicht bouwput, waarbij blauw de damwanden zijn welke na werkzaamheden blijven zitten


Tabel 2.1

objecten omschrijving	lengte [m]	breedte [m]	Object diepte [m+NAP]	damwand punt [m+NAP]
bouwput	30	15~20	-2,9	-13,5

In bijlage 4 is de tekening op origineel formaat bijgevoegd.

2.2 Project: bodemopbouw

De bodemopbouw is een parameter welke is ingeschat op basis van diverse onderzoeken. Zie de gebruikte literatuur en bronnen welke bodemonderzoeken gebruikt zijn voor deze analyse. De bodemopbouw betreft een schematisatie, ofwel een interpretatie van de data. Voor dit project is gekozen te rekenen met een conservatieve inschatting van bodemopbouw parameters. Dit betekent dat voor elke berekening de minst gunstige bodemprofiel is gehanteerd. In de onderstaande figuur is de schematische bodemopbouw weergegeven.

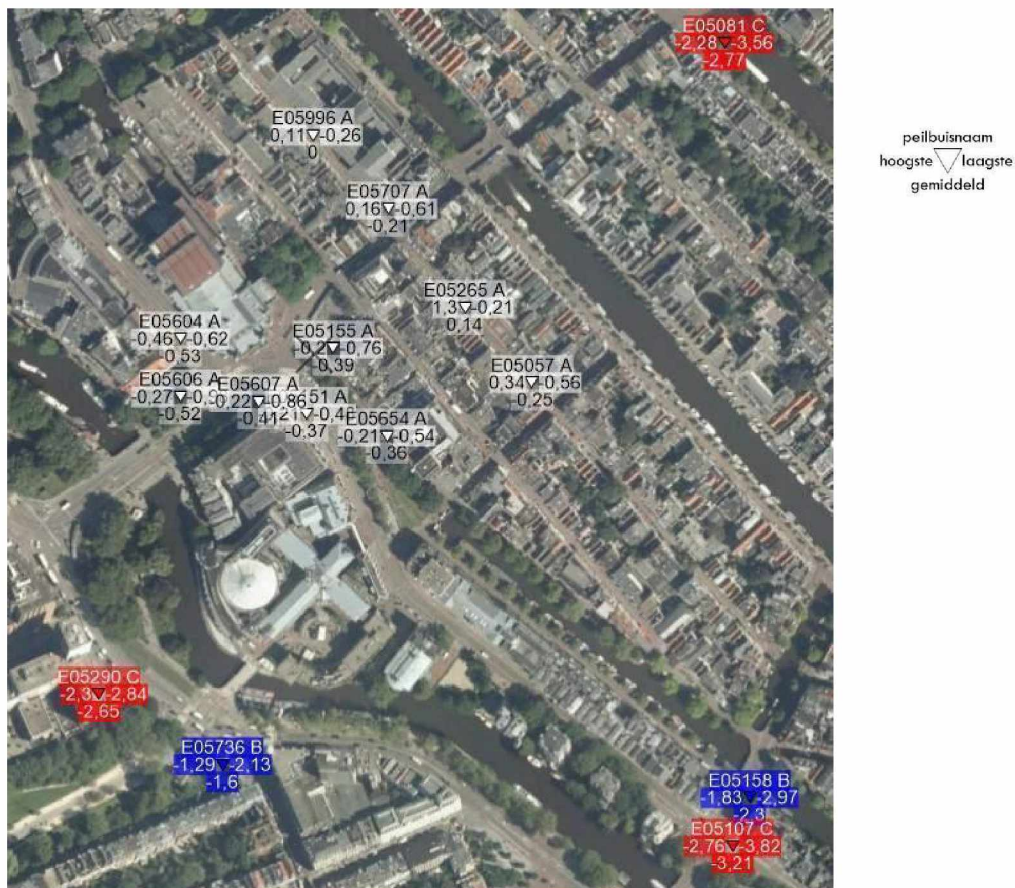

Figuur 2 - gemiddelde grondwaterstand t.o.v. NAP (wit = freatisch/watervoerende laag 1, blauw = watervoerende laag 2 en rood = watervoerende laag 3)

In figuur 2 zijn de gemiddelde grondwaterstanden bijgevoegd. Opgemerkt wordt het volgende: Op de projectlocatie stroomt het grondwater richting de Stadhouderskade (zuidwesten) in watervoerende laag 1. Tevens is aangetoond dat de gemeten grondwaterstand afneemt in de diepere zandlagen.

Maatgevende grondwaterstand watervoerende laag 1: tussen NAP – 0,2 m en NAP – 0,76 m (peilbuis E05155A)

Maatgevende grondwaterstand watervoerende laag 2: tussen NAP – 1,29 m en NAP – 2,13 m (peilbuis E05736B)


Maatgevende grondwaterstand watervoerende laag 3: tussen NAP – 2,28 m en NAP – 3,56 m (peilbuis E05081C)

In bijlage 6 zijn de grondwater eigenschappen bijgevoegd.

2.4 Project: omgeving

Tot slot is de omgeving samengevat, met de omgeving wordt bedoeld de objecten en activiteiten welke beïnvloed kunnen worden door de bemaling maatregelen op de projectlocatie. Iedere watervoerende laag heeft een maatgevende reikwijdte, deze maat is de maximale theoretische afstand waar grondwater beïnvloed kan worden door een onttrekking.

De onderstaande figuur 3 geeft een overzicht van de omgevingsfactoren in de theoretische reikwijdte van 75 m.

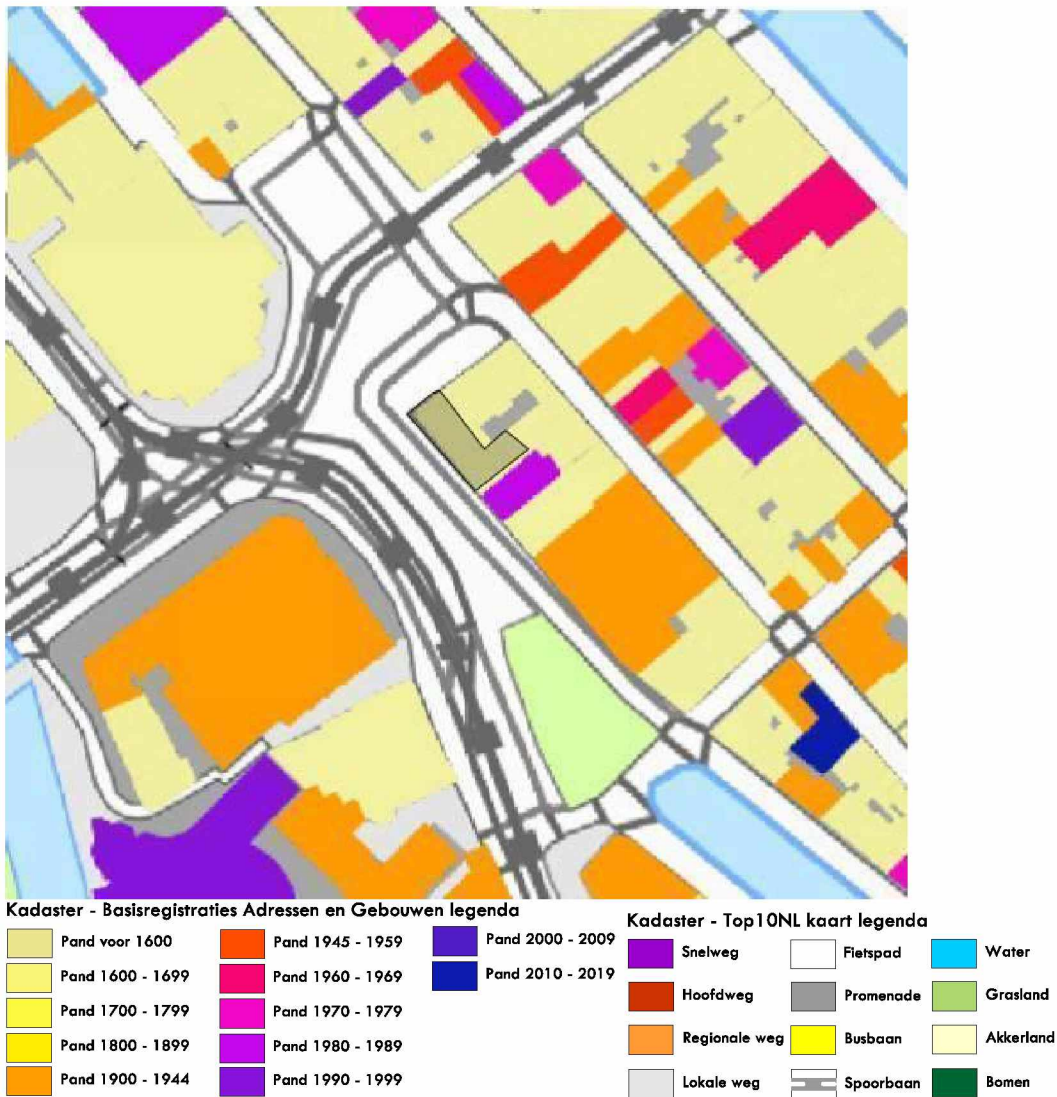

Figuur 3 – Alle objecten in de omgeving

In bijlage 4 zijn zeven tekeningen van de objecten in de omgeving bijgevoegd. Hieronder een korte samenvatting per onderdeel:

- Tekening 1 “Belendingen”: de belendingen zijn overwegend gebouwd voor 1600;
- Tekening 2 “Grondwatergebruikers”: geen;
- Tekening 3 “Natuur (natura-2000)”: geen;
- Tekening 4 “(Archeologische) monumenten”: gelegen binnen archeologisch stadscentrum, diverse rijksmonumenten in omgeving;
- Tekening 5 “Algemene kaart (top 10 NL)”: twee trambanen nabij projectlocatie;
- Tekening 6 “Landbouw in omgeving”: geen;
- Tekening 7 “Bodemloket (verontreinigingen bodem)”: vele mogelijk verplaatsbare verontreinigingen. Echter door damwanden welke freatisch pakket afsluiten tijdens de bouw zal er nagenoeg geen effect zijn op deze verontreinigingen ten aanzien van verplaatsing.

3 Maatregelen stabiliteit grondwater

Bij werkzaamheden beneden de grondwaterstand kunnen verschillende soorten faalmechanismen optreden. Er zijn drie faalmechanismen uitgewerkt in dit hoofdstuk, geconcludeerd wordt welke maatregelen in aanmerking komen. Op basis daarvan vindt een keuze van grondwaterbeheersing methode plaats in hoofdstuk 4.

Voor de gedetailleerde berekeningen wordt gewezen naar bijlage 3.

3.1 Maatregelen: verticaal evenwicht

Het verticaal evenwicht van een bouwput wordt verstoord door een ontgraving. Dit kan wanneer een slecht doorlatende laag gelegen is boven een watervoerende laag, in dit geval zal het verticaal evenwicht worden verstoord op het moment dat de grondwaterdruk in de watervoerende laag groter is dan de neerwaartse druk geleverd door de massa van de slecht doorlatende laag (en de lagen erboven). Door ontgraven neemt de massa snel af, bij een gelijke grondwaterdruk zal het verticaal evenwicht worden verstoord vanaf een bepaald ontgravingsniveau. Bij het verliezen van verticaal evenwicht kan een bodemlaag omhoog komen of de laag kan scheuren en vervolgens zal water in de ontgraving terecht komen.

Conclusie eerste opbarstniveau (watervoerende laag 2, NAP – 7,4 m)

Bij ontgravingsniveau NAP – 2,9 m is de kritieke grondwaterstand (stijghoogte) gelijk aan NAP – 2,14 m. Voor de projectlocatie is een grondwaterstand bepaald tussen NAP – 1,29 m en NAP – 2,13 m in watervoerende laag 2. Omdat de kritieke grondwaterstand lager is dan de ‘natuurlijke’ grondwaterstand moeten er maatregelen worden getroffen. Aanbevolen wordt het toepassen ontlastbemaling*, filterstelling NAP – 7,4 m tot NAP – 8,4 m. Waarbij de filters worden afgezaagd op circa 0,1 m beneden de kritieke grondwaterstand (dus NAP – 2,24 m).

*ontlastbemaling is een bemaling zonder pompen welke direct aangesloten zijn aan/in de filters. Het water zal onder natuurlijk verval uit de filters stromen en de drainage in de grondverbetering in de bouwput dient dit water op te vangen.

3.2 Maatregelen: hydraulische grondbreuk

Hydraulische grondbreuk is vergelijkbaar met het verticaal evenwicht faalmechanisme, het verschil is dat hydraulische grondbreuk optreedt in een watervoerende laag. Hydraulische grondbreuk treedt op wanneer de grondwaterdruk hoger is dan de korrelspanning, in dit geval gaan korrels drijven (drijfzand) en in het geval van een bemaling en ontgraving stromen de korrels (drijfzand) de bouwput in met als gevolg gevaarlijke situaties en (lokaal) forse maaiveld daling.

Conclusie

Omdat verticale (dam)wanden worden toegepast tot grote diepte is hydraulische grondbreuk niet mogelijk in watervoerende lagen 1 en 2.

Het is belangrijk de grondwaterstand beneden het ontgravingsniveau te houden bij ontgravingen binnen het werkgebied. In geval van calamiteiten (wanneer de grondwaterstand hoger is dan het ontgravingsniveau) kan gekozen worden de sleuf stabiel te houden door water in de sleuf te laten lopen tot en met het grondwaterniveau

3.3 Maatregelen: piping

Tot slot is het faalmechanisme piping beschouwd, dit faalmechanisme ontstaat door de aanwezigheid van oppervlaktewater. Wanneer piping optreedt ontstaat een kanaal in de bodem “pijp” tussen de ontgraving en het oppervlaktewater. In dit geval zal het oppervlaktewater zeer snel de bouwput in stromen met vaak transport van gronddeeltjes (maaiveld daling mogelijk in de omgeving).

Conclusie

Piping kan niet optreden door de afwezigheid van oppervlaktewater, zie tekening 5 in bijlage 4. Piping treedt alleen op bij oppervlaktewater welke in verbinding staat met de maatgevende watervoerende laag.

4 Grondwaterbeheersing implementatie

In dit hoofdstuk wordt de methode van uitvoering grondwaterbeheersing besproken. De risico's met betrekking tot de omgeving (faalkosten en –kans) zijn beschouwd in de tweede paragraaf. Tot slot wordt geconcludeerd of de grondwaterbeheersing vergunningsplichtig is en in welk termijn een formeel toestemming van de overheid verwacht kan worden.

Voor de gedetailleerde berekeningen en modelinput wordt gewezen naar bijlage 3.

4.1 Grondwaterbeheersing: methode


De methode om grondwater te beheersen is in deze paragraaf weergegeven per onderdeel en/of per watervoerende laag.

Bij bemaling is minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en zorgvuldige planning van de uitvoering van werkzaamheden een absolute noodzaak. Iedere aanvraag voor bemaling wordt hierop getoetst door Waterschap, deze paragraaf onderbouwd de gekozen methodes.

Debiet

Er wordt benadrukt dat de berekende debieten (onttrekking en retour) prognoses betreffen op basis van geschatte parameters.


Het debiet is ingeschat op circa 1 ~ 2 m³/uur tijdens de werkzaamheden. Bij een uitvoeringsperiode van totaal 100 dagen resulteert dit in een totaalvolume van circa 1.600 m³ en 3.000 m³. In de onderstaande figuren kan worden afgelezen welke hoeveelheden verwacht worden per onderdeel. Zie bijlage 3 voor berekening details.

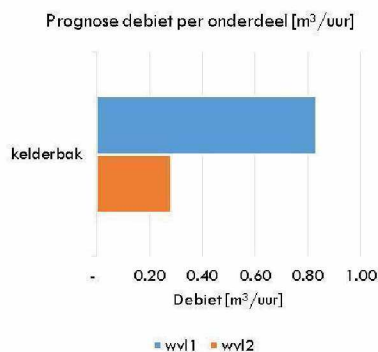

Methode

Voor watervoerende laag 2 wordt een ontlastbemaling aanbevolen met een geperforeerd deel tussen NAP – 7,4 m en NAP – 8,4 m en waarbij de bovenzijde wordt afgezaagd op NAP – 2,24 m.


De bemalingsmethode is afhankelijk van de bemaler, deze kan bestaan uit verticale of horizontale filterelementen, waarbij alleen het filteroppervlak (perforatie) geteld wordt beneden de grondwaterstand (effectieve filteroppervlak). In de onderstaande figuur is per watervoerende laag de benodigde totale filterlengte (van alle bronnen) weergegeven. De aanbevolen bemaling bestaat uit een open bemaling, waarbij de bemalingselementen worden afgesteld op 0,5 m onder het ontgravingsniveau.

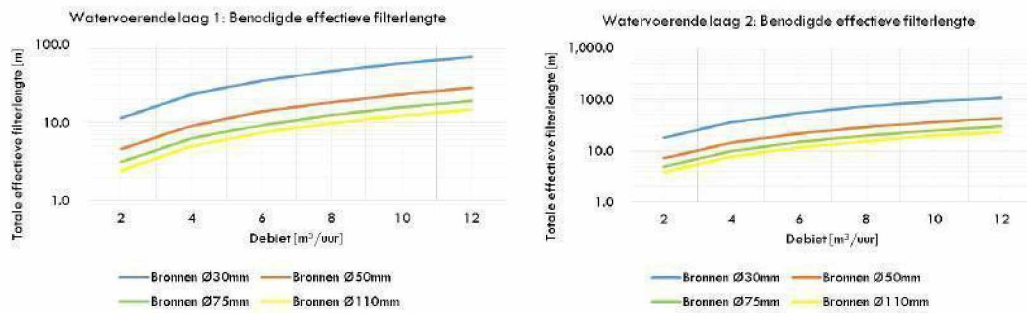

Opgemerkt wordt dat de verliezen/winsten ten aanzien van bemalingsmethoden niet zijn meegewogen in dit hoofdstuk. Een systeem met zeer vlakke verhanglijn (bijvoorbeeld horizontale drains) zal resulteren in een lager debiet terwijl enkele grote verticale bronnen (diepwells) resulteren in een hoger debiet.


4.2 Grondwaterbeheersing: omgevingsbeïnvloeding

Deze paragraaf geeft een beeld van de verwachte grondwatersituatie tijdens de werkzaamheden. De minimalisatie van de grondwateronttrekking betekent dat invloed op de omgeving voor zover mogelijk beperkt is (binnen de projectgrenzen besproken in de inleiding). In de onderstaande figuren zijn contourlijnen weergegeven, de contourlijnen betreffen locaties met een gelijke grondwaterstand tijdens bemalen. De contourlijnen met driehoeken zijn de 5cm verlagingslijnen, dit is de berekende reikwijdte van de bemaling.

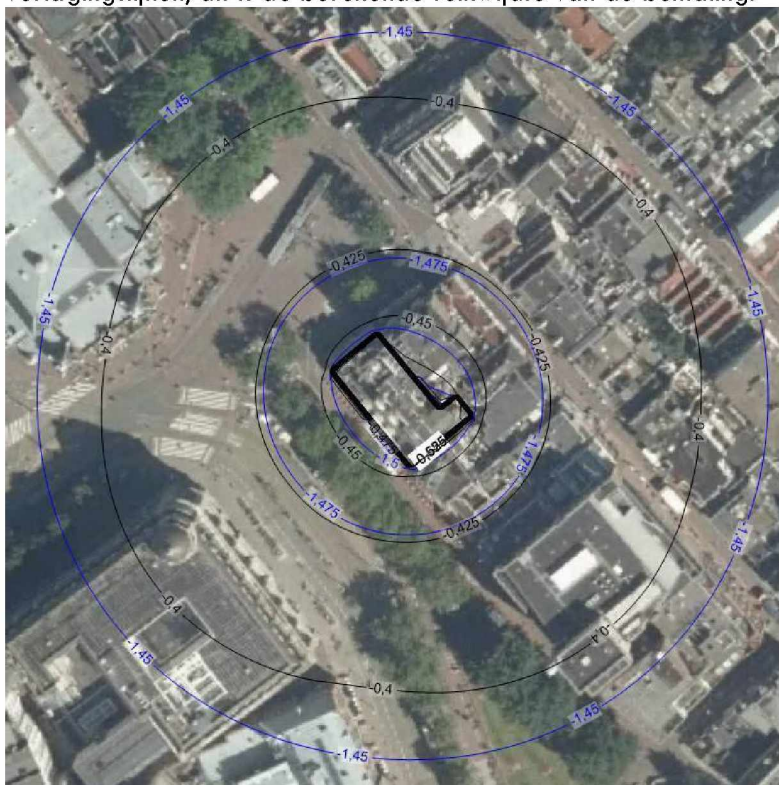


Figuur 4 – verwachte grondwaterstand t.o.v. NAP na 100 dagen bemalen (zwart=watervoerende laag 1 en blauw=watervoerende laag 2)

Watervoerende laag 1 (freatisch)

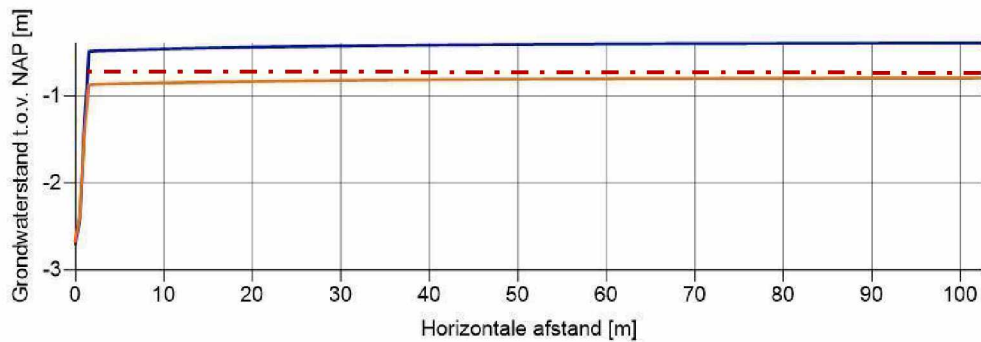

In de bovenstaande grafiek staat de grondwaterstand van de bemaling van het tracé in figuur 4 weergegeven. De blauwe lijn betreft de verwachte grondwaterstand na 100 dagen bemalen en de oranje lijn betreft de verlaging na 100 dagen bemalen in een extreem droge periode. De rode lijn NAP – 0,76 m is de gemiddeld laagste grondwaterstand (glg), deze waarde is bepaald met behulp van peilbuis E05155A. Gesteld wordt dat verlagingen in figuur 4 en bijbehorende grafiek beneden de glg niet schadelijk zijn bij de bemalingsperiode van 100 dagen. Dit betekent dat direct buiten de bouwput geen negatieve invloed wordt verwacht, in een extreem droge periode kan enkele centimeters verlaagd worden onder de glg (echter niet dusdanig ver beneden de glg zodat negatieve effecten worden verwacht).

Watervoerende laag 2 (wadzand)

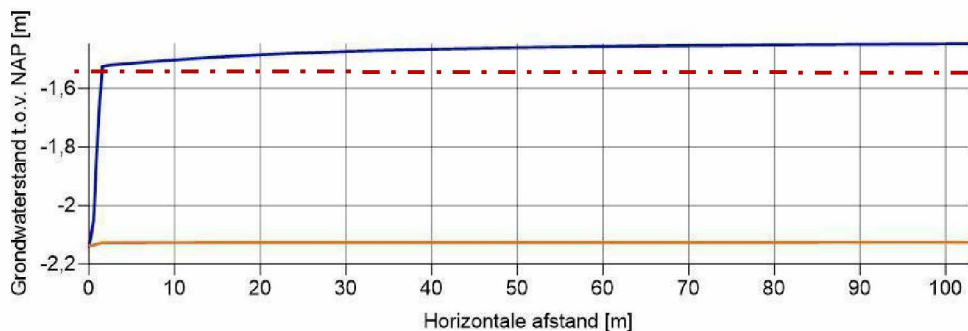

In de bovenstaande grafiek staat de grondwaterstand van de bemaling van het tracé in figuur 4 weergegeven. De blauwe lijn betreft de verwachte grondwaterstand na 100 dagen bemalen en de oranje lijn betreft de verlaging na 100 dagen bemalen in een extreem droge periode. De rode lijn NAP – 2,13 m is de gemiddeld laagste grondwaterstand (glg), deze waarde is bepaald met behulp van peilbuis E05736B. Gesteld wordt dat verlagingen in figuur 4 en bijbehorende grafiek beneden de glg niet schadelijk zijn bij de bemalingsperiode van 100 dagen. Dit betekent dat direct buiten de bouwput geen negatieve invloed wordt verwacht, in een extreem droge periode kan 1 centimeter verlaagd worden onder de glg direct buiten de bouwput (verwaarloosbaar effect).

Maaiveld dalen en effect op belendingen/trambaan

Er wordt geen maaiveld daling verwacht door grondwaterstand daling. Hierdoor worden geen effecten verwacht bij belendingen/trambaan, wel is deze conclusie (met name bij watervoerende laag 1) afhankelijk van de waterremmende eigenschappen van damwandplanken. Bij een te hoge lek zal de omgevingsbeïnvloeding te groot worden, gerekend is met circa 100 dagen weerstand.

Omgevingsbeïnvloeding overige

Ten aanzien van overige objecten worden geen negatieve invloed op omgeving verwacht door de geringe onttrekking en verlaging buiten de projectgrenzen.

4.3 Grondwaterbeheersing: wetgeving, onttrekking en lozing

Tot slot zijn in dit hoofdstuk de grondwaterbeheersing maatregelen getoetst aan de geldende wetgeving (ten tijde van opstellen rapport). Het is opgedeeld in twee onderdelen het onttrekken van grondwater uit de bodem en het lozen van (grond)water.

Onttrekking

Onttrekking wetgeving houdt in de wetten welke van toepassing zijn bij het oppompen van grondwater uit de bodem voor een bouwput. Het project is meldingsplichtig bij het Waterschap, verwacht is een debiet gelijk of kleiner dan 10 m³/uur en bemalingsperiode korter dan 6 maanden. Dit proces kan worden opgestart door het project in te voeren op omgevingsloket.nl u dient dit bemalingsadvies bij te voegen als bijlage.

Bij bronbemaling in de regio van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet is het verplicht de bemaling te melden bij een debiet dat hoger is dan 5 m³/uur en een bemalingsperiode langer dan 7 weken. De melding voor bemaling moet tenminste 4 weken voor start bemaling worden ingediend. Ten aanzien van de bronbemaling vergunningsplicht in de regio van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet is het verplicht een vergunning aan te vragen bij een debiet dat hoger is dan 50 m³/uur, een debiet dat hoger is dan 15000m³/maand en/of een bemalingsperiode langer dan 6 maanden. Indien de bemaling vergunningsplichtig is dient rekening gehouden worden met het aanvraagtermijn van 10 tot 26 weken voor de onttrekkingsvergunning. De provinciale grondwaterheffing in Noord-Holland is € 0.0085 per onttrokken m³. Onttrekkingen tot 12000 m³ zijn heffingsvrij, per m³ welke is geretourneerd mag -50% van de hoeveelheid worden verminderd op de totale som van de onttrekking.

Lozing

Lozing wetgeving houdt in de wetten welke van toepassing zijn bij het lozen van grondwater uit de bodem voor een bouwput. De wetgeving is sterk afhankelijk van de locatie en lozingsroute, de melding en/of vergunning kan worden aangevraagd via omgevingsloket.nl

Bij lozingen op het riool en/of oppervlaktewater moet rekening gehouden worden met de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing, deze wordt verrekend door middel van vervuilingseenheden. De kosten per vervuilingseenheid zijn € 53.76

5 Aanbevelingen, actieprogramma

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gesommeerd welke bijdragen aan het bereiken van de doelstelling. Ten eerste worden de zwakke punten welke geïdentificeerd zijn opgesomd in de risicocheck, opgevolgd in de tweede paragraaf met aanbevelingen om deze zwakke punten te beheersen.

In de derde paragraaf worden aanbevelingen gegeven van algemene aard tijdens en vooraf de uitvoering. Het betreffen praktische aanbevelingen welke grondwater en omgevingsbeïnvloeding zo goed mogelijk beheersbaar maken.

Tot slot is het actieprogramma met daarin een overzichtelijk stappenplan voor het vervolg van het project.

5.1 Risicocheck

Bij het uitvoeren van berekeningen van maatregelen ten behoeve van grondwater beheersing wordt gewerkt met ingeschatte parameters. Deze parameters zijn met de grootst mogelijke nauwkeurigheid bepaald, het gevolg is dat gerekend wordt met conservatieve inschattingen en veiligheidsfactoren (1). In deze paragraaf zijn belangrijkste risico's (zwakke punten) samengevat welke geïdentificeerd zijn tijdens dit onderzoek:

- Werkwijze heeft invloed op de omgevingsbeïnvloeding van de bemaling. Een langere sleuflengte en/of bemalingsduur zal in de omgeving een groter effect op grondwaterstand verlagings veroorzaken;
- Opbarsten bouwputbodems is mogelijk zonder juiste maatregelen (en monitoring);
- Bij het boren van ontlastbronnen voor de ontlastbemaling is het mogelijk een well te creëren.

5.2 Aanbevelingen: onderzoek en/of monitoring

In deze paragraaf worden de aanbevelingen uiteengezet welke worden geadviseerd op basis van de risicocheck in de vorige paragraaf. De aanbevelingen zijn bedoeld om de risico's te beheersen welke zijn toegewezen aan dit project.

Onderzoek

Aanbevelingen welke risico's beheersen door middel van onderzoek:

- Dit onderzoek is met de hoogste nauwkeurigheid uitgevoerd op basis van de huidige wetenschap, in het bouwproces is er vaak sprake van wijzigingen en nieuwe inzichten tijdens de uitvoeringsfase. Aanbevolen wordt tijdens de start van de (aanleg van) bemaling de adviseur van dit plan op werkbezoek uit te nodigen en te laten controleren of hierbij de gestelde conclusie nog van toepassing is.

Monitoring bouwput

Aanbevelingen welke risico's beheersen door middel van monitoring op de projectlocatie:

- Aanbevolen wordt het toepassen van een geijkte debietmeter. Met de inwerkingtreding van de Waterwet is het voor alle grondwateronttrekkingen verplicht om de onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfilteerd water met een nauwkeurigheid van maximaal 5% afwijking te meten;
- Aanbevolen wordt om dagelijks de grondwaterstand op de projectlocatie controleren, met behulp van een peilbuis op de projectlocatie. Grondwaterstand in de bouwput of ontgraving moet in verband met een goede preparatie van de funderingslaag en een goede begaanbaarheid van de bouwputbodem niet hoger reiken dan 0,3 m beneden het lokale ontgravingsniveau. Ten aanzien van eisen in de Waterwet mag de grondwaterstand ten hoogste 0,5 m onder ontgravingsniveau worden verlaagd;
- Aanbevolen wordt het debiet en grondwaterstand meting dagelijks en in later stadium wekelijks te registreren (verplicht) EN na het verzamelen van één week aan debiet en grondwaterstanden meetdata deze meterstanden te verzenden naar info@lootsqwt.com met als vermelding "metingen 10170215B.2". Het controleren van deze bouwputmetingen wordt als service uitgevoerd.

Monitoring omgeving

Aanbevelingen welke risico's beheersen door middel van monitoring in de omgeving:

- Aanbevolen wordt om peilbuizen te plaatsen tussen de bouwput en de risicovolle objecten bij elke bemaling, daarnaast tenminste één peilbuis plaatsen op 5m afstand haaks op de bemaling bij het ontbreken van kritieke objecten. Grenswaarden vaststellen op basis van verwachte verlaging in H4.2. Dagelijks grondwaterstand controleren. Bij verlagingen beneden het kritieke niveau dient actie ondernomen om de grondwaterstand te herstellen;
- Bij alle belendingen/infrastructuur binnen invloedstraal (75 m) wordt een vooropname aanbevolen.

Indien gewenst wordt in een later stadium een monitoringsplan opgesteld waarin de peilbuislocaties en alarmwaarden zijn samengevat.

5.3 Aanbevelingen: uitvoering

De aannemer/bemaler is vrij om te kiezen voor specifieke boor-/plaatsing methode, wijze van omgaan met lokale afwijkingen in de bodem, type materieel. De vrije keuze is omdat materieel om te bemalen zeer divers is en varieert per bemaler. Wel moet rekening gehouden worden dat het plan mogelijk niet kan voldoen bij bepaalde (combinaties) van uitvoeringstechnische werkwijzen en materieel.

De volgende aanbevelingen zijn om het bemalingsresultaat te halen, omgevingsbeïnvloeding te beheersen en te voldoen aan wetgeving:

- Het wordt aanbevolen de bootgaten ontlastbemaling boven watervoerende laag 2 af te dichten met zwelklei;
- Het wordt aanbevolen het bemalingsplan en het uitvoeringsontwerp te overleggen met de bemalingsadviseur, daarbij zal de invloed op de omgeving worden gecontroleerd en/of (indien wenselijk) met monitoring de bemaling geoptimaliseerd tijdens uitvoering;
- Aanbevolen wordt een plan en materieel en mensen klaar te hebben om ten alle tijden de bemaling/bouwputstabiliteit te kunnen herstellen binnen de responstijd. Responstijd is de verwachte tijdsduur tussen uitval bemaling en grote problemen in de bouwput.
- Tenslotte wordt aanbevolen een bemalingsinstallatie toe te passen met voldoende capaciteit en welke (lokaal) instelbaar is. De bemalingsinstallatie dient voldoende instelbaar te zijn om een te grote onttrekking/verlaging te voorkomen. Aanbevolen wordt te overleggen wie dit zal controleren/instellen en welke controle frequentie toegepast zal worden;

5.4 Actieprogramma

In het actieprogramma wordt beschreven welke stappen genomen moeten worden voor uitvoering bemaling:

1. Indienen formulieren en documenten conform H4.3 bij bevoegd gezag;
2. Peilbuizen plaatsen in de watervoerende lagen ten behoeve van monitoring;
3. Opstellen bemalingsplan (belangrijk situatieschets met lozingspunten en onttrekkingspunten);
4. Start bemaling, opschrijven beginstand debietmeter;
5. Controle bemaling op locatie Loots Grondwatertechniek en/of debietmetingen en grondwaterstandmetingen na één week verzenden naar info@lootsqwt.com met als vermelding "metingen 10170215B.2";
6. Een monstername van het grondwater genomen vanuit het lozingswater. Dit monster dient te worden geanalyseerd op de parameters welke Waterschap zal vragen (mogelijks moet dit worden herhaald per week).

De bovenstaande onderstreepte punten kunnen door Loots Grondwatertechniek worden uitgevoerd, neem contact op met [5.1.2,e](#) voor meer informatie.

Opgesteld door:

ing. [5.1.2,e](#) ([5.1.2,e](#))

Loots Grondwatertechniek

12 november 2015

Gebruikte literatuur en bronnen

1. **Nederlands Normalisatie-instituut.** *NEN 9997-1+C1-2012*. Normcommissie 351 006 "Geotechniek". Delft : NEN, 2012. ICS 91.080.01; 93.020.
2. **SBR.** *190.03 Bemaling van bouwputten*. Rotterdam : SBR, 2003.
3. —. *273.98 Leidraad voor het onderzoek naar de invloed van een grondwaterstandsaling op de bebouwing*. Rotterdam : SBR, 1998.
4. **Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu.** Bodemloket. [Online] 2013. <http://www.bodemloket.nl>.
5. **Google.** *Google Earth*. 2012. 7010101888.
6. **Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.** *IKAW - Archeologische Monumentenkaart*. [Autocad] 2011.
7. **Dinoloket, Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond.** *Ondergrondgegevens*.
8. **Dienst Regelingen.** *Basisregistratie Percelen*.
9. **GBO Provincies.** *Grondwaterbescherming en -onttrekking*.
10. **Publieke Deinstverlening op kaart.** *Natura 2000 gebieden*.
11. **Kadaster.** *Basisregistraties Adressen en Gebouwen*.
12. —. *Top10NL kaart nederland*. 2012.
13. **Crux.** *RA15153a1 Funderings- damwandadvies RA Heinekenhoek*. 28-05-2015.

Bijlage 1 – Algemene voorwaarden rapport

Op alle, door Loots Grondwatertechniek uitgebrachte adviezen en berekeningen, is de DNR 2011 <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/> van toepassing.

Het advies en de berekeningen zijn opgesteld conform de onderstaande wetgeving, normen, richtlijnen en protocollen:



Eurocode 7: Geotechniek
NEN 9997-1+C1:2012



Wetgeving Rijksoverheid
Waterwet



SBR190.03 Bemaling van
bouwputten

SBR273.98 Leidraad voor het
onderzoek naar de invloed van
een grondwaterstandsval op
de bebouwing

De onderstaande beperkingen en voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op dit document:

Algehele stabiliteit, stabiliteit ophogingen en stabiliteit taluds, belastingen, stabiliteit, sterkte grondkerende constructies en verankeringen worden niet beschouwd;

© 2014 Loots Grondwatertechniek - Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd, gecommuniceerd, aangepast, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, microfilm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loots Grondwatertechniek, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. De rekenwaarden zijn uitsluitend voor berekening van bemaling(effecten) en worden geenszins met het oog op enig specifiek gebruik ter beschikking gesteld;

Bijlage 2 – Methode van bepalen van benodigde data

De aangeleverde data zijn gedeeltelijk consistent met data van voorgaande projecten/archiefdata. De interpretatie is gebaseerd op beperkte informatie van het project en aangenomen wordt dat de waarden welke opdrachtgever beschikbaar heeft gesteld op lange termijn representatief zijn.

[A] Vastgestelde parameters projectlocatie

De volgende parameters zijn afgeleid uit aangeleverde informatie en het archiefonderzoek:

- Projectafmeting, ontgravingsdiepten , projectlocatie;
- Geotechnische bodemopbouw en geotechnische categorie;
- Aanwezigheid van grondwaterbeschermingsgebied, openbaar groen/natuur, landbouw, natura 2000 gebied.

[B] Geraamde parameters op basis van meerdere gegevensbronnen

De volgende parameters zijn bepaald aan de hand van meerdere gegevensbronnen, dit zijn vaak ervaringen in de nabijheid van de projectlocatie. Hierbij wordt gekozen voor een conservatieve benadering waarbij voor elke parameter de minst gunstige waarde wordt gehanteerd. Er valt vaak winst te halen door deze parameters nader te bepalen. De volgende parameters zijn geraamd:

- Geotechnische bodemonderzoeken;
- Geohydrologische parameters, geraamd op basis van Dinoloket, grondwaterkaart, boorbeschrijving;
- De maatgevende (gemiddeld hoogste/laagste) grondwaterstand watervoerende laag 1;
- Aanwezigheid van archeologische objecten, grondwaterverontreinigingen, infrastructuur.

[C] Geraamde parameters op basis van ervaring

De parameters in dit hoofdstuk zijn niet direct af te leiden uit beschikbare gegevensbronnen. Hierbij wordt gekozen voor een conservatieve benadering waarbij elke parameter wordt bepaald conform Eurocode (1) en ervaring. De volgende parameters zijn geraamd:

- Bemalingsperiode;
- Grondwateraanvulling is ingeschat op 250mm/jaar;
- De maatgevende (gemiddeld hoogste/laagste) grondwaterstand watervoerende laag 2;
- Oppervlaktewater, diepte en verbinding met watervoerende lagen;
- De volumieke gewichten betreffen een raming op basis van ervaring. Om meer inzicht te verkrijgen in de volumieke gewichten kunnen grondmonsters worden gestoken waarvan in het laboratorium de volumieke gewichten worden bepaald. Belastingen worden beschouwd als blijvend, dit betekent dat de maatgevende grondwaterstand bepaald moet zijn (worst-case) en/of maatregelen ten aanzien van monitoring moet worden toegepast voor en/of tijdens bemalen.

[D] Ontbrekende parameters

Na het opstellen is gebleken dat de volgende parameters niet of slecht zijn te bepalen:

- Aanwezigheid van kritieke belendingen;
- De actuele grondwaterstand t.o.v. NAP;
- Grondwaterkwaliteit.

Bijlage 3 – (input) Grondwaterberekeningen/-model

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Projectdimensies;
- Overzicht geotechnische parameters op projectlocatie en binnen reikwijdte;
- Overzicht geohydrologische parameters op projectlocatie;
- Overzicht eigenschappen grondwater op projectlocatie per onderdeel;
- Berekening(en) verticaal evenwicht per onderdeel (of de maatgevende);
- Berekening(en) hydraulische grondbreuk per onderdeel (of de maatgevende);
- Berekening(en) piping per onderdeel (of de maatgevende);
- Berekening debiet per onderdeel (of de maatgevende);
- Berekening omgevingsbeïnvloeding (of de maatgevende).

Projectdimensies:

objecten omschrijving	lengte [m]	breedte [m]	ontgravings- diepte [m+NAP]	damwand punt [m+NAP]	bemalings-duur
kelderbak	30	15~20	-2.9	-13	100 dagen

Geotechnische bodemparameters:

γ is de volumieke massa van de bodemlaag, dit is het gewicht wat gebruikt wordt voor het verticaal evenwicht.

K_h of k_v zijn de doorlatendheid eigenschappen (hogere waarde is meer doorlatend)

geotechnische omschrijving op locatie	top laag [m+NAP]	Dikte gemiddeld [m]	Dikte minimaal en maximaal [m]	γ [kN/m ³]	richtlijn
zand, los (onverzadigd)	1.51 ~ 0.83	1.6	1.2 ~ 1.9	17	NEN 9997-1+C1:2012
zand, los (verzadigd)	-0.38	0.7	0.5 ~ 0.8	19	NEN 9997-1+C1:2012
klei, sterk zandig	-0.9 ~ -1.2	0.9	0.3 ~ 1.5	19	NEN 9997-1+C1:2012
zand, sterk siltig/kleiig (verzadigd)	-1.2 ~ -2.7	0.8	0.4 ~ 1.3	20	NEN 9997-1+C1:2012
klei, matig	-2.5 ~ -3.1	0.6	0 ~ 1	17	NEN 9997-1+C1:2012
veen, matig slap (matig voorbelast)	-3.1 ~ -3.5	1.6	1.5 ~ 1.9	11	NEN 9997-1+C1:2012
klei, matig	-5	2.3	2 ~ 2.5	17	NEN 9997-1+C1:2012
zand, sterk siltig/kleiig (verzadigd)	-7 ~ -7.5	2.2	2 ~ 2.5	20	NEN 9997-1+C1:2012
klei, matig	-9.5	2.2	2 ~ 2.5	17	NEN 9997-1+C1:2012
veen, matig slap (matig voorbelast)	-11.5 ~ -12	0.5	0.5	11	NEN 9997-1+C1:2012
zand, vast (verzadigd)	-12 ~ -12.5	3.9	2.8 ~ 5	21	NEN 9997-1+C1:2012
zand, sterk siltig/kleiig (verzadigd)	-15.3 ~ -17	1.4	0.5 ~ 2.2	20	NEN 9997-1+C1:2012
zand, vast (verzadigd)	-17.5	12.5	12.5	21	NEN 9997-1+C1:2012

geohydrologische laag omschrijving	type	top [m+NAP]	k_h [m/d]	k_v [m/d]	Reikwijdte [m]	gemiddelde porositeit	bron of richtlijn
zand, matig fijn, zwak silthoudend, veel stoorlaagjes	DKL	1.51 ~ 0.83	10	1		0.3	Grondwaterzakboekje
zand, matig fijn, zwak silthoudend, veel stoorlaagjes	WVL1	-0.38	10	1	81.0	0.3	Grondwaterzakboekje
zand, kleiig	WVL1	-0.9 ~ -1.2	0.1	0.05	23.0	0.1	SBR 190.03
zand, matig fijn, sterk silthoudend, stoorlaagjes	WVL1	-1.2 ~ -2.7	3	0.6	0.0	0.25	Grondwaterzakboekje
klei, matig siltig	SDL1	-2.5 ~ -3.1	0.0005	0.001	6.3	0.1	SBR 190.03
veen (gemiddelde doorlatendheid)	SDL1	-3.1 ~ -3.5	0.5	0.003	6.3	0.3	SBR 190.03
klei, sterk siltig	SDL1	-5	0.005	0.001	6.3	0.1	SBR 190.03
zand, zeer fijn, zwak silthoudend	WVL2	-7 ~ -7.5	4	2	226.0	0.25	Grondwaterzakboekje
klei, sterk siltig	SDL2	-9.5	0.005	0.001	0.3	0.1	SBR 190.03
veen (lage doorlatendheid)	SDL2	-11.5 ~ -12	0.1	0.003	0.3	0.3	SBR 190.03
zand, matig grof, zwak silthoudend	WVL3	-12 ~ -12.5	20	10	1088.8	0.3	Grondwaterzakboekje
zand, matig fijn, sterk silthoudend, veel stoorlaagjes	WVL3	-15.3 ~ -17	3	0.3	1088.8	0.25	Grondwaterzakboekje
zand, matig grof, zwak silthoudend	WVL3	-17.5	20	10	1088.8	0.3	Grondwaterzakboekje

Maatgevende grondwaterstand per onderdeel:

Ghg is Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand, een representatieve bovengrens van de te verwachten grondwaterstanden.

Act is de actuele grondwaterstand een representatieve actuele waarde, ofwel een recente meting, danwel een representatieve waarde voor maan waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Glg is Gemiddeld Laagste Grondwaterstand, een representatieve ondergrens van de te verwachten grondwaterstanden. Deze natuurlijke ondergrens wordt ook maatgevend beschouwd als waarde vanaf wanneer maaiVELddaling ontstaat.

Afstand_{pb}/R is de afstand tussen project en peilbuis gedeeld door de reikwijdte van de desbetreffende laag. Als dit kleiner is dan 1 is de meting representatief. Bij een hogere waarde moet het geohydrologisch worden beschouwd of er aanvullend onderzoek nodig is.

Grondwaterstand wv11	ghg [m+NAP]	act [m+NAP]	glg [m+NAP]	meetperiode [jaren]	laatste [jaar]	factor afstand _{pb} /R	peilbuis
kelderbak	-0.2	-0.38	-0.76	32.3	2015	0	E05155 A
Grondwaterstand wv12	ghg [m+NAP]	act [m+NAP]	glg [m+NAP]	meetperiode [jaren]	laatste [jaar]	factor afstand _{pb} /R	peilbuis
kelderbak	-1.29*	-1.44*	-2.13*	2.5	2006	1.18	E05736 B
Grondwaterstand wv13	ghg [m+NAP]	act [m+NAP]	glg [m+NAP]	meetperiode [jaren]	laatste [jaar]	factor afstand _{pb} /R	peilbuis
kelderbak	-2.28	-2.59	-3.56	10.4	1983	0.28	E05081 C


Grondwatertechnische maatregelen per onderdeel

verticaal evenwicht 1	bodemprofiel	diepte [m+NAP]	talud	bodem-breedte	opbarst-niveau [m+NAP]	kritieke gws [m+NAP]	ghg [m+NAP]	verwachte gws [m+NAP]	maatregel conclusie
kelderbak	DKM1	van 1 tot -2.9	1:0	20	-7.4	-2.14	-1.29	-1.44	ja
verticaal evenwicht 2	bodemprofiel	diepte [m+NAP]	talud	bodem-breedte	opbarst-niveau [m+NAP]	kritieke gws [m+NAP]	ghg [m+NAP]	verwachte gws [m+NAP]	maatregel conclusie
kelderbak	DKM1	van 1 tot -2.9	1:0	20	-12.5	1.01	-2.28	-2.59	nee

Bemalingsberekening per onderdeel:

Debiet en volume	periode [dagen]	wvl bemalen	reken-methode	Q_{prognose} [m^3/uur]	Q_{hoogst} [m^3/uur]	Q_{laagst} [m^3/uur]	V_{prognose} [m^3]	V_{hoogst} [m^3]	V_{laagst} [m^3]
kelderbak	100	1 2	3D-model	1.0	1.1	0.7	2418	2682	1562

Project : Heinekenhoek te Amsterdam
Projectnummer : 101702151
Bemaling : kelderbak
Bodemprofiel : DKM1
Datum : 12-11-2015



input bodemopbouw	γ [kN/m ³]	top [m+NAP]	dikte [m]	opb1 [kN/m ²]	opb2 [kN/m ²]	opb3 [kN/m ²]
zand, los (onverzadigd)	17	1.29	1.67			
zand, los (verzadigd)	19	-0.38	0.72			
klei, sterk zandig	19	-1.1	0.9			
zand, sterk siltig/kleiig (verzadigd)	20	-2	0.7			
klei, matig	17	-2.7	0.8	10.2	10.2	
veen, matig slap (matig voorbelas)	11	-3.5	1.5	16.5	16.5	
klei, matig	17	-5	2.4	40.8	40.8	
zand, sterk siltig/kleiig (verzadigd)	20	-7.4	2.1		42	
klei, matig	17	-9.5	2.5		42.5	
veen, matig slap (matig voorbelas)	11	-12	0.5		5.5	
zand, vast (verzadigd)	21	-12.5	2.8			
zand, sterk siltig/kleiig (verzadigd)	20	-15.3	2.2			
zand, vast (verzadigd)	21	-17.5	12.5			
klei, zwak zandig, vast	20	-30				

input berekening	parameter
$z_{d,min}$ [m+NAP]	-2.9
$z_{d,max}$ [m+NAP]	-2.9
z_{mv} [m+NAP]	1
b_{bodem} [m]	10
talud $a=(z_{mv}-z_d) \times \text{talud}$	1:0
f_{min}	0
f_{max}	0
h_{ghg-o1} [m+NAP]	-1.29
h_{ghg-o2} [m+NAP]	-2.28
h_{ghg-o3} [m+NAP]	nb
h_{act-o1} [m+NAP]	-1.44
h_{act-o2} [m+NAP]	-2.59
h_{act-o3} [m+NAP]	nb
z_{o1} [m+NAP]	-7.4
z_{o2} [m+NAP]	-12.5
z_{o3} [m+NAP]	nb
veiligheidsfactor	1.1


z_d = ontgravingsniveau,
 z_o = opbarstniveau, z_{mv} = start niveau
 ontgraving, h = grondwaterstand

$$(1) u_{z;d} < \gamma_{2;d} \times d_{2;d} + f \times \gamma_{1;d} \times d_{1;d}$$

$$(2) f = \frac{2}{\pi} \left(\left(1 + \frac{b}{a} \right) \times \arctan\left(\frac{d_2}{a+b}\right) - \frac{b}{a} \times \arctan\left(\frac{d_2}{b}\right) \right)$$

output $z_{d,max}$ (maximaal ontgravingsniveau)	$u_{z;d}$ [kN/m ²]	$u_{z;d}$ [kN/m ²]	$h_{k,v}$ [m+NAP]	h_k [m+NAP]	Δh_{act} [m]	Δh_{max} [m]
opbarstniveau 1	51.6	57.3	-2.14	-1.56	0.70	0.85
opbarstniveau 2	132.6	147.3	1.01	2.52	0.00	0.00
opbarstniveau 3	132.6	147.3				

Formule 1 bepaling rekenwaarde grondwaterdruk, formule 2 is theorie van Boussinesq. Bron: NEN9997-1+C1:2012

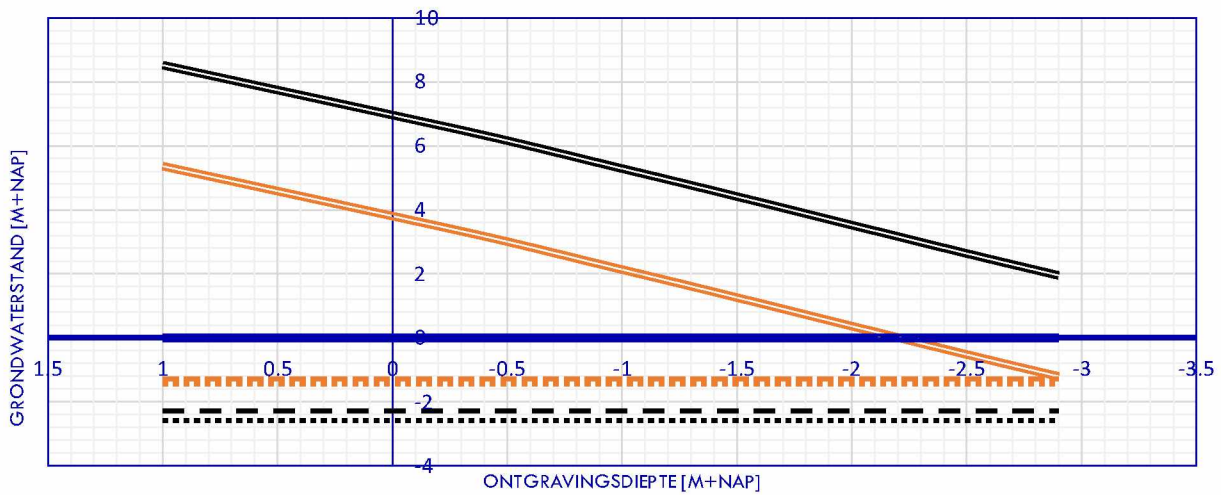

— hkr o1 - - - hghg o1 hact o1 = = = hkr o2 - - - hghg o2

Project : Heinekenhoek te Amsterdam
Projectnummer : 101702151
Bemaling : kelderbak
Bodemprofiel : DKM1
Datum : 12-11-2015
Bemalingsduur : 100 dagen

input bodemopbouw	top [m+NAP]	k_t [m/dag]	k_v [m/dag]	type	S of μ	kD [m ² /dag]	R of λ
deklaag	1.29	10	1	onverzadigd	0.3		
watervoerende laag 1	-0.38	0.1~10	0.05~1	freatisch	0.3	23.2	81
slecht doorlatende laag 1	-2.7	0.001~0.5	0.001~0.003	slecht doorlatend	0.000465		
watervoerende laag 2	-7.4	4	2	spanningswater	0.000433	8.4	202
slecht doorlatende laag 2	-9.5	0.005~0.1	0.001~0.003	slecht doorlatend	0.000156		
watervoerende laag 3	-12.5	3~20	0.3~10	spanningswater	0.000174	350	972
slecht doorlatende laag 3	-30	0.00005	0.001	slecht doorlatend			

input grondwaterstanden	peilbuis	h_{ghg} [m+NAP]	h_{act} [m+NAP]	h_{glg} [m+NAP]	Δh_{ghg} [m]	Δh_{act} [m]	Δh_{glg} [m]
watervoerende laag 1	E05155 A	-0.2	-0.38	-0.76	2.5	2.32	1.94
watervoerende laag 2	E05736 B	-1.29	-1.44	-2.13	0.85	0.7	0.01
watervoerende laag 3	E05081 C	-2.28	-2.59	-3.56	0	0	0


input afmeting	minimaal	maximaal
lengte bouwput [m]	30	30
breedte bouwput [m]	1.5	20
diepte bouwput [m+NAP]	-2.9	-2.9

$$(1) \Delta h_w = \frac{Q_0}{2\pi \times k \times D} \times Ln \frac{R}{r} \quad (2) \Delta h_w = \frac{Q_0}{2\pi \times k \times D} \times K_0 \left(\frac{r}{\lambda} \right)$$

Formule 1 van Thiem, analytische benadering voor verlaging in stationaire toestand bij freatisch grondwater. Formule 2 van De Glee, analytische benadering voor verlaging in stationaire toestand bij semi-spanningswater.

output prognose debiet [m ³ /dag]	formule	analytisch Q_{ghg}	analytisch Q_{act}	analytisch Q_{glg}	remmende objecten in model	model Q_{ghg}	model Q_{act}	model Q_{glg}
watervoerende laag 1	Thiem	224	208	174	ja	20	19	16
watervoerende laag 2	De Glee	22	18		ja	7	6	
watervoerende laag 3								

output debiet	$Q_{wctervergunning}$		$Q_{bemalingsinstallatie}$		Totale hoeveelheid onttrokken grondwater bij 100 dagen	
	[m ³ /uur]	[m ³ /dag]	[m ³ /uur]	[m ³ /dag]	maximaal [m ³]	minimaal [m ³]
watervoerende laag 1	1	19	1	20	2000	1600
watervoerende laag 2	0	6	0	7	700	
watervoerende laag 3						

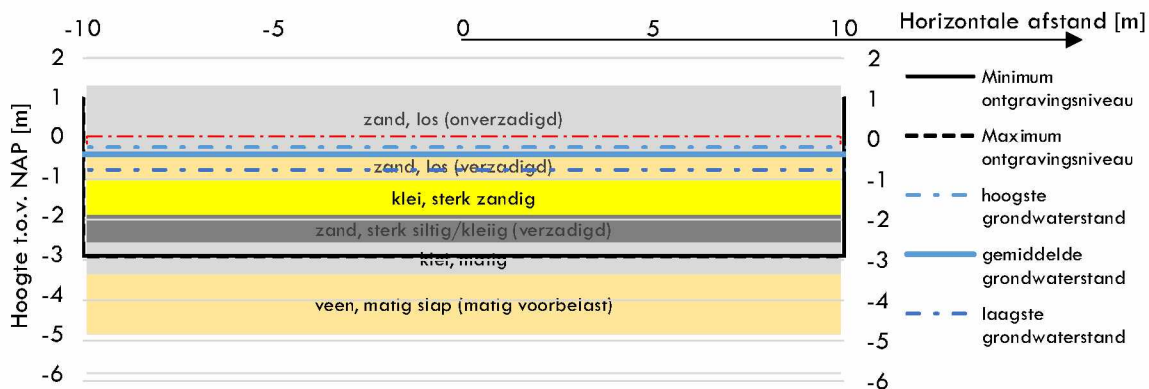













k_t =horizontale doorlatendheid, k_v =verticale doorlatendheid, S=elastische bergingscoëfficiënt, μ =freatische bergingscoëfficiënt, h_{act} =actuele of verwachte grondwaterstand, h_{glg} =gemiddeld laagste grondwaterstand, h_{ghg} =gemiddeld hoogste grondwaterstand, R=reikwijdte, λ =spreidingslengte, Δh_{act} =verlaging bij actuele grondwaterstand, Δh_{glg} =verlaging bij gemiddeld laagste grondwaterstand, Δh_{ghg} =verlaging bij gemiddeld hoogste grondwaterstand, Q_{ghg} =debiet bij gemiddeld hoogste grondwaterstand, Q_{act} =debiet bij actuele grondwaterstand, Q_{glg} =debiet bij gemiddeld laagste grondwaterstand, $Q_{wctervergunning}$ =debiet opgave bij vergunning, $Q_{bemalingsinstallatie}$ =debiet ontwerpwaarde bemaling

Bijlage 4 – Tekeningen project en omgeving



Kadaster - Basisregistraties Adressen en Gebouwen legenda

 Pand voor 1600	 Pand 1945 - 1959	 Pand 2000 - 2009
 Pand 1600 - 1699	 Pand 1960 - 1969	 Pand 2010 - 2019
 Pand 1700 - 1799	 Pand 1970 - 1979	
 Pand 1800 - 1899	 Pand 1980 - 1989	
 Pand 1900 - 1944	 Pand 1990 - 1999	

omschrijving:

HEINEKENHOEK

opdrachtgever:

CRUX ENGINEERING BV

schaal:

N.V.T.

order:

10170215

tekeningnummer:

1

formaat:

A4

getekend:

EL

datum:


11-11-2015



Loots Grondwatertechniek
independent guide for your dewatering site

Pedro de Medinalaan 1B
1086XK Amsterdam

info@lootsgwt.com

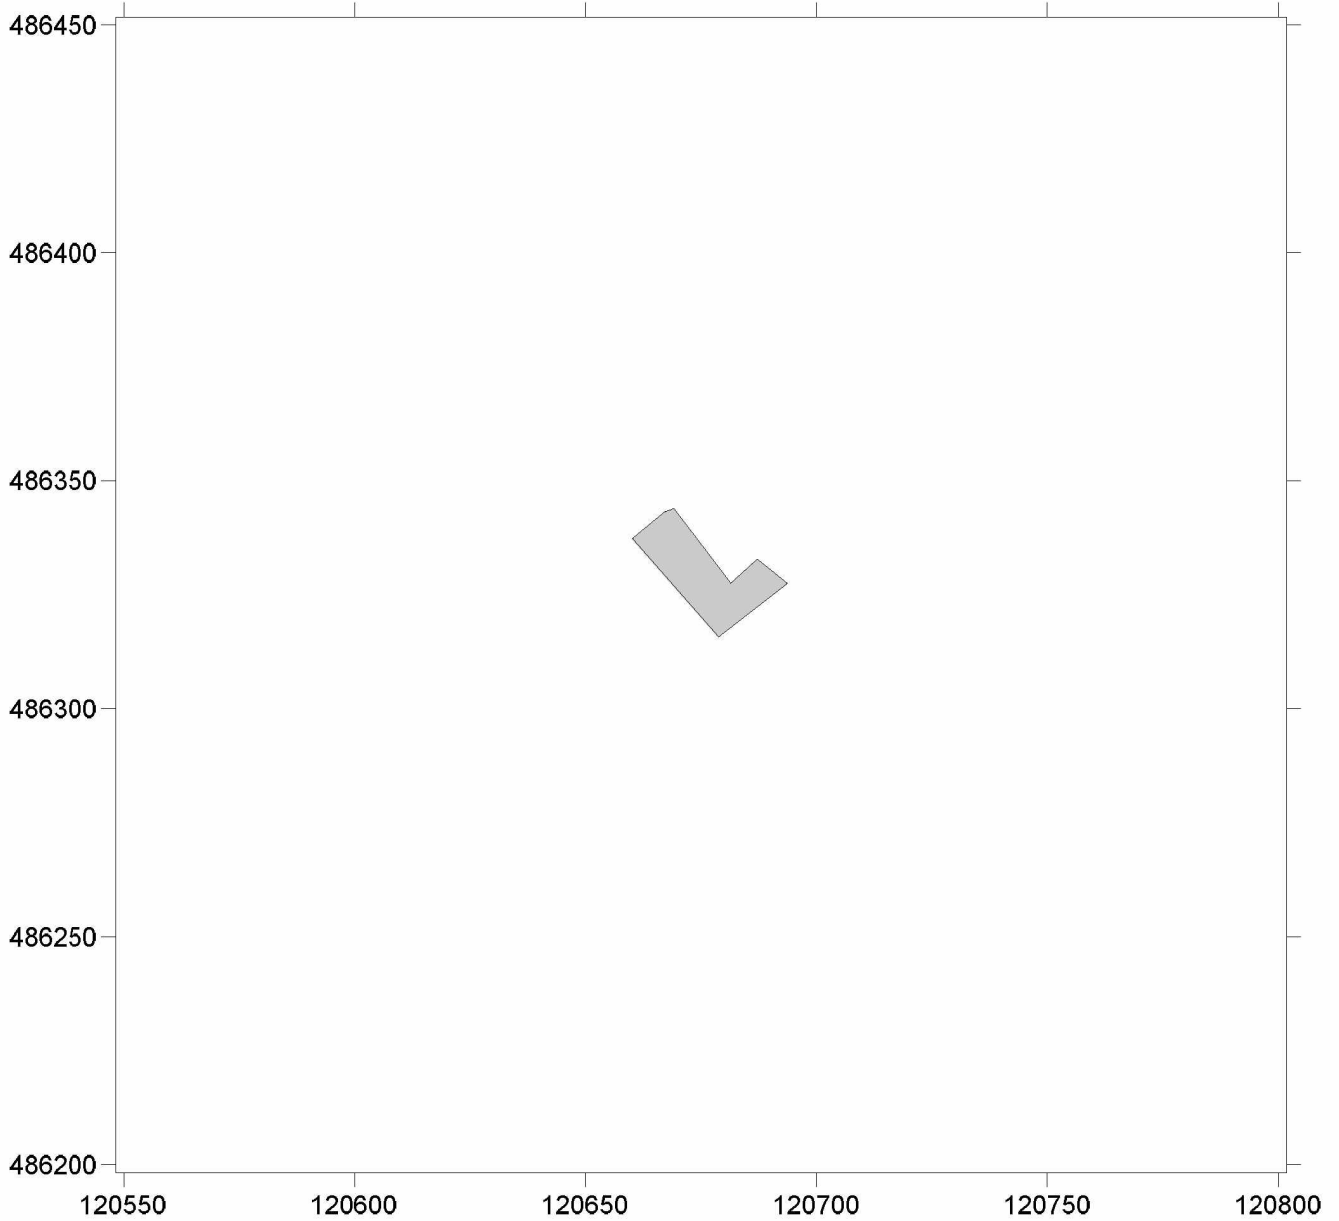

Grondwaterbescherming en -onttrekking (GBO Provincies) legenda

- Grondwateronttrekking
- Grondwaterbescherming gebied
- Boringvrije zone

omschrijving:
HEINEKENHOEK
 opdrachtgever:
CRUX ENGINEERING BV

schaal:
 N.V.T.

order:
 10170215

tekeningnummer:
 2

formaat:
 A4

getekend:
 EL


datum:
 11-11-2015







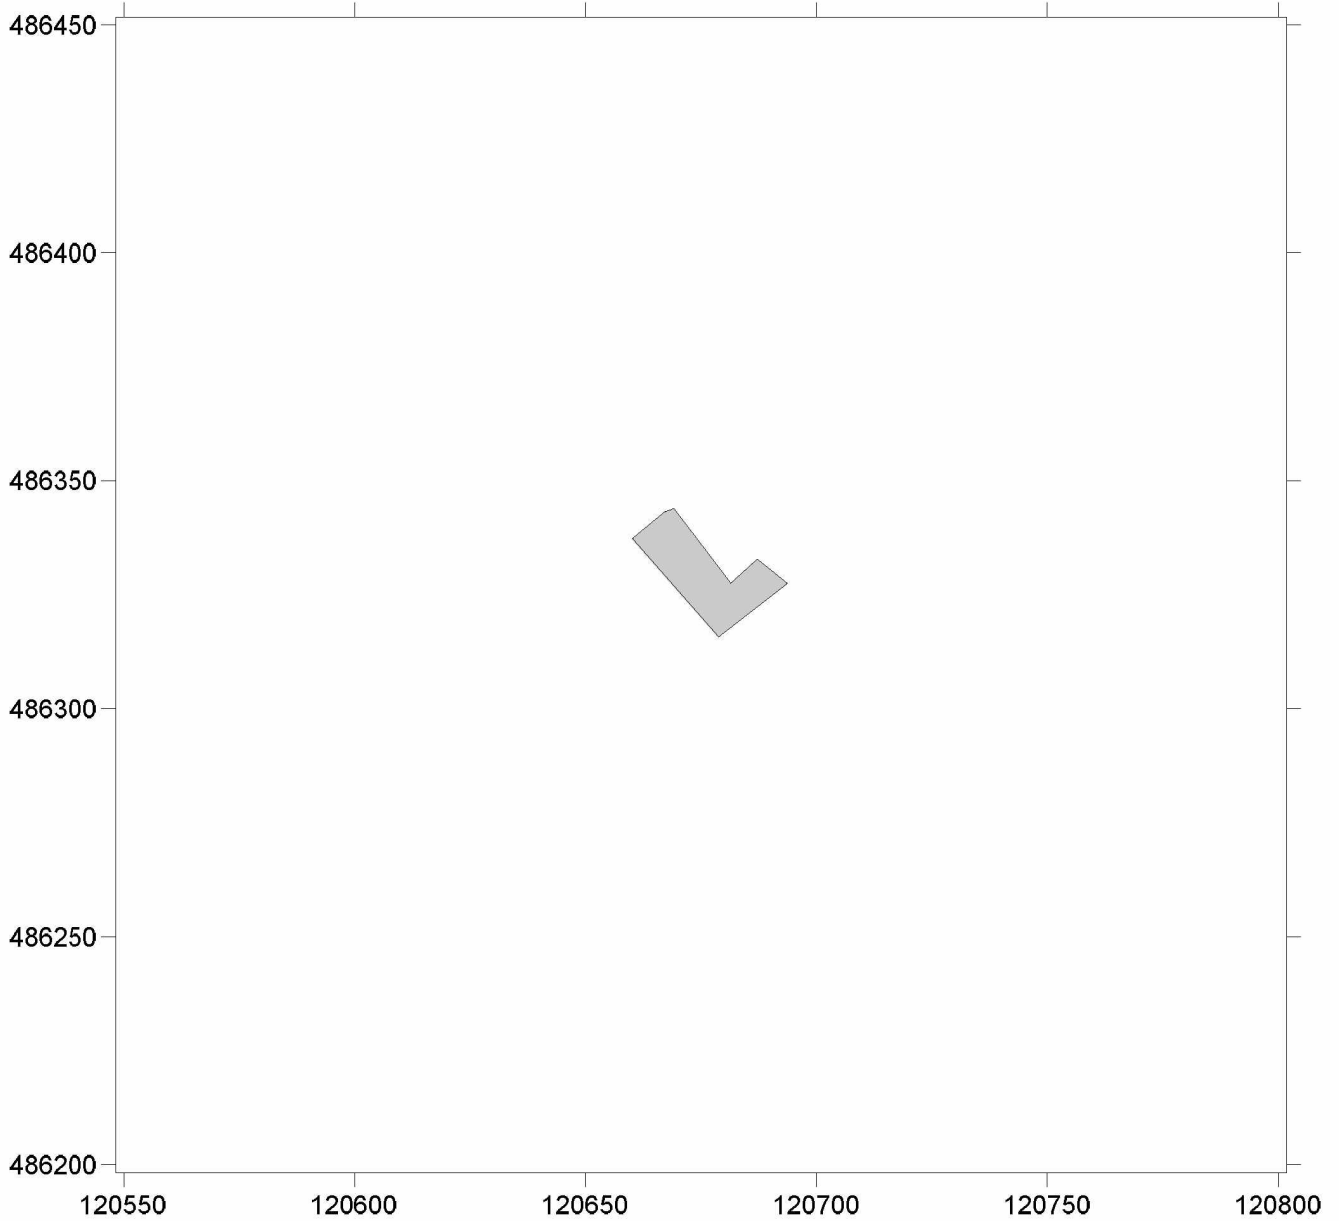

Loots Grondwatertechniek
independent guide for your dewatering site

Pedro de Medinalaan 1B
 1086XK Amsterdam

info@lootsgwt.com



Natura 2000 gebieden (Publieke Dienstverlening op kaart) legenda

- | | |
|--|--|
|  Habitatrictlijn |  Vogelrichtlijn en Habitatrictlijn |
|  Vogelrichtlijn |  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn en Natuurbeschermingswet |
|  Habitatrictlijn en Natuubeschermingswet | |
|  Vogelrichtlijn en Natuubeschermingswet | |

omschrijving:

HEINEKENHOEK

opdrachtgever:

CRUX ENGINEERING BV

schaal:
N.V.T.

order:
10170215

tekeningnummer:
3

formaat:
A4

getekend:
EL


datum:
11-11-2015



Loots Grondwatertechniek
independent guide for your dewatering site

Pedro de Medinalaan 1B
1086XK Amsterdam

info@lootsgwt.com

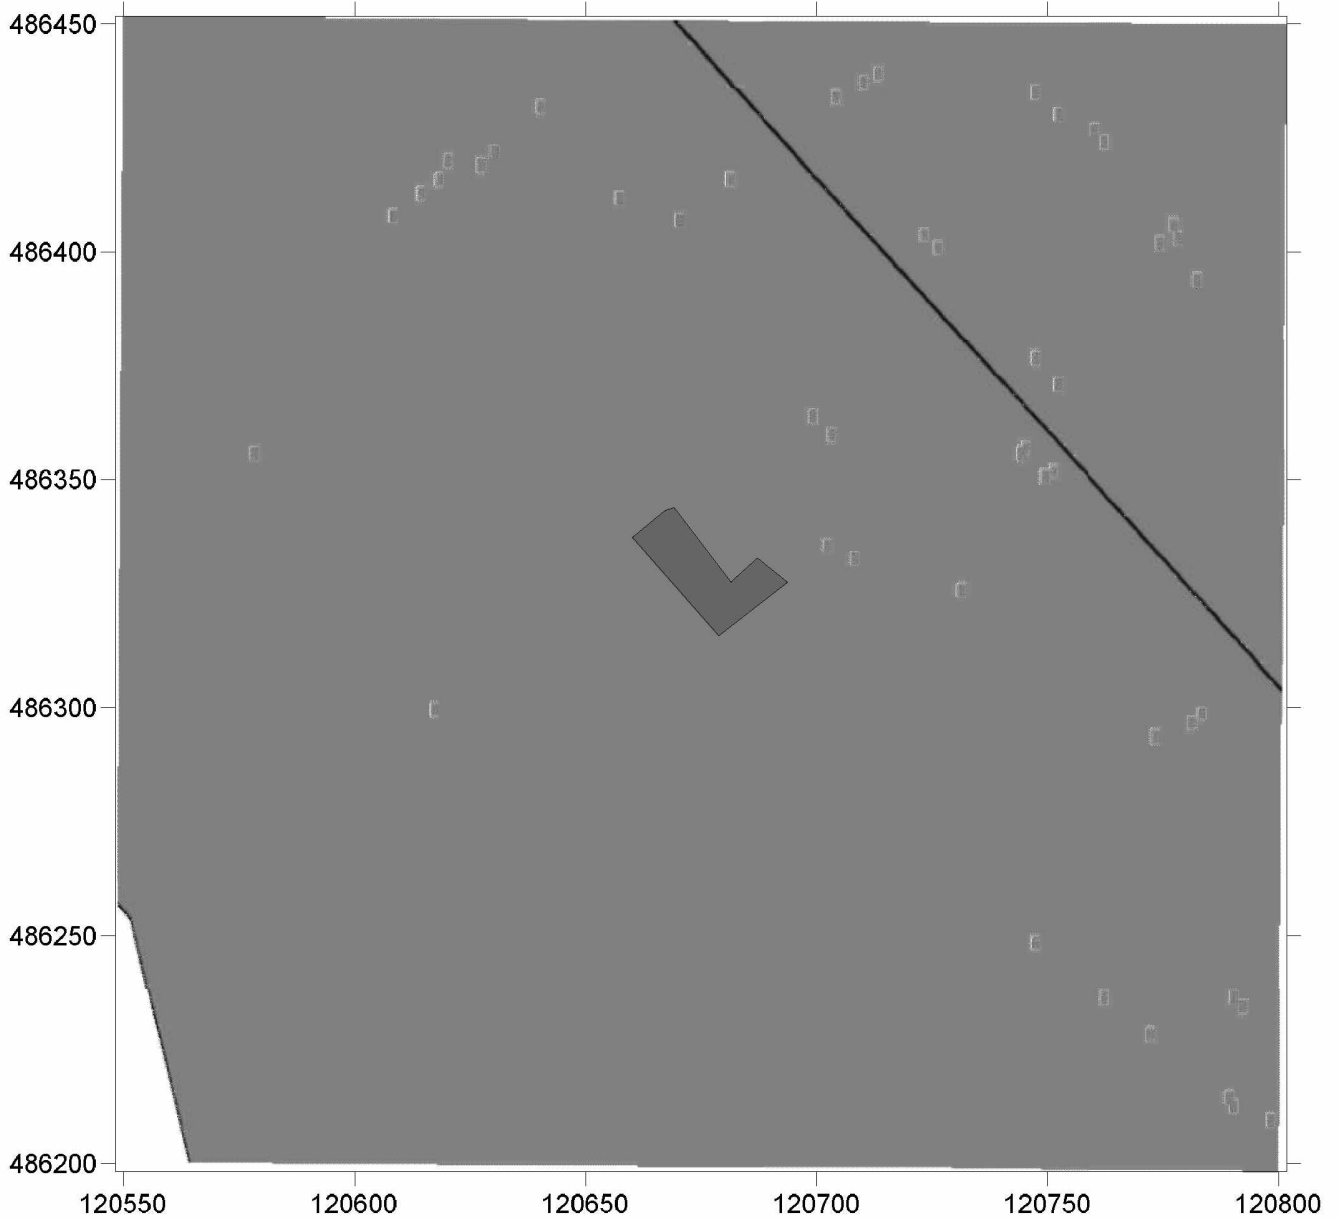

IKAW Monumentenkaart, Rijksdienst Cultureel Erfgoed legenda

- Locatie Rijksmonument
- Omtrek locatie archeologie (IKAW)

schaal:
N.V.T.

order:
10170215

tekeningnummer:
4

omschrijving:

HEINEKENHOEK

opdrachtgever:

CRUX ENGINEERING BV

formaat:
A4

getekend:
EL

datum:
11-11-2015



Loots Grondwatertechniek
independent guide for your dewatering site

Pedro de Medinalaan 1B
1086XK Amsterdam

info@lootsgwt.com



Kadaster - Top10NL kaart legenda

Snelweg	Fietspad	Water
Hoofdweg	Promenade	Grasland
Regionale weg	Busbaan	Akkerland
Lokale weg	Spoorbaan	Bomen

schaal:
N.V.T.

order:
10170215

tekeningnummer:
5

formaat:
A4

getekend:
EL

datum:
11-11-2015

omschrijving:

HEINEKENHOEK

opdrachtgever:


CRUX ENGINEERING BV



Loots Grondwatertechniek
independent guide for your dewatering site

Pedro de Medinalaan 1B
1086XK Amsterdam

info@lootsgwt.com

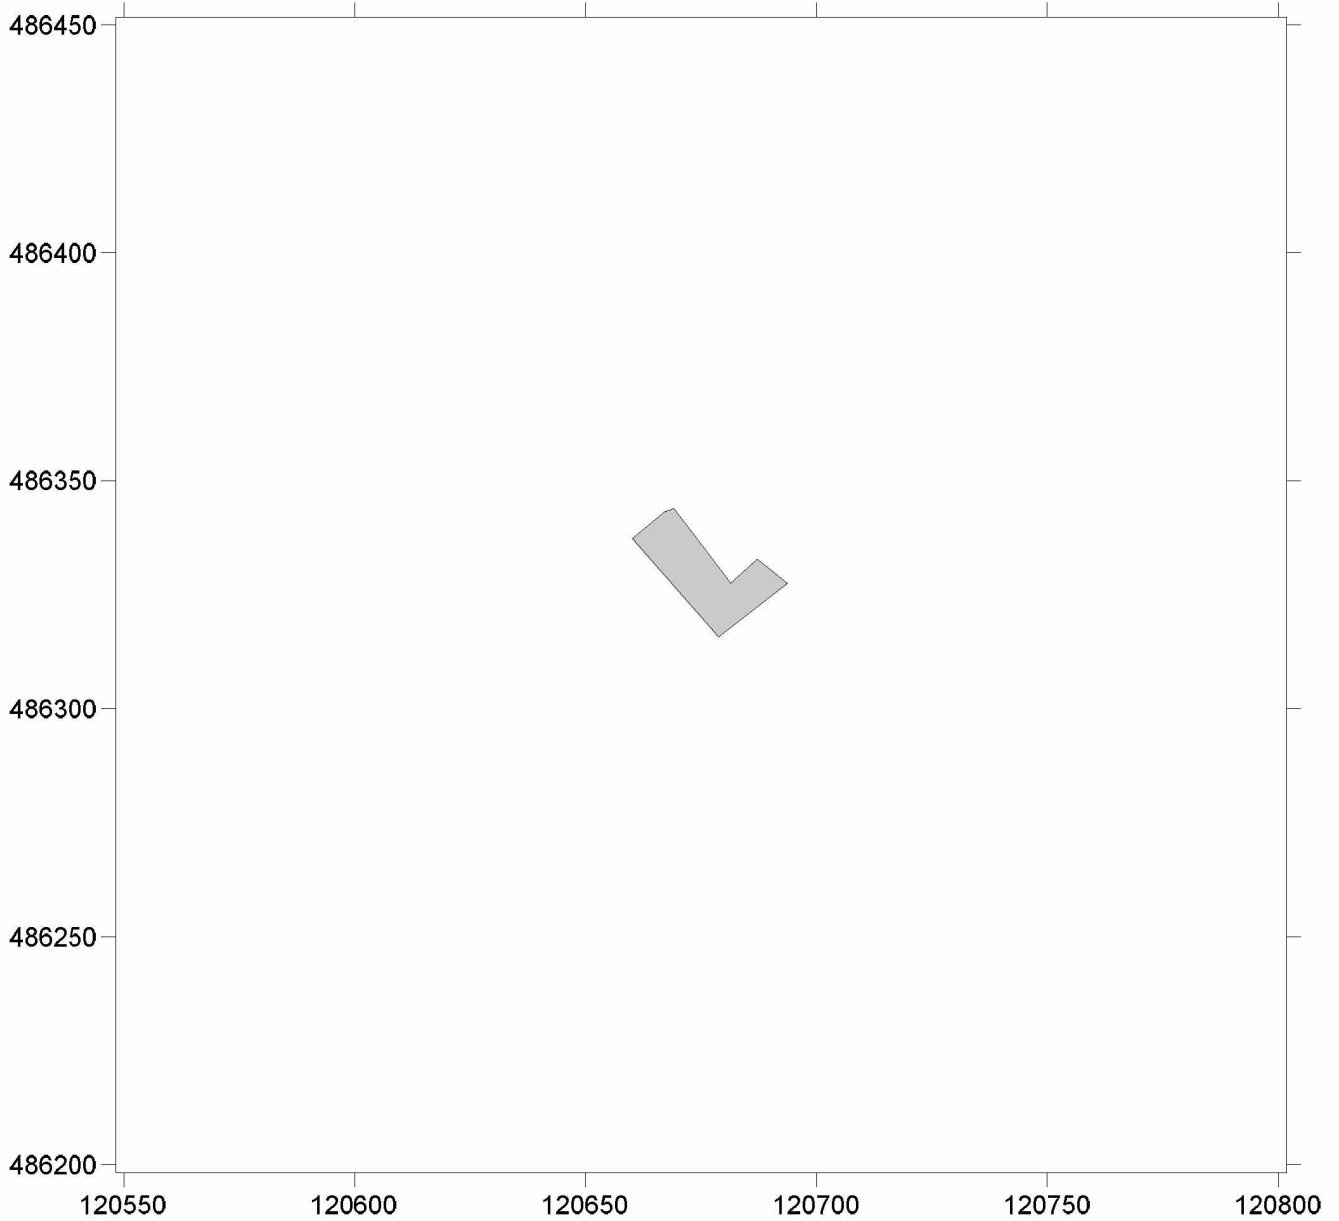

Basisregistratie Percelen (Dienst Regelingen) legenda

- Bouwland
- Grasland
- Braakland
- Natuurterrein
- Overige

omschrijving:

HEINEKENHOEK

opdrachtgever:

CRUX ENGINEERING BV

schaal:
N.V.T.

order:
10170215

tekeningnummer:
6

formaat:
A4

getekend:
EL


datum:
11-11-2015







Loots Grondwatertechniek
independent guide for your dewatering site

Pedro de Medinalaan 1B
1086XK Amsterdam

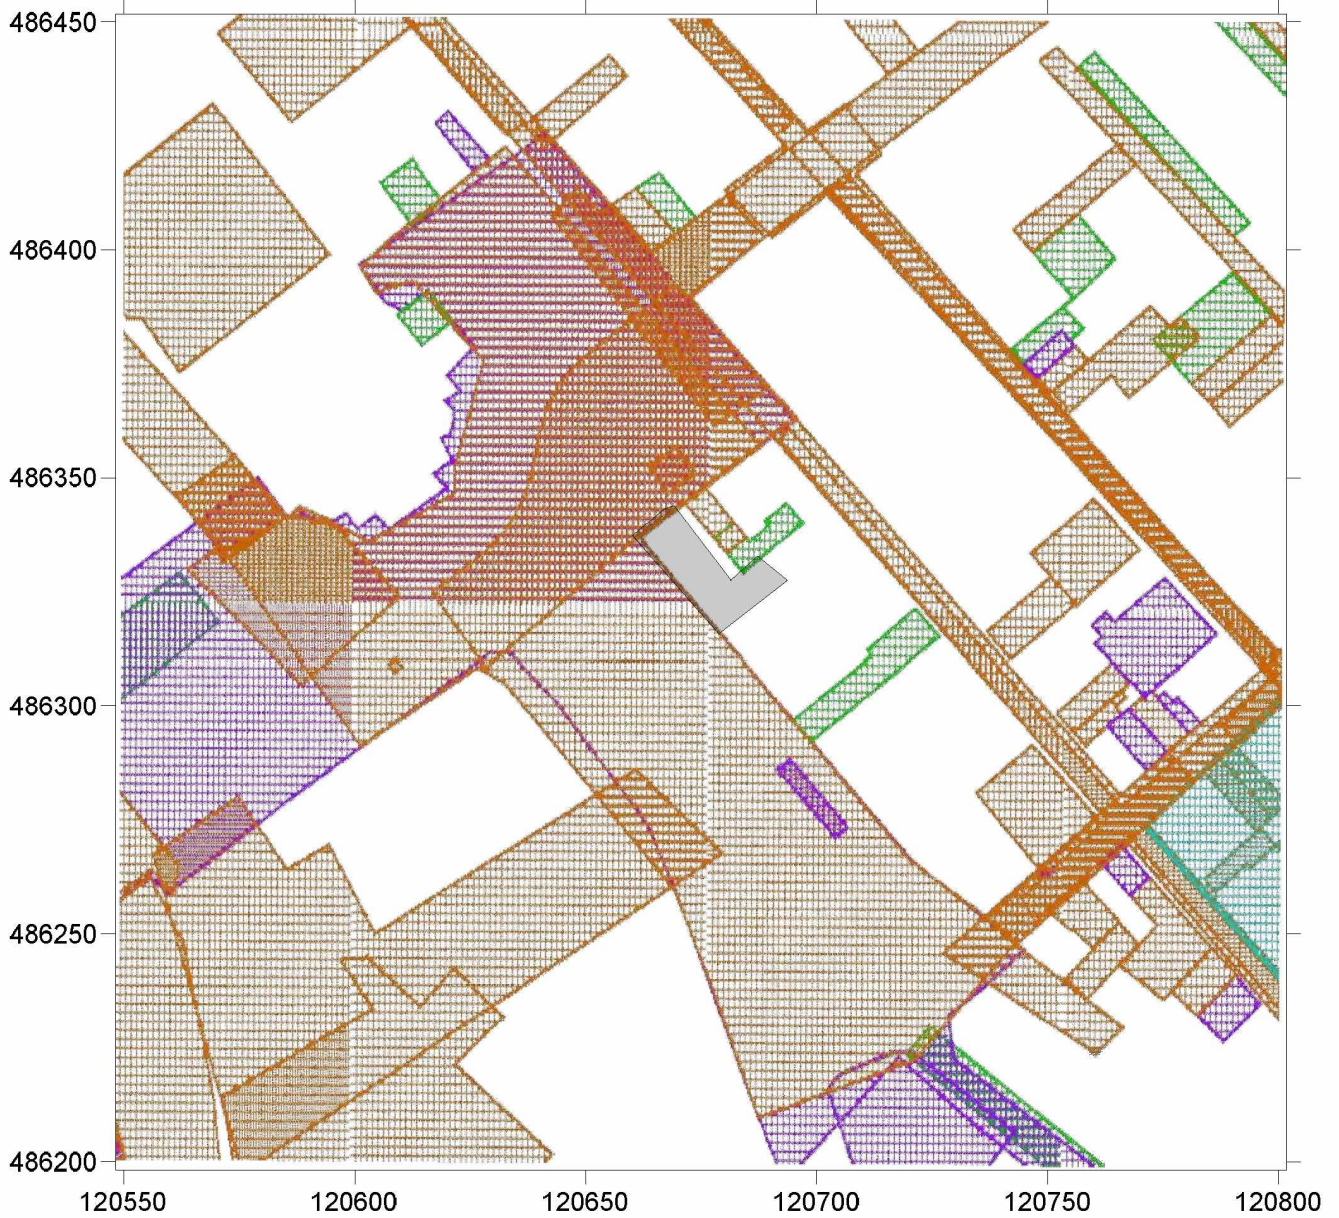info@lootsgwt.com



Rijkswaterstaat bodemloket legenda

-  Gesaneerd
-  Onderzoek uitgevoerd, geen noodzaak tot verder onderzoek of sanering
-  Onderzoek uitgevoerd, verder onderzoek kan noodzakelijk zijn
-  Historische activiteit bekend

omschrijving:

HEINEKENHOEK

opdrachtgever:

CRUX ENGINEERING BV

schaal:
N.V.T.

order:
10170215

tekeningnummer:
7

formaat:
A4

getekend:
EL

datum:
11-11-2015




Loots Grondwatertechniek
independent guide for your dewatering site


Pedro de Medinalaan 1B
1086XK Amsterdam


info@lootsgwt.com


Bijlage 5 – Grondonderzoeken

Bijlage I Situatietekening met sondeerlocaties en sonderingen

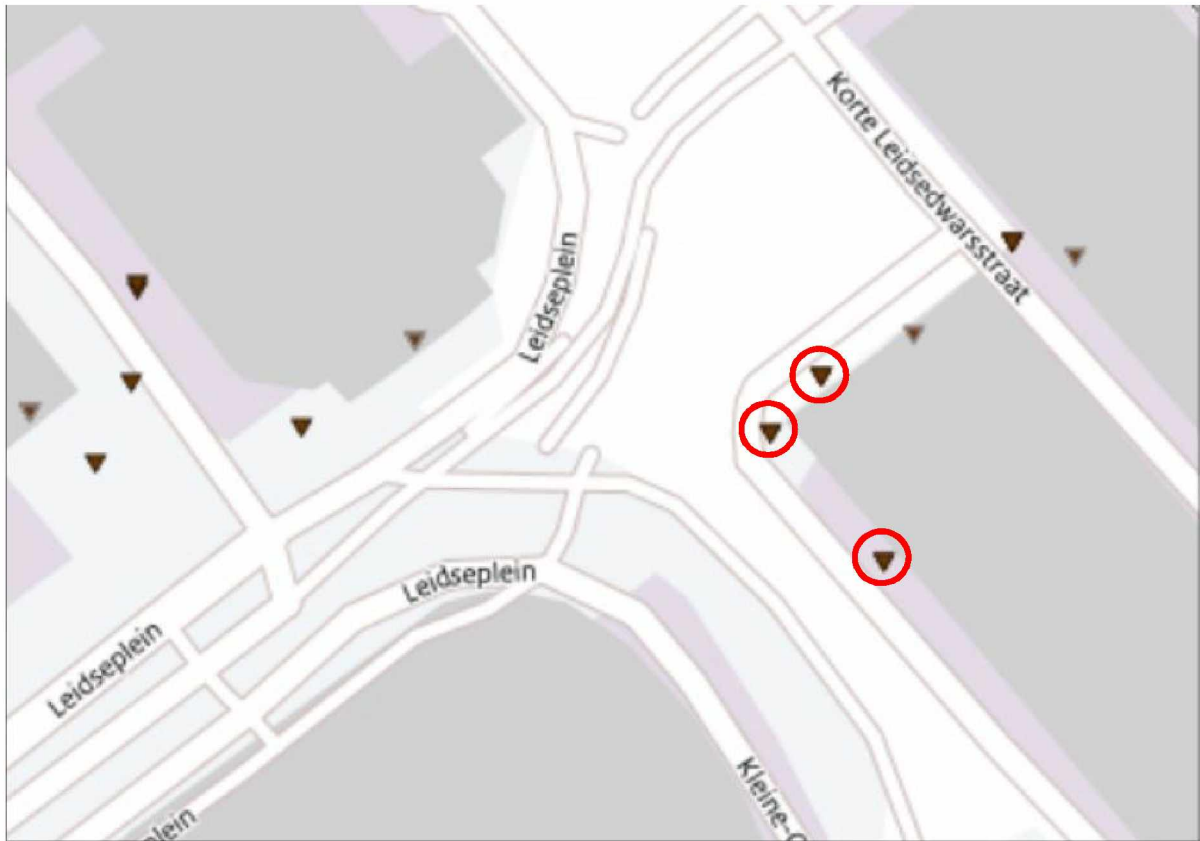

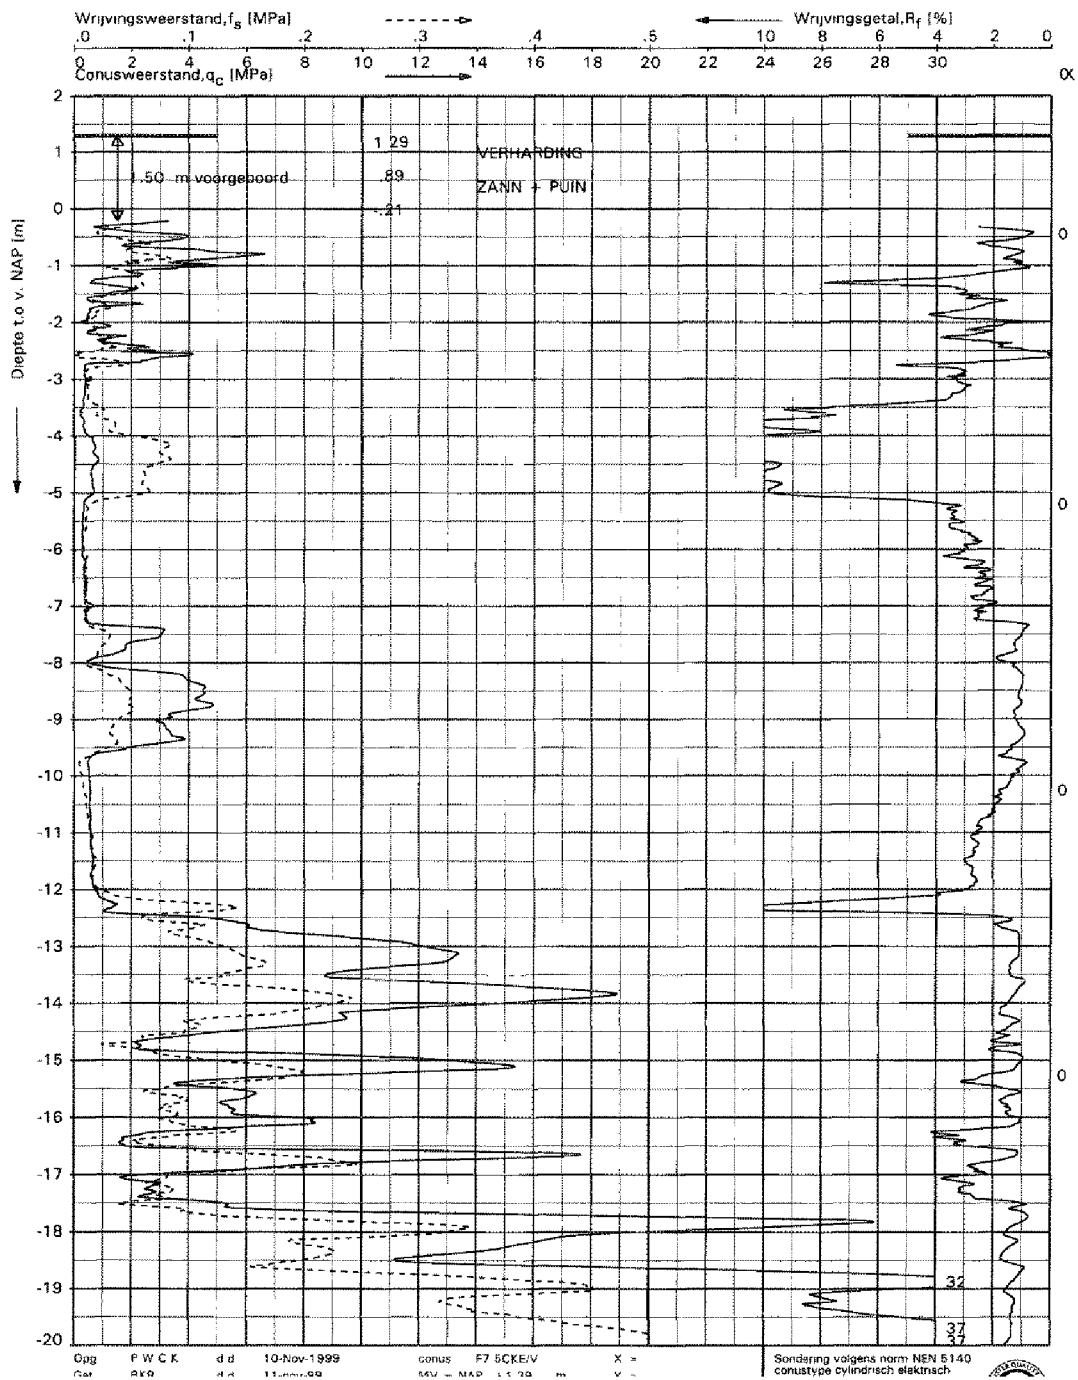

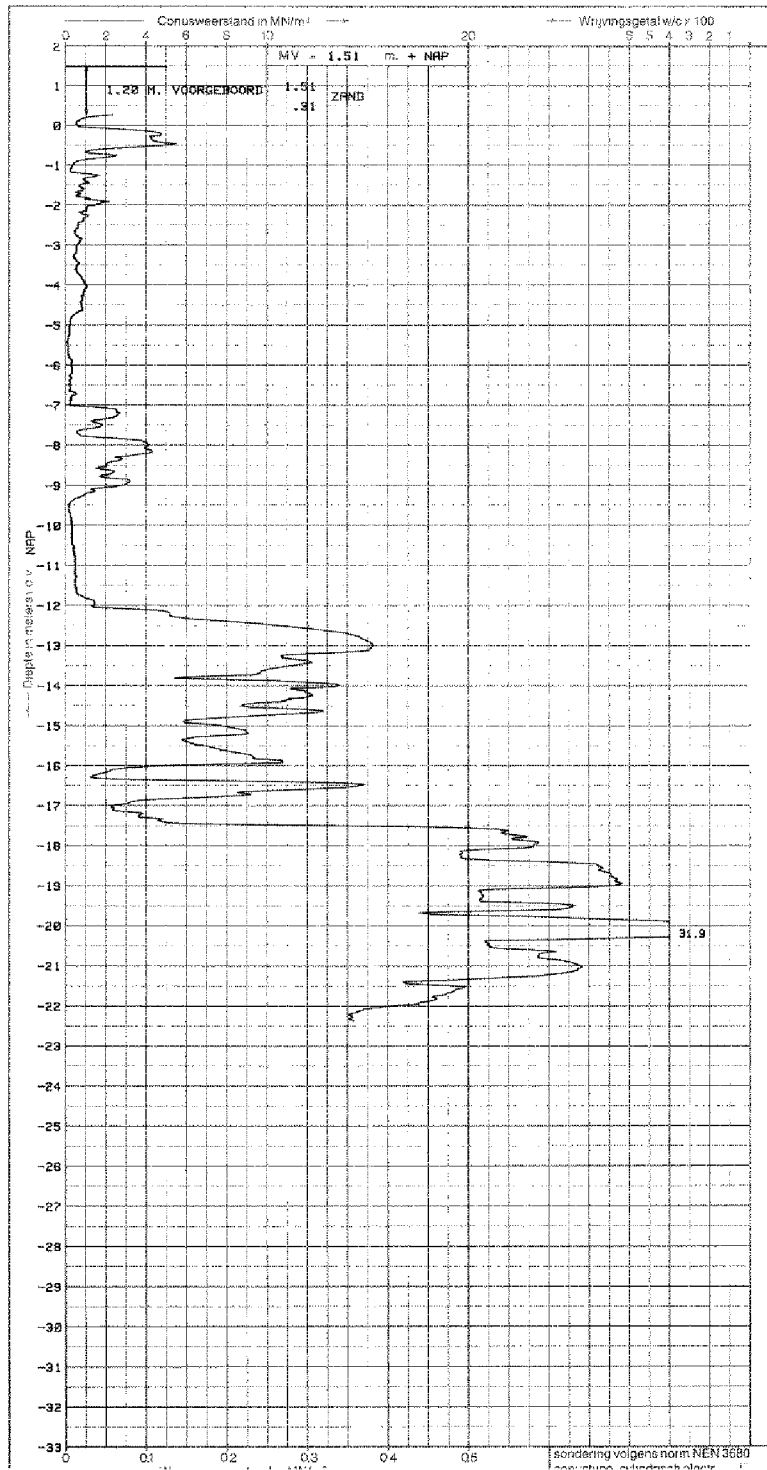

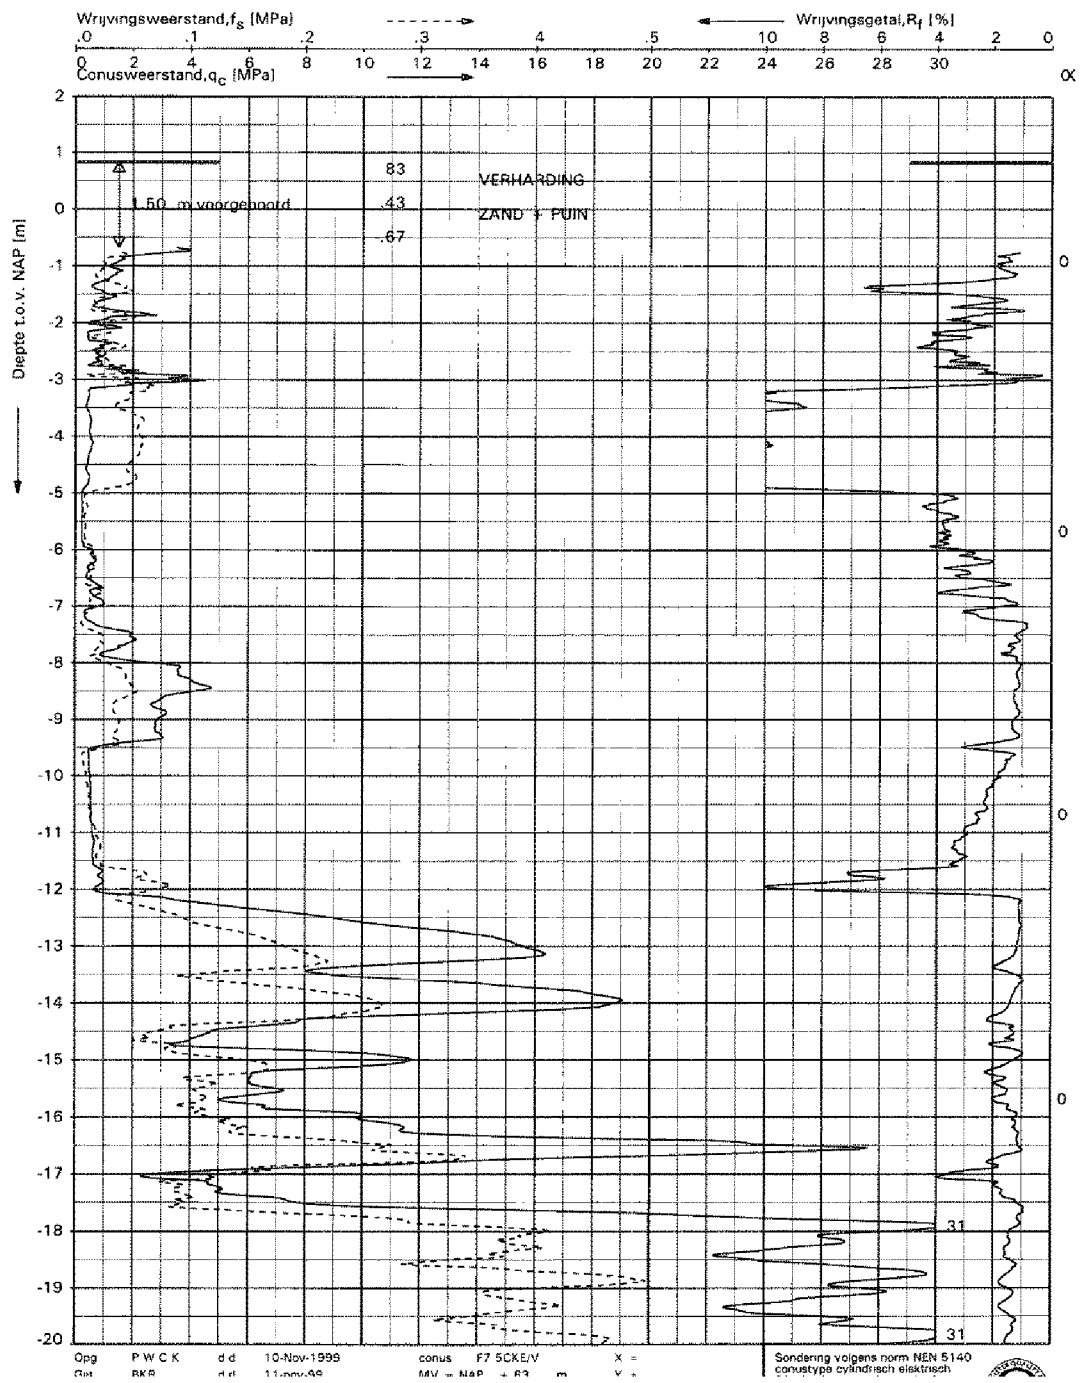

Bijlage 6 – Grondwater eigenschappen

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Overzicht van de gebruikte peilbuismetingen en locaties, berekende maatgevende grondwaterstanden over lange termijn in een tabel;
- Overzicht van de gebruikte peilbuismetingen en locaties, berekende maatgevende grondwaterstanden per seizoen (maand);
- Meetgrafieken grondwaterstanden.

