



## Afbouw Pilot Knip Weesperstraat 19 juli 2023

### Aanvulling/wijziging afbouw Pilot Knip Weesperstraat

De Pilot Knip Weesperstraat eindigt op zondagavond 23 juli om 23.00.uur.  
Daartoe is er een inzetplan gemaakt voor de afbouw van de verkeersmaatregelen  
Er is gekozen om de afbouw plaats te laten vinden op de vrijdag en zondag en zo de drukere zaterdag te ontzien.

**NB: alle werkzaamheden voor de afbouw vinden plaats binnen het tijdsframe van de pilot, dus er is geen verkeer anders dan tijdens de pilot aanwezig.**  
**De rijbanen gaan definitief om 23.00. open.**

#### *Inzet verkeersregelaars*

Tijdens de afbouw worden er voldoende verkeersregelaars ingezet om deze zo veilig en vlot als mogelijk te laten voortgaan.  
Het aantal zal gelijk zijn aan dat tijdens de opbouw, plusminus 25 in het pilotgebied.  
Een aantal hiervan is direct elders in het gebied inzetbaar wanneer nodig.


#### Verkeersmaatregelen

Extra bakens/schildjes worden geplaatst ter vervanging van de weggehaalde bloembakken en slagbomen door BUKO via Stadswerken. Na de afbouw worden ook deze weggehaald door BUKO waarna de rijbanen worden opengesteld.  
Anne Frankstraat en Hoogte Kadijk worden VOOR zondag 23.00.uur al opengesteld.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de contractpartijen met goeddeels dezelfde mensen die ook bij de opbouw betrokken waren. Deze mensen zijn ervaren met de straat en het verkeersbeeld voor en tijdens de Knip.

## Afwijkende werkwijze Weesperstraat

Tijdens het weghalen van de ruim 200 bloembakken naast de rijbanen van de Weesperstraat wordt vanaf de afgesloten rijbanen gewerkt met een mobiele kraan (zie tekening). De bloembakken worden op een bakwagen geplaatst die op een van de in gebruik zijnde rijbanen staat te wachten. Verkeer dat aan komt rijden wordt door verkeersregelaars opgevangen en verzocht te wachten totdat de bakwagen vol is en weg rijdt. Dit kan enkele minuten duren. Voor zover mogelijk worden de bloembakken vooruitlopend aan een kant van de afgesloten rijbanen gezet zodat de bakwagen van de rijbaan af kan tijdens het laden. Nood en hulpdiensten kunnen desgewenst passeren over de rijbaan in tegengestelde richting. Overig verkeer daar wordt dan tegengehouden door verkeersregelaars.

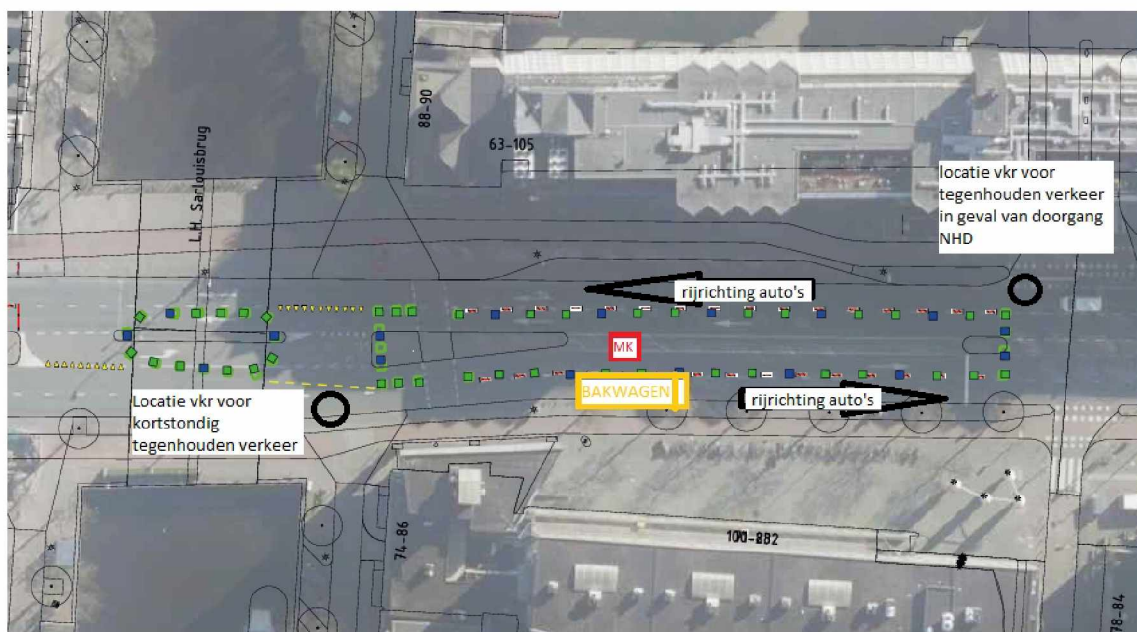

Deze werkwijze wordt op elk deel van de betreffende delen van de Weesperstraat aangehouden.

Op de overige locaties worden de schrikhekken ruim voor de slagbomen geplaatst zodat er veilig aan kan worden gewerkt.

Dit betreft dan de Kattenburgergracht, Hoogte Kadijk en Anne Frankstraat.

Bij de schrikhekken staan verkeersregelaars.

Per locatie volgt hieronder de globale uitvoeringsplanning

Locatie	datum	werkzaamheden	tijden	Vkr's
Rhijnspoorplein/ Wibautstraat	Vrijdag 21 juli	Verwijderen barriers/markering en herstel rijstrook/wegmarkeringen en plaatsen schildjes/schrikhekken(BUKO)  Aanpassen VRI ( Vialis)  Verwijderen schildjes en schrikhekken(BUKO)  Daarna openstellen rijbaan	o6.00.  Na 13.00.uur  13.00.  Tussen 21.00.-23.00.	2
Mr. Visserplein/ Valkenburgerstraat	Vrijdag 21 juli	Verwijderen barriers Afvoeren bloembakken met behulp van rijdende afzetting. Plaatsen schildjes/schrikhekken ( BUKO)	Vanaf o6.00.uur	11
	Zondag 23 juli	KeerlusJHM afbreken Aanpassen VRI  Verwijderen schildjes en schrikhekken(BUKO)  Daarna openstellen rijbaan	Vanaf o6.00. Vanaf 14.00.  Tussen 21.00.-23.00.	4
Pocketpark Weesperstraat	Vrijdag 21 juli	Afbreken en afvoeren  Plaatsen schildjes de	Vanaf 6.00. tot 18.00.	2

		<p>donderdag ervoor door BUKO.</p> <p>Vervoer bloembakken naar Langelust.</p>		
Weesperstraat/plein	Zondag 23 juli	<p>Slagbomen afbreken</p> <p>Verwijderen schrikhekken Verwijderen schildjes</p> <p>Schoonvegen rijbaan van groenafval door Stadswerken</p> <p>Daarna openstellen rijbaan</p>	<p>Vanaf 14.00</p> <p>Vanaf 16.00.</p> <p>Vanaf 17.00</p> <p>Tussen 19.00.-23.00</p>	7
Anne Frankstraat	Zondag 23 juli	Verwijderen barriers en slagbomen, daarna direct openstellen rijweg.	Vanaf 07.00.uur tot 12.00.	2
Kattenburgergracht	Zondag 23 juli	<p>Plaatsen schildjes/schrikhekken(BUKO)</p> <p>Verwijderen barriers en slagbomen, Verwijderen markering op rijbaan bus Verwijderen thermoplast op fietspad</p> <p>Verwijderen schildjes en schrikhekken(BUKO)</p> <p>Daarna openstellen rijbaan</p>	<p>Vanaf 06.00 uur. Lijn 22 is omgeleid tot 18.00. die dag.</p> <p>Afval&amp; grondstoffen, Stadswerken, tourbussen en bijzonder doelgroepenvervoer hebben geen doorgang tijdens uitvoering</p> <p>Het NHD verkeer heeft doorgang.</p> <p>Tussen 21.00. tot 23.00.</p>	4
Hoogte Kadijk	Zondag 23 juli	<p>Verwijderen barriers en slagbomen</p> <p>Schrikhekken op rijbaan ivm gat in wegdek(BUKO)</p> <p>Reparatie wegdek</p>	<p>Start na afbreken keerlus JHM en Kattenburgerstraat ( rond 14.00.)</p> <p>Openstellen rijweg na afronding werkzaamheden ( naar schatting rond 18.00.)</p>	2

Pilotgebied	Zondag 23 juli	Verwijderen/afdraaien verwijzings en omleidingsborden door BUKO	Vanaf 21.00. uur	nvt
Pilotgebied	Maandag 24 juli	Narijronde borden, bloembakken etc.etc.	Vanaf 08.00. tot klaar 5.1.2.e meldt aan de stadsdeelregisseur dat de bebording daadwerkelijk verwijderd is.	nvt
