

Meting In Uitvoering B.V.
Wateringweg 109
2031 EG HAARLEM

E-mail: info@miu.nu
BTW-id: NL86280502B01
KvK: 90331176
Bank: RABO
IBAN: NL69RABO0167982346
BIC: RABONL2U

BELLAMYSTRAAT 36 TE AMSTERDAM

LINTVOEGWATERPASSING, VLOERWATERPASSING EN N.A.P.-WATERPASSING

19 maart 2024

Opdrachtgever:

De Vlucht Funderingswerk B.V.

Dukdalfweg 53

1041 BC Amsterdam

Bijlage(n):

Tekening 19.088-1A lintvoegwaterpassing

Tekening 19.088-2A vloerwaterpassing

Referentie: 19.088

Behandeld door: 5.1, 2, e

INHOUDSOPGAVE:

Inleiding.....	2
Lintvoegwaterpassing	2
Vloerwaterpassing.....	2
N.A.P.-waterpassing	3
Algemeen	3



INLEIDING

Meting In Uitvoering B.V. heeft in opdracht van De Vlucht Funderingswerk B.V. een lintvoegwaterpassing, een vloerwaterpassing en een N.A.P.-waterpassing uitgevoerd ten behoeve van project Bellamystraat 36 te Amsterdam.

In deze rapportage wordt het resultaat van de lintvoegwaterpassing, de vloerwaterpassing en de N.A.P.-waterpassing weergegeven.

LINTVOEGWATERPASSING

Meting In Uitvoering B.V. heeft een lintvoegwaterpassing uitgevoerd ten behoeve van project Bellamystraat 36 te Amsterdam.

Uitvoeringsdatum:

- 7 maart 2024

Een lintvoegwaterpassing betreft het meten van een voeglijn van een gebouw met als doel het bepalen van de eventuele scheefstand van een gevel van een gebouw.

Het resultaat van de lintvoegwaterpassing is weergegeven op tekening 19.088-1A.

VLOERWATERPASSING

Meting In Uitvoering B.V. heeft een vloerwaterpassing uitgevoerd ten behoeve van project Bellamystraat 36 te Amsterdam.

Uitvoeringsdatum, adres, etage:

- 7 maart 2024, Bellamystraat 36, 1^e verdieping.

Een vloerwaterpassing betreft het meten van een vloer met als doel het bepalen van de eventuele scheefstand van deze vloer. Door inzichtelijk te maken waar de grootste verzakkingen in een vloer zijn opgetreden kan een beeld verkregen worden waar de fundering van een gebouw mogelijk de minste kwaliteit heeft.

Het resultaat van de vloerwaterpassing is weergegeven op tekening 19.088-2A.

N.A.P.-WATERPASSING

Meting In Uitvoering B.V. heeft een N.A.P.-waterpassing uitgevoerd ten behoeve van project Bellamystraat 36 te Amsterdam.

Uitvoeringsdatum, adres, omschrijving, N.A.P.-hoogte:

- 7 maart 2024, Bellamystraat 36, bovenzijde dorpel voor de deur van hal trapopgang naar verdiepingen linkerzijde deur linkerzijde pand, 0.45 m - N.A.P.

Een N.A.P.-waterpassing betreft het meten van de hoogte van de bovenzijde van een vloer op de begane grond van een gebouw ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) met als doel het vaststellen van een eventuele totale zakking sinds de bouw van een gebouw.

ALGEMEEN

Meting In Uitvoering B.V. staat voor u klaar. Indien u vragen heeft over dit rapport kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Gecontroleerd:

5.1, 2, e


METING IN UITVOERING B.V.

Haarlem, 19 maart 2024

BIJLAGE I

Tekening 19.088-1A lintvoegwaterpassing



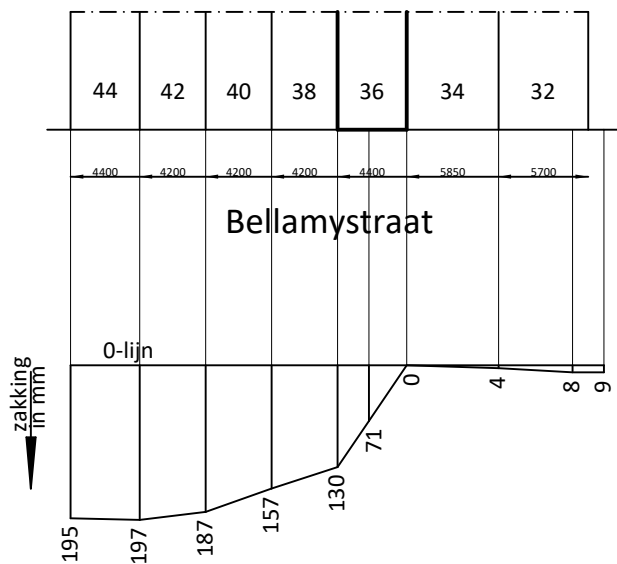

- Zakking is weergegeven in mm t.o.v. het hoogst vastgestelde punt van de lintvoegwaterpassing.



Meting In Uitvoering B.V.

Wateringweg 109
2031 EG HAARLEM
Telefoon 5.1, 2, e
E-mail info@miu.nu

Datum uitvoering
07-03-2024

Get.
HtB

Lintvoegwaterpassing
Bellamystraat 36
Amsterdam

Projectnr.
19.088

Formaat
A4


Tekeningnr.
1A

Schaal
1:500

BIJLAGE II

Tekening 19.088-2A vloerwaterpassing



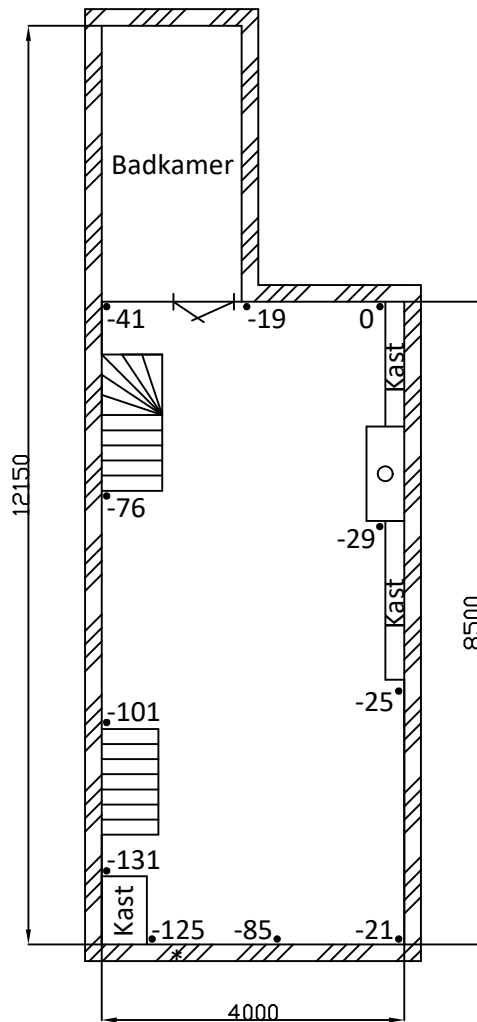

Bellamystraat 36 - 1e verdieping

- • = plaats van meting.
- Zakking is weergegeven in mm t.o.v. het hoogst vastgestelde punt van de vloerwaterpassing.
- * = plaats van gemeten N.A.P.-peil begane grond.
- De bovenzijde dorpel voor deur van hal begane grond Bellamystraat 36 ligt op - 0.45 m N.A.P.

Meting In Uitvoering B.V. Wateringweg 109 2031 EG HAARLEM	Telefoon 5.1, 2, e E-mail info@miu.nu	Datum uitvoering	Get.
		07-03-2024	HtB
Vloerwaterpassing Bellamystraat 36 - 1e verdieping Amsterdam	Projectnr.	Formaat	
	19.088	A4	
	Tekeningnr.	Schaal	
	2A	1:100	
