



Hersteloptie plaatsen kolom

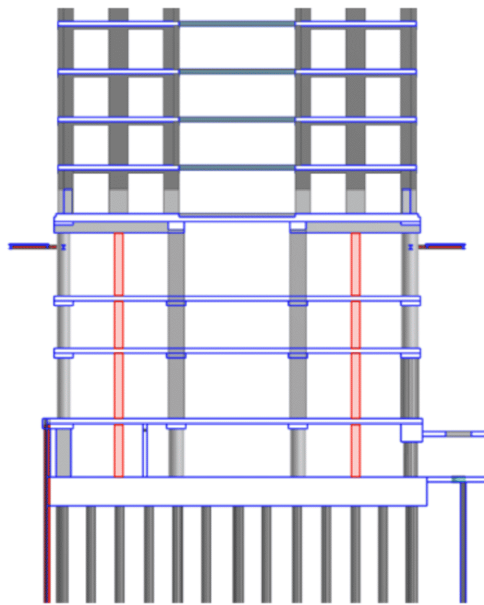

Voorgespannen balk begane grond

Werkzaamheden

Sparing rond 600 door alle vloeren
 Stekken boren in balk 2^e verd. t.b.v. kolom

Sloop/Hydroblasten sparing in voorspan balk BG

Stekken boren in Keldervloer en kop vloergaten iv maanheling

Risico's


Kans op raken wapening en installatie in alle vloeren bij sloop/ boorwerk.

Omdat je geconcentreerd (in afmeting kolom) moet boren is de kans groot op raken (voorspan)wapening.

Kans op raken (voorspan)wapening >> eerst voorspan ontlasten en na kolom weer spannen.

Kans op raken/ doorboren vloerwapening


Hersteloptie Hydroblasten

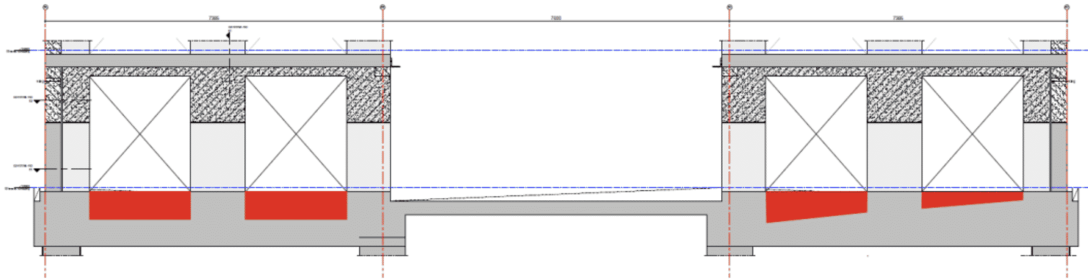

AS R7

Links maximale vlak 2x
1x Rood vlak 600mmx1500mmx2000mm

rechts het te slopen vlak 2x
1 x rood vlak 450mmx1500mmx2000mm

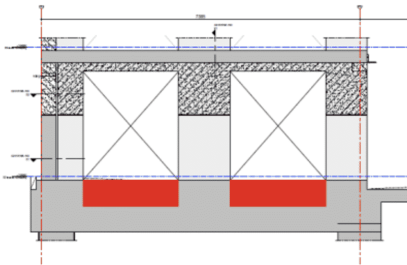

As R1

Werkzaamheden

Hydroblasten betonwerk tot op stortnaad

Risico's

Omhulsul en vet voorspankabels worden weggeblazen > schade aan spankabels


Kans op omliggende schade. Dit gaat met enorm geweld en is deels oncontroleerbaar.

Niet op cm nauwkeurig waardoor kans bestaand meer gesloopt dan nodig.

Haaksebergweg zal volledig afgesloten moeten i.v.m. veiligheid.

Deels met hand slopen bij kolomoplegging met kans op beschadigen voorwapening.

Hersteloptie Trekankers

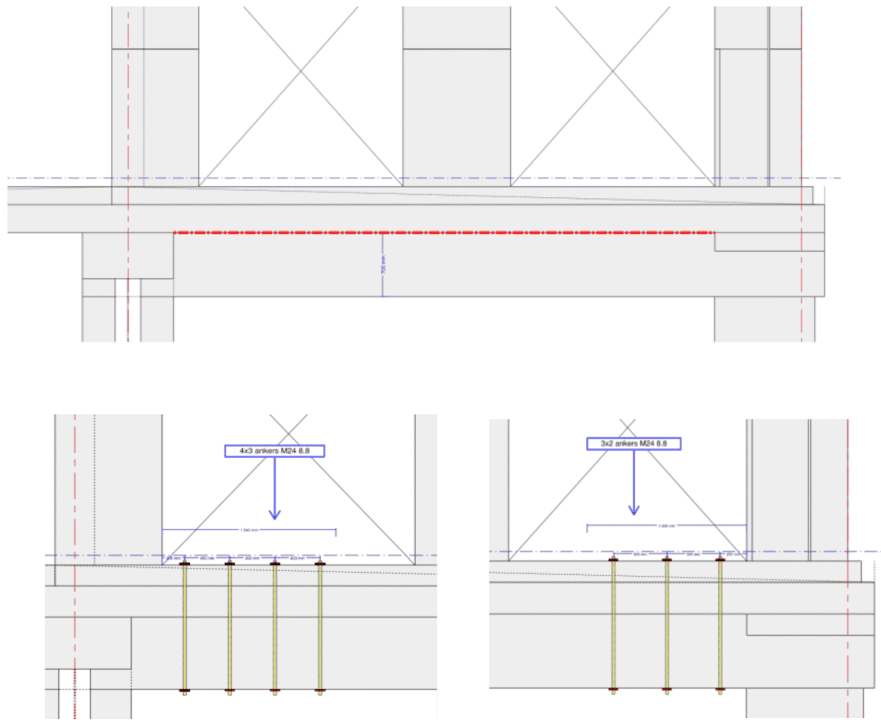

Werkzaamheden

Boren ankers door de balk

Risico's

Kans op raken wapening en voorspanwapening. >> 3D scan met precieze ligging (voorspan)wapening.

Verwijderen van de bestaande kozijnen. (geldt alleen voor 1 rij ankers)

Verdiept aanbrenge van ankerplaten i.v.m. dekking bovenzijde > kans raken bovenwap.
