Activiteit	Duration (planned)	Start	Finish
Voorbereiding	363	17-Jul-18 A	17-Dec-19
Besluitvorming	104	19-Jul-18 A	11-Dec-18
Overleg BM	0	03-Aug-18 A	
Besluit kruising verwerken in notitie/flap	10	03-Aug-18 A	16-Aug-18 A
Opstellen NVB + notitie monumenten	29	19-Jul-18 A	28-Aug-18 A
Stuurgroep overleg	0	05-Sep-18 A	
Aanleveren tbv bestuurlijke besluitvorming	0	02-Oct-18 A	
Bestuurlijke besluitvorming SD	6	03-Dec-18	10-Dec-18
Behandeling door wethouder	0		10-Dec-18*
Dagelijks bestuur	0		11-Dec-18*
Besluit nachtparkeren rondvaartboten (weth)	0	17-Sep-18 A	
Onderzoeken	65	17-Jul-18 A	15-Oct-18 A
Offerte aanvraag tbv bodemonderzoek	20	17-Jul-18 A	13-Aug-18 A
Beoordelen geleverde offerte	5	14-Aug-18 A	20-Aug-18 A
Opdracht	0	21-Aug-18 A	
Uitvoeren onderzoek	30	21-Aug-18 A	01-Oct-18 A
Leveren rapportage	10	02-Oct-18 A	15-Oct-18 A
Technisch DO	93	03-Aug-18 A	11-Dec-18
TDO aansluiting brug	93	03-Aug-18 A	11-Dec-18
Opstellen TDO constructie aansluiting brug	40	03-Aug-18 A	27-Sep-18 A
Schets aansluiting gereed	0		17-Aug-18 A
Aanleveren ontwerp tbv CVC behandeling	0	20-Sep-18 A	
CVC behandeling	0	02-Oct-18 A	
Concept TDO constructie	0		02-Oct-18 A
Review TDO	5	02-Oct-18 A	08-Oct-18 A
Verwerken opmerkingen	5	09-Oct-18 A	15-Oct-18 A
Technisch TDO constructie vastgesteld	0		11-Dec-18
TDO fiets- & voetpad	81	21-Aug-18 A	11-Dec-18
Opstellen technisch DO maaiveld inrichting	40	21-Aug-18 A	15-Oct-18 A
Concept TDO maaiveld	0		15-Oct-18 A
Review TDO	5	16-Oct-18 A	22-Oct-18 A
Verwerken opmerkingen	5	23-Oct-18 A	29-Oct-18 A
Technisch DO maaiveld vastgesteld	0		11-Dec-18
TDO steigers	62	17-Sep-18 A	11-Dec-18
Opstellen technisch DO steigers	40	17-Sep-18 A	09-Nov-18 A
Concept TDO steigers	0		09-Nov-18 A
Review TDO	5	12-Nov-18 A	16-Nov-18 A
Verwerken opmerkingen	5	19-Nov-18 A	23-Nov-18
Technisch DO steigers vastgesteld	0		11-Dec-18
Vergunningen & procedures	170	20-Aug-18 A	17-Apr-19
Monumenten	170	20-Aug-18 A	17-Apr-19
Kwalificatie toets op schets door BMA	10	20-Aug-18 A	31-Aug-18 A
Aanvraag omgevingsvergunning monumenten	130	03-Sep-18 A	06-Mar-19
Vergunning verleend	0	07-Mar-19	
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	07-Mar-19	17-Apr-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		17-Apr-19
Omgevingswet Bouwen	70	12-Dec-18	22-Mar-19
Aanvraag omgevingsvergunning tbv bouwen	40	12-Dec-18	08-Feb-19
Vergunning verleend	0	11-Feb-19	
1e Bezwarenterijn conform AWB	30	11-Feb-19	22-Mar-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		22-Mar-19
Omgevingswet Bomenkap	70	12-Dec-18	22-Mar-19
Aanvraag Omgevingsverguning tbv kappen	40	12-Dec-18	08-Feb-19
Vergunning verleend	0	11-Feb-19	
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	11-Feb-19	22-Mar-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		22-Mar-19
Waterwet	70	12-Dec-18	22-Mar-19
Aanvraag watervergunning (keurontheffing)	40	12-Dec-18	08-Feb-19
Vergunning verleend	0	11-Feb-19	
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	11-Feb-19	22-Mar-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		22-Mar-19
ProRail	75	12-Dec-18	01-Apr-19
Aanvraag vergunning ProRail	45	12-Dec-18	15-Feb-19
Vergunning verleend	0		15-Feb-19
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	18-Feb-19	29-Mar-19
Vergunnging onherroepelijk bij geen bezwaar	0	01-Apr-19	
BLVC	73	04-Sep-18 A	13-Dec-18
Aanleveren tbv CVC vooroverleg	0	20-Sep-18 A	
Behandeling CVC	0	02-Oct-18 A	
Opstellen BLVC-plan	40	04-Sep-18 A	29-Oct-18 A
Vooroverleg WBB	20	30-Oct-18 A	26-Nov-18
Verwerken opmerkingen	5	27-Nov-18	03-Dec-18
Aanleveren tbv WWU	8	04-Dec-18	13-Dec-18
Behandeling WWU	0		13-Dec-18*
BLVC-plan definitief	0		13-Dec-18
Inkoopstrategie	202	14-Aug-18 A	03-Jun-19
Opstellen inkoopstrategie	10	19-Dec-18	04-Jan-19
Inkoopplan gereed	0	07-Jan-19	
Wenstracé procedure	60	14-Aug-18 A	05-Nov-18 A

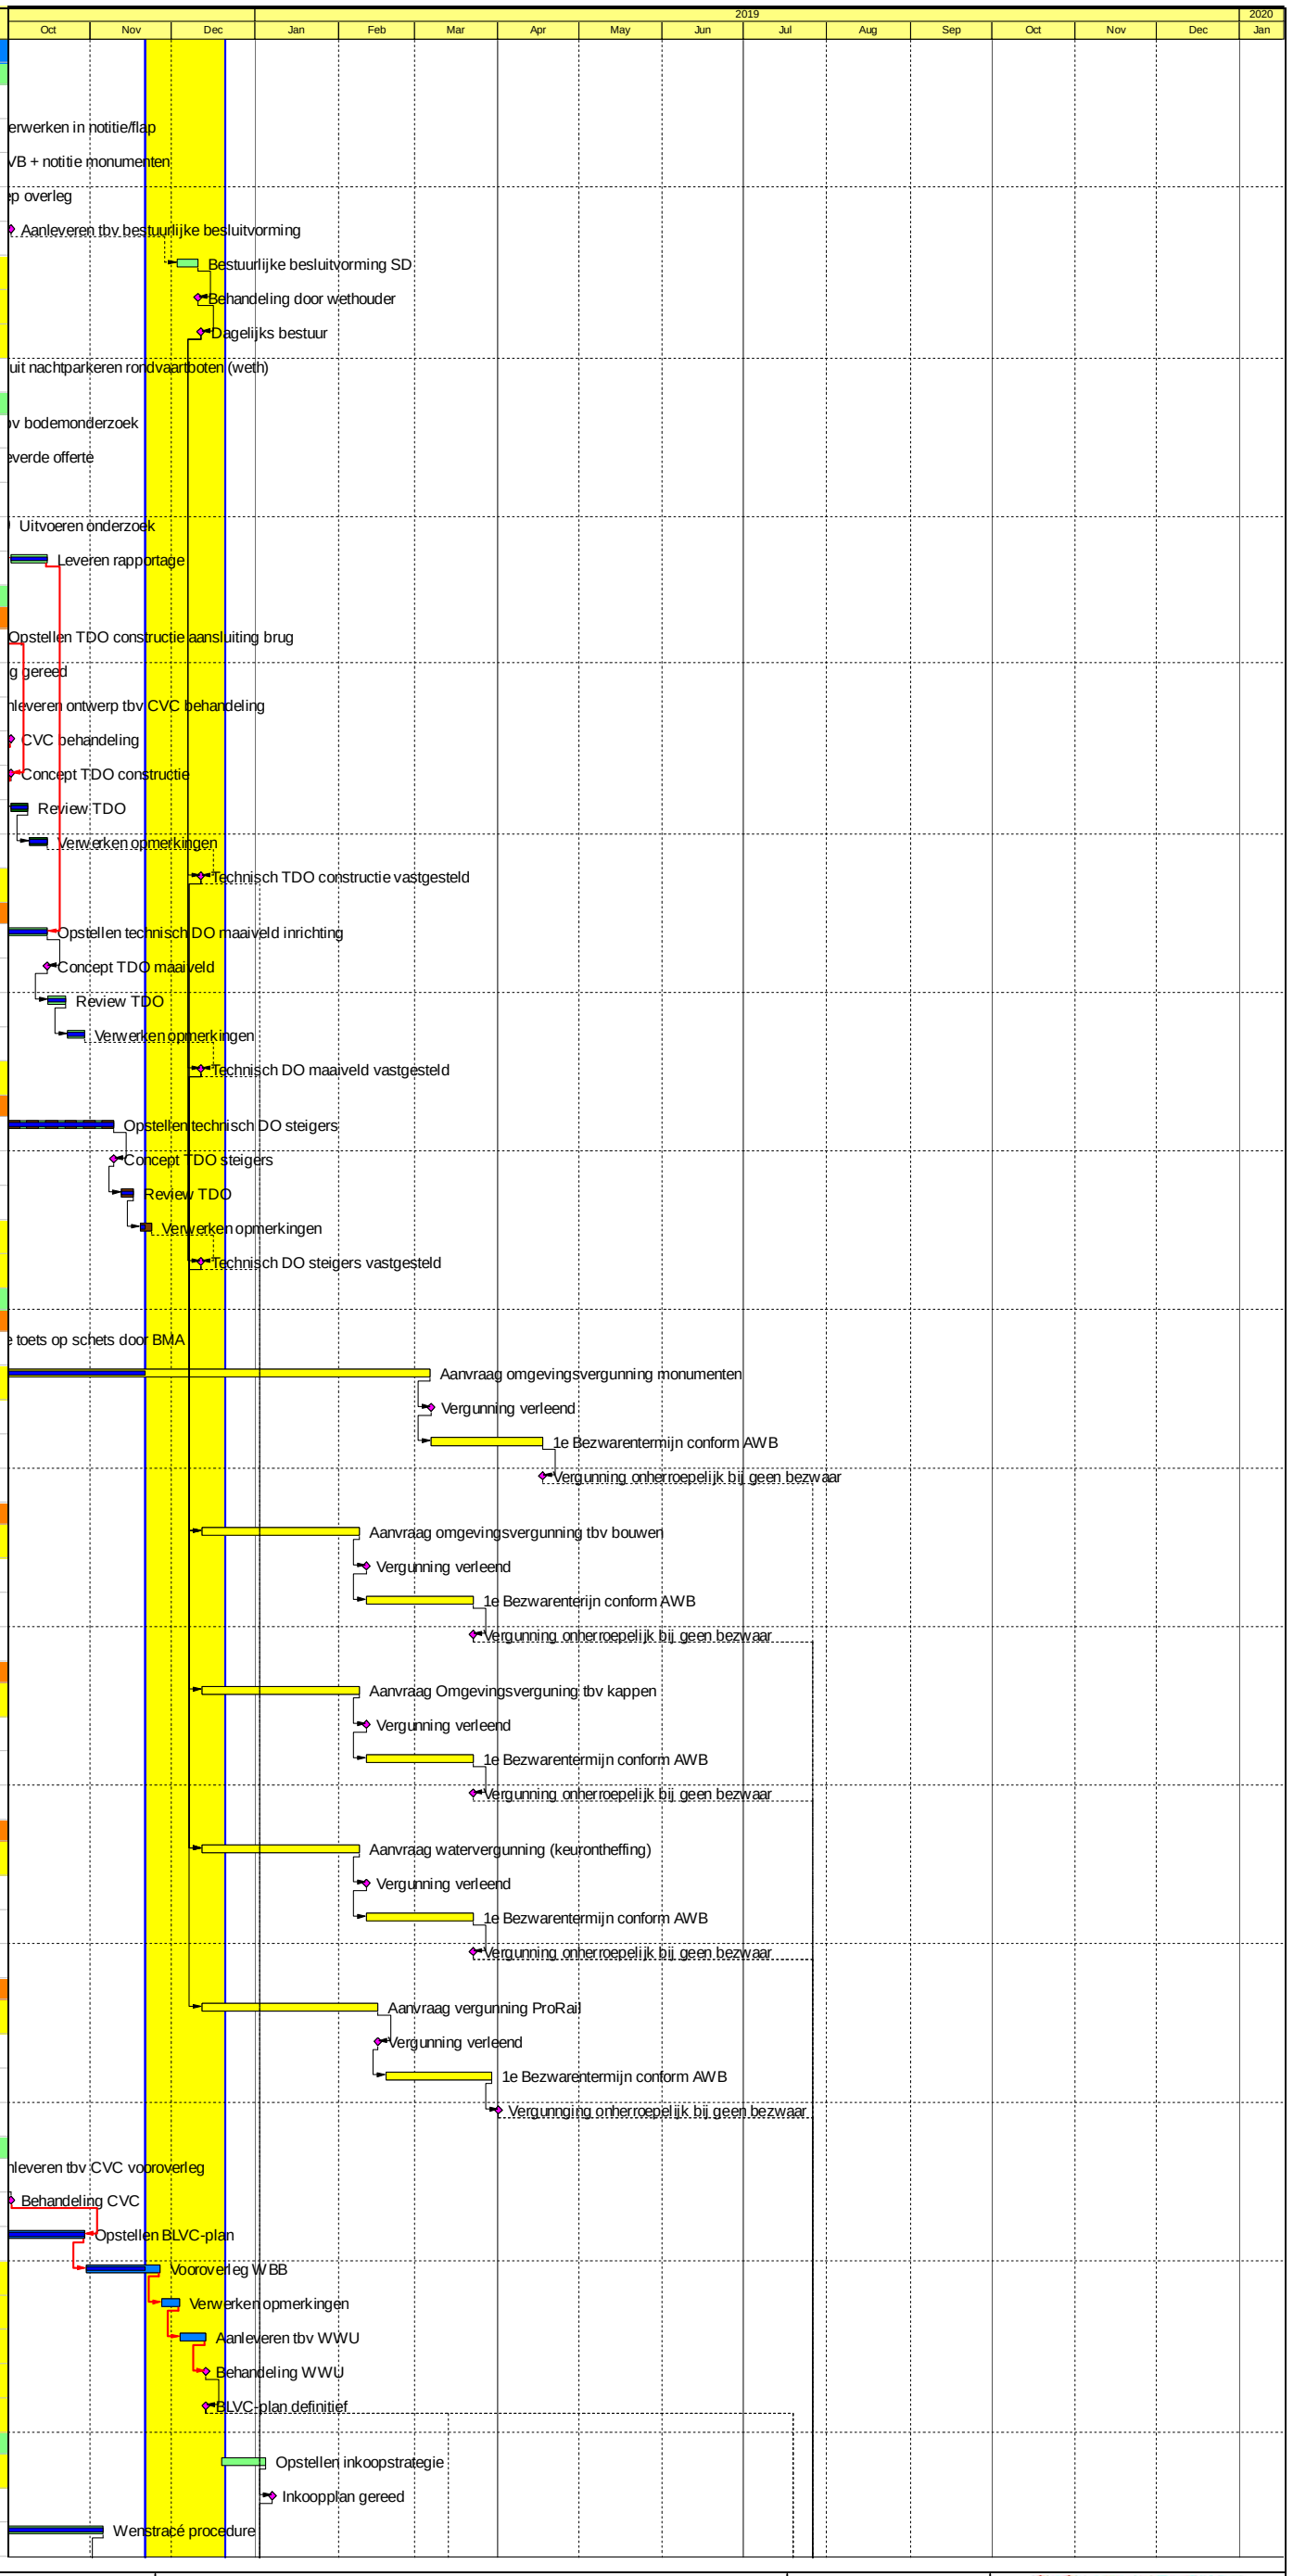

Printdatum: 21-Nov-18
Peildatum: 21-Nov-18
Naam planning: Dijksgracht Oost fietsroute
Layout: Dijksgracht-Oost
Planningsadviseur: 5.1, 2, e

Versie: 21-Nov-18

Planning
Fietsroute Dijksgracht-Oost

Voorlopig

Ter informatie

Gemeente Amsterdam

Activiteit	Duration (planned)	Start	Finish
Akkoord wenstracé	10	06-Nov-18 A	19-Nov-18 A
DTA	0	20-Nov-18 A	
Voorbereiding K&L bedrijven	132	20-Nov-18 A	31-May-19
Vroegste start uitvoering K&L	0	03-Jun-19	
Bestek	70	07-Jan-19	12-Apr-19
Bestek aansluiting brug	70	07-Jan-19	12-Apr-19
Opstellen bestekdeel constructies	40	07-Jan-19*	01-Mar-19
Concept bestek constructies gereed	0		01-Mar-19
Interne review bestekdeel	5	04-Mar-19	08-Mar-19
Verwerken opmerkingen	5	11-Mar-19	15-Mar-19
Bestek naar OG	5	18-Mar-19	22-Mar-19
Verwerken opmerkingen van OG	5	25-Mar-19	29-Mar-19
Definitief bestek	0		29-Mar-19
Bestek naar ABT (check, registratie & upload)	10	01-Apr-19	12-Apr-19
Bestek fiets- & voetpad	70	07-Jan-19	12-Apr-19
Opstellen bestekdeel maaiveld	40	07-Jan-19*	01-Mar-19
Concept bestek maaiveld gereed	0		01-Mar-19
Interne review bestekdeel	5	04-Mar-19	08-Mar-19
Verwerken opmerkingen	5	11-Mar-19	15-Mar-19
Concept bestek naar OG	5	18-Mar-19	22-Mar-19
Verwerken opmerkingen	5	25-Mar-19	29-Mar-19
Bestek definitief	0		29-Mar-19
Bestek naar ABT (check, registratie & upload)	10	01-Apr-19	12-Apr-19
Bestek steigers	70	07-Jan-19	12-Apr-19
Opstellen bestek steigers	40	07-Jan-19*	01-Mar-19
Concept bestek steigers gereed	0		01-Mar-19
Interne review bestekdeel	5	04-Mar-19	08-Mar-19
Verwerken opmerkingen	5	11-Mar-19	15-Mar-19
Concept bestek naar OG	5	18-Mar-19	22-Mar-19
Verwerken opmerkingen	5	25-Mar-19	29-Mar-19
Bestek definitief	0		29-Mar-19
Bestek naar ABT (check, registratie & upload)	10	01-Apr-19	12-Apr-19
Nationale openbare aanbesteding (aansluiting bru	42	15-Apr-19	19-Jun-19
Inschrijving/Aanbesteding	19	15-Apr-19	14-May-19
Bestek op tendernet & start tender	0	15-Apr-19	
Termijn tbv inschrijving (in kalenderdagen)	30	15-Apr-19	14-May-19
Sluiting periode tbv stellen vragen	0		26-Apr-19
Opstellen nota van inlichtingen	5	29-Apr-19	06-May-19
NvI naar ABT	2	07-May-19	08-May-19
Nota van inlichtingen beschikbaar (in kalenderdagen)	6	09-May-19	14-May-19
Inschrijving / Aanbesteding	0		14-May-19
Gunning	23	15-May-19	19-Jun-19
Beoordelen inschrijvingen	5	15-May-19	21-May-19
Openen digitale kluis (inschrijfstaten bekend)	0	22-May-19	
Opstellen gunningsadvies	2	22-May-19	23-May-19
gunningsadvies gereed	0		23-May-19
Behandeling advies door leadbuyer	2	24-May-19	27-May-19
Behandeling advies door OG	3	28-May-19	31-May-19
Gunningsbesluit	0		31-May-19
Publicatie gunningsbeslissing	0	03-Jun-19	
Stand still periode (in kalenderdagen)	10	04-Jun-19	18-Jun-19
Schriftelijke opdracht conform AUV	0	19-Jun-19	
Start contract beheerfase	0	19-Jun-19	
Nationale openbare aanbesteding (maaiveld)	42	15-Apr-19	19-Jun-19
Inschrijving/Aanbesteding	19	15-Apr-19	14-May-19
Bestek op tendernet & start tender	0	15-Apr-19	
Termijn tbv inschrijving (in kalenderdagen)	30	15-Apr-19	14-May-19
Sluiting periode tbv stellen vragen	0		26-Apr-19
Opstellen nota van inlichtingen	5	29-Apr-19	06-May-19
NvI naar ABT	2	07-May-19	08-May-19
Nota van inlichtingen beschikbaar (in kalenderdagen)	6	09-May-19	14-May-19
Inschrijving / Aanbesteding	0		14-May-19
Gunning	23	15-May-19	19-Jun-19
Beoordelen inschrijvingen	5	15-May-19	21-May-19
Openen digitale kluis (inschrijfstaten bekend)	0	22-May-19	
Opstellen gunningsadvies	2	22-May-19	23-May-19
gunningsadvies gereed	0		23-May-19
Behandeling advies door leadbuyer	2	24-May-19	27-May-19
Behandeling advies door OG	3	28-May-19	31-May-19
Gunningsbesluit	0		31-May-19
Publicatie gunningsbeslissing	0	03-Jun-19	
Stand still periode (in kalenderdagen)	10	04-Jun-19	18-Jun-19
Schriftelijke opdracht conform AUV	0	19-Jun-19	
Start contract beheerfase	0	19-Jun-19	
Nationale openbare aanbesteding (steigers)	42	15-Apr-19	19-Jun-19
Inschrijving/Aanbesteding	19	15-Apr-19	14-May-19
Bestek op tendernet & start tender	0	15-Apr-19	
Termijn tbv inschrijving (in kalenderdagen)	30	15-Apr-19	14-May-19



Printdatum: 21-Nov-18
Peildatum: 21-Nov-18
Naam planning: Dijksgracht Oost fietsroute
Layout: Dijksgracht-Oost
Planningsadviseur: 5.1, 2, e

Versie: 21-Nov-18

Planning
Fietsroute Dijksgracht-Oost

Voorlopig

Ter informatie

Gemeente Amsterdam

Activiteit	Duration (planned)	Start	Finish
Sluiting periode tbv stellen vragen	0		26-Apr-19
Opstellen nota van inlichtingen	5	29-Apr-19	06-May-19
Nvl naar ABT	2	07-May-19	08-May-19
Nota van inlichtingen beschikbaar (in kalenderdagen)	6	09-May-19	14-May-19
Inschrijving / Aanbesteding	0		14-May-19
Gunning	23	15-May-19	19-Jun-19
Beoordelen inschrijvingen	5	15-May-19	21-May-19
Openen digitale kluis (inschrijfstaten bekend)	0	22-May-19	
Opstellen gunningsadvies	2	22-May-19	23-May-19
gunningsadvies gereed	0		23-May-19
Behandeling advies door leadbuyer	2	24-May-19	27-May-19
Behandeling advies door OG	3	28-May-19	31-May-19
Gunningsbesluit	0		31-May-19
Publicatie gunningsbeslissing	0	03-Jun-19	
Alcatel arrest / stand still periode (in kalenderdagen)	10	04-Jun-19	18-Jun-19
Schriftelijke opdracht conform AUV	0	19-Jun-19	
Start contract beheerfase	0	19-Jun-19	
Contract beheerfase	130	19-Jun-19	17-Dec-19
Constructie aansluiting brug	100	19-Jun-19	05-Nov-19
Voorbereiding	30	19-Jun-19	30-Jul-19
Voorbereiding door opdrachtnemer	30	19-Jun-19	30-Jul-19
Aanvraag WIOR vergunning	5	24-Jul-19	30-Jul-19
Uitvoering aansluiting brug	70	31-Jul-19	05-Nov-19
Start uitvoering (GSU)	0	31-Jul-19	
Uitvoering constructie aansluiting brug	70	31-Jul-19	05-Nov-19
GEU	0		05-Nov-19
Maaiveld inrichting	130	19-Jun-19	17-Dec-19
Voorbereiding	30	19-Jun-19	30-Jul-19
Voorbereiding door opdrachtnemer	30	19-Jun-19	30-Jul-19
Aanvraag WIOR vergunning	5	24-Jul-19	30-Jul-19
Uitvoering maaiveld	100	31-Jul-19	17-Dec-19
Start uitvoering (GSU)	0	31-Jul-19	
Uitvoering maaiveld inrichting	100	31-Jul-19	17-Dec-19
GEU	0		17-Dec-19
Steigers	100	19-Jun-19	05-Nov-19
Voorbereiding	30	19-Jun-19	30-Jul-19
Voorbereiding door opdrachtnemer	30	19-Jun-19	30-Jul-19
Aanvraag WIOR vergunning	5	24-Jul-19	30-Jul-19
Uitvoering steigers	70	31-Jul-19	05-Nov-19
Start uitvoering (GSU)	0	31-Jul-19	
Uitvoering steigerconstructies	70	31-Jul-19	05-Nov-19
GEU	0		05-Nov-19

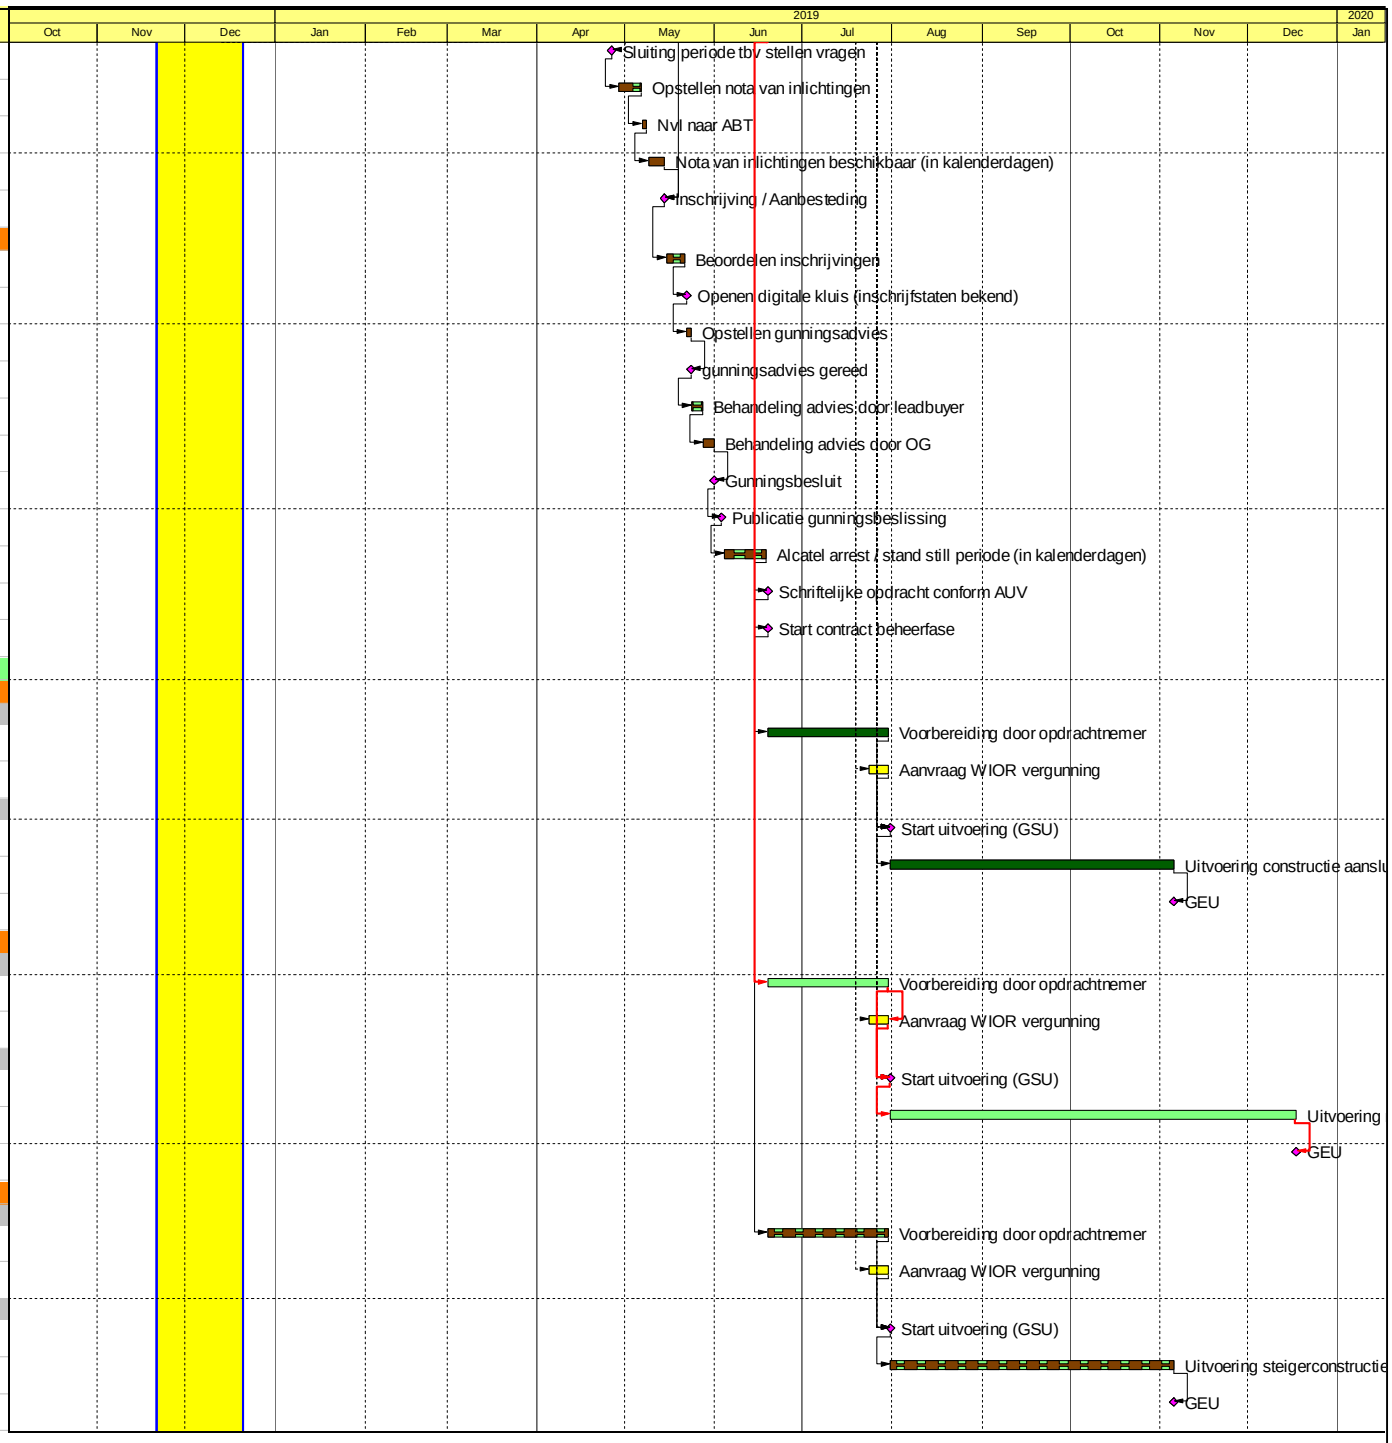

Printdatum: 21-Nov-18 Peildatum: 21-Nov-18 Naam planning: Dijksgracht Oost fietsroute Layout: Dijksgracht-Oost Planningsadviseur: 5.1, 2, e	**Versie: 21-Nov-18** Pagina: 3 van 3	**Planning** **Fietsroute Dijksgracht-Oost**	**Voorlopig** **Ter informatie**	Gemeente Amsterdam
