[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 10:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Start werkzaamheden Noorderkwartier > bouwontsluiting kant IJdoornlaan > planning & afstemming
Bijlagen: 25-135-00 Sloop situatie Blad 4.pdf

Beste [redacted] en anderen,

Graag dit bespreken met [redacted] en [redacted] zij doen de directievoering. Dit moet nl. wel worden afgestemd met werkzaamheden/transport van :

- aannemer Mulder Eykelkamp, nu doende met bouw van keermuurtje tussen de 2 nutshuisjes kant Nieuwe Leeuwarderweg (contactpersoon uitvoerder [redacted])
- aannemer Van Spijker Infra, heeft op terrein glasplaten opgeslagen voor bouw geluidsschermen langs de Nieuwe Leeuwarderweg

Deze aannemers dienen dan een aantal dagen gebruik te maken de andere bouwontsluiting van BAM Wonen aan de noordkant terrein (verlengde Van Heekweg) i.o.m. BAM Wonen (uitvoerder [redacted]) over bouwweg bouwterrein. BAM Wonen weet dat dit nodig is en zal medewerking verlenen maar zou kunnen dat op een moment de bouwweg is geblokkeerd i.v.m. kraan/hijswerk, vandaar afstemmen.
Overigens als eerste deel betonplatenbaan is gemaakt aan kant Elzenhagensingel is de bestaande korrelbaan bouwweg weer bereikbaan, deze ligt nl. grotendeels iets zuidelijker (zie bijlage tekening). Deze korrelbaan moet (buiten te leggen betonplatenbaan) blijven liggen vooralsnog.
Gaat om een paar dagen dan dat is afgesloten.

[redacted]
Mulder-Eykelkamp BV
Heinoseweg 67
8026 PB ZWOLLE
Tel. [redacted]
Fax. 0529 - 40 11 28
Mob. [redacted]
Mail. [redacted]@mulder-eykelkamp.nl
Web. www.mulder-eykelkamp.nl

[redacted]
Van Spijker Infrabouw B.V.
P. Mastebroekweg 4
7942 JZ Meppel
Postbus 247
7940 AE Meppel
T +[redacted]
E [redacted]@vsib.nl
I www.vsib.nl

PM. [redacted] : indien [redacted] niet meer op dit werk zit dan even navragen contactpersoon bij [redacted] of [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted]@reimert-almere.nl]
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 10:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Start werkzaamheden Noorderkwartier > bouwontsluiting kant IJdoornlaan

Beste [redacted]

Beste wensen voor 2019!
Wanneer zouden wij kunnen starten met de werkzaamheden aangezien het week 5 uiterlijk gereed moet zijn?
In afwachting van je reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]

Reimert
Bouw en Infrastructuur
Dat werkt!

[redacted]

Bolderweg 14
1332 AT Almere

T: [redacted]
E: [redacted]@reimert-almere nl


www reimert-almere.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 19 december 2018 12:43
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@reimert-almere.nl>; [redacted]@reimert-almere.nl>
CC: [redacted]@reimert-almere.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Start werkzaamheden Noorderkwartier > bouwontsluiting kant IJdoornlaan

Goedemiddag [redacted]

N.a.v. mail vorige week [redacted] : <u>kunnen jullie aangeven of dit gaat lukken dus of dat zo kan worden ingepland (week 5 van 2019 gereed) ?</u>
Gaat dus om aanleg van bouwontsluiting in de Kees Abspoelstraat op basis bestekstekening gedeelte tot in ieder geval aan de bouwweg steenkorrel van BAM Wonen gelegen tussen de singelwoningen en latere zelfbouwwoningen.
De betonplaten komen uit depot op terrein, graag even afstemmen met [redacted] Het voetpad naast de betonplaten nog niet aanleggen, immers de tuinmuur door BAM Wonen is nog niet gereed. T.p.v. rioolputten werken met halve betonplaten / betonsteen KF.
*De betonplatenbaan moet **goed** worden aangelegd, volgens bestek (goede opbouw steenkorrel, met daarop brekerzand, juiste hoogtes etc.), immers hier zal ook later al het zware bouwverkeer voor het te bouwen appartementencomplex over gaan rijden.*

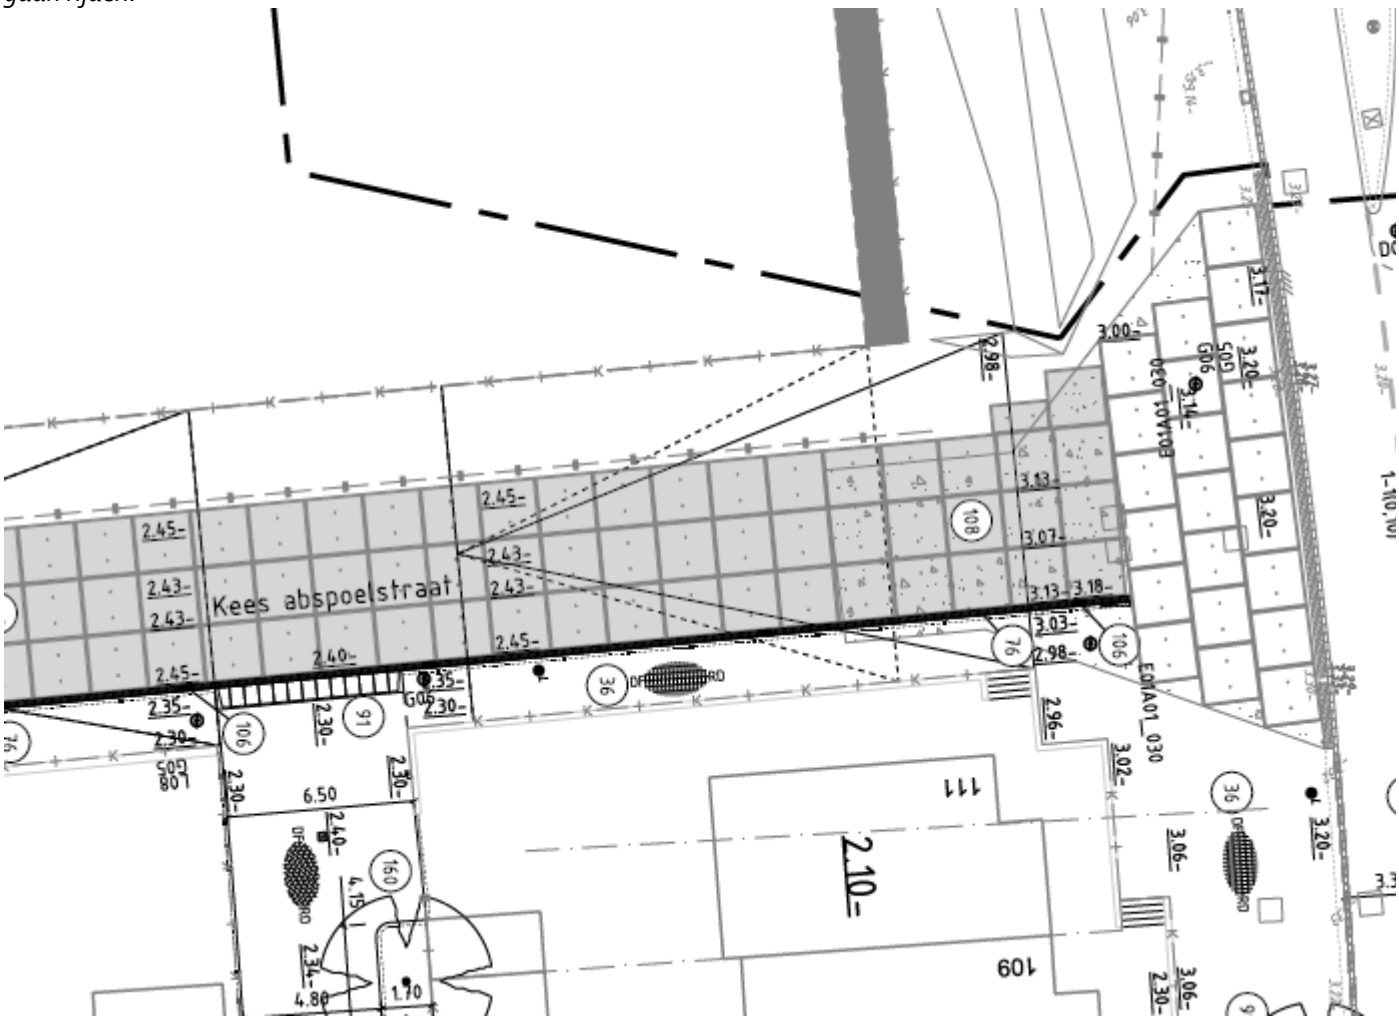

Gisteren hebben wij met BAM Wonen en nutsbedrijven dit zo in planning besproken ook, vanaf week 6 zal BAM Wonen volledig gebruik moeten kunnen maken van de bouwontsluiting IJdoornlaan.
Bijgevoegd ter info een tekening/schets waarop e.e.a.is aangegeven i.v.m. werkterrein zinkers periode week 6 tm 11 of 12 van 2019 en afsluiting met route bouwverkeer en verkeersomleidingen (zie tekeningen TVM bijlage bestek).

PM.
Mocht vanwege het winterweer begin 2019 de betonplatenbaan niet goed kunnen worden aangelegd dan gaan we tijdelijk de bestaande ontsluiting aan kant Elzenhagensingel verbreden zodat het bouwverkeer laagbouwwoningen vanaf de IJdoornlaan komende het terrein goed kan inrijden gedurende 6 a 7 weken (de inrit is nu te iets smal nl.).
De start bouw van het te bouwen appartementencomplex aan kant IJdoornlaan is op zijn vroegst vanaf april 2019, genoeg tijd om de verder betonplatenbaan ed. aan te leggen.

Vast bedankt,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: [redacted]

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 13 december 2018 09:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Start werkzaamheden Noorderkwartier

Beste [redacted]

Vanwege het feit dat week 6 volgend jaar NUON en andere Nuts de zinker onder de sloot gaat aanbrengen ter hoogte van de ingang van de BAM op het noorderkwartier zal daar de weg afgesloten zijn. Dit heeft als gevolg dat de BAM niet gebruik kan maken van hun huidige inrit. De 1e inrit nabij de ijdoornlaan is op het moment te klein voor grote trailers. Om deze reden wilde ik je vragen om week 5 te starten met de aanleg van de bouwweg in betonplaten. Het gaat erom dat er dan tot minimaal de 1e kruising in ligt zodat de BAM met hun transport het terrein op kan.

Tevens is er op dat moment ook nog een partij bezig met het realiseren van de tussenmuur tussen de Nutshuisjes op het terrein. (gelegen aan de Nieuwe Leeuwarderweg)

Tenslotte wilde ik nog meegeven om goed op de hoogte te letten van het nu aanwezige menggranulaat, op de tekening staan de juiste hoogtes en deze willen wij blijven aanhouden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.
