Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING NHG-0201
NIEUWE HERENGRACHT LANGS DR. M. SLUYSPAD
10E HALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 03-11-2017

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[redacted]
adres:	Nieuwevaart 5 - 9 1018 AA Amsterdam
opdrachtnummer:	
	[redacted]
projectnummer:	170192
projectleider:	[redacted]
landmeter:	[redacted]
datum rapportage:	06-11-2016
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	
Naam:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij NHG-0201-Nieuwe Herengracht-03-meetrapport.doc. De bijlage bevat de resultaten van de 10e herhalingsmeting in XYZ.

De metingen zijn uitgevoerd op 03-11-2017.

De 1e faseberekening van de 10e herhalingsmeting van de tachymetrie is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase is aangesloten op de referentiepunten om tot een goed vergelijk te komen tot eerdere metingen.


De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerk 11380054. Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd. De berekende N.A.P. hoogten van de punten zijn allemaal gecorrigeerd met 15 mm (helft van de diameter van de oude koperen bouten) om de hoogten van alle deformatiepunten naar het midden van de deformatiepunten te brengen. De berekende hoogten zijn vervolgens gecorrigeerd met 15mm. In de tachymetrische opnamen worden de punten ook in het hart van de bout gemeten.

Een aantal deformatiebouten waren niet meer bruikbaar/aanwezig. Deze zijn opnieuw geplaatst en omgenummerd, het betreft de volgende punten : 11, 16, 22, 30

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand.

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting

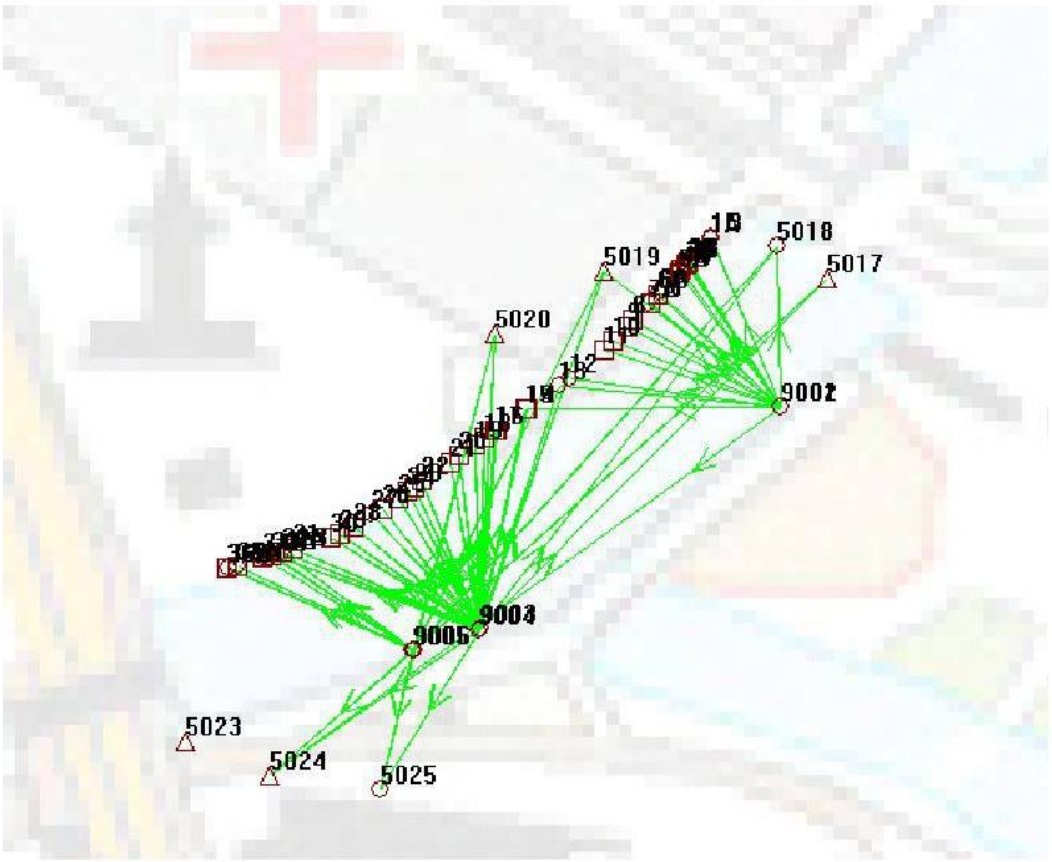

3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	
weer type	Bewolkt
wind	2 Bft
lucht temp	11
constructie temp	8
opmerking	
