Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	3 mei 2022	2203-17228- v 0.4
Behandeld door	**Project**	
5.1.2e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

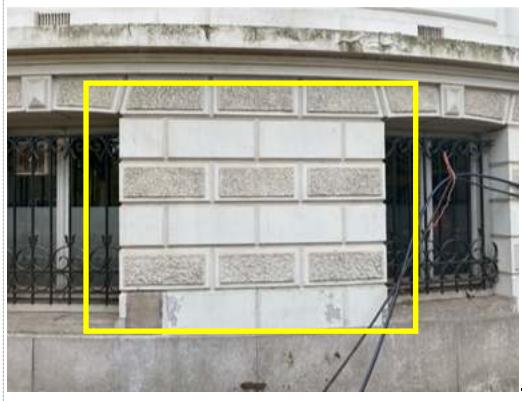
Aanwezig:	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
5.1.2e	Salverda	
5.1.2e	Salverda	
5.1.2e		BBN directievoerder

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
03-05	Opname belendingen pinguïns en Salmhuisje	5.1.2e
03-05	Nulmeting trillingen	5.1.2e
03-05	Nulmeting deformatie	5.1.2e
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 22-3-2022 – niet besproken	-
03-05	Verslag 12-4-2022	
1.03	**Werkplannen**	
	Werkplan verwijderen verflagenstucwerkgevels	-
03-05	-- productspecificatie verstrekken	5.1.2e
03-05	-- Stukje gevel als bestaand houden referentie locatie afstemmen met 5.1.2e en concreet voorstel doen	5.1.2e
03-05	-- Werkplan stucwerkherstel opstellen na verwijderen verf	5.1.2e
03-05	Lopende actie Werkplannen opnemen in gegevensbehoefteschema voorzien van beoordeling- en acceptatietermijnen	5.1.2e
03-05	-- Sloopplan	
1.04	**Natuursteen gevel**	
03-05	-- Ankers/doken detecteren verder uitwerken Opmerking: uitwerken binnen mogelijkheden bestek; inventarisatie Meesters-in	5.1.2e 5.1.2e
	Proeven gedaan, ter beoordeling: -- 1 laserreiniging zit niet in contract -- 2 stoom + kokend water is contract	- 5.1.2e

	NB: Contract is leidend, zeker zolang we nog niet alle fasen en opties hebben kunnen opdrachten	
03-05	-- vanaf 20 april pointcloud beschikbaar – kwaliteit foto's beoordelen en eventueel vervolg voor ondersteunende foto's	5.1.2e
03-05	-- Samen met Venema stappenplan en mock-up natuursteen opzetten met als doel juiste steen, behandeling en opzet voor werkplan te maken. Principeplan en voorkeurmaterialen streven over 3 weken gereed om te bespreken. Voorstel mock-up natuursteen elementen verwijderen:  (hoek nabij diorama)	5.1.2e
03-05	Beoordelen eerdere reinigingsproef	

		
03-05	De wens is om groter proefvlak op te zetten voor de te reinigen geveldelen. Op onderstaande locatie zullen we een gedeelte reinigen volgens het eerder uitgevoerde stoomreinigen onder gepaste druk. Watertemperatuur circa 98°C en druk <100bar. 	
1.05	**Stucwerkgevel**	
	Werkplan verwijderen verf stucwerkgevels = goedgekeurd	
03-05	-- productspecificatie verstrekken	5.1.2e
03-05	-- Stukje gevel als bestaand houden referentie locatie afstemmen met 5.1.2e en concreet voorstel doen	5.1.2e
	-- Stucwerk herstel opnemen na verwijderen verf een en ander volgens uitvoeringsplanning	

03-05	-- Salverda komt met voorstel mock-up gevel waarbij groter vlak wordt ontdaan van verf: Cor heeft gevraagd of wij een groter stuk van de gestucte gevel kunnen ontdoen van verf reinigen om deze verder te onderzoeken. De vraag hierbij is of er nog een oude verflaag /vernislaag achter verschuilt. 	5.1.2e
1.06	**Daken**	
	-	
1.06	**Binnenafbouw**	
03-05	Vochtgedrag noordgevel, planwijzigingen met betrekking op wijziging isolatiesysteem van dampdicht naar damp open.	
1.07	**Overige bespreekpunten**	
Melding	Vaststelling melding start bouw en bevestiging sloopmelding = bevestigd 4 april 2022	-
Vergunning	Aanvraag wijzigingen omgevingsvergunning: zijn de stukken duidelijk, is er nog afstemming nodig (welstand, brandveiligheid?) uitslag op 13 april 2022	ARTIS + OD
03-05	Voortgang omgevingsvergunning planaanpassing (twee vragen ontvangen en beantwoord, mbt bouwkosten en grondwerk tpv liften)	5.1.2e
Instandhouding	Lege bakken > worden weer gevuld > i.s.m. Artis Aantal Rookmelders > voldoende of niet? -- brand detectie is geen bestekseis, het is bedoeld om tijdig te signaleren op strategische punten. -- In bestek zijn eisen opgenomen rondom werken met openvuur en aanverwante zaken dat is het uitgangspunt -- Brandblussers; er worden 8 alampoints meer geplaatst dan opgenomen in werkplan	ARTIS - - -
Veiligheid	Toegang Bouwplaats Alleen bevoegden; werkend voor of in opdracht van Salverda en onder begeleiding van medewerker Salverda. Helm en schoenen is verplicht. Voor volgende overleggen melden bij tourniquet (reguliere bouwingang) nabij de units van Salverda	ieder

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4
