Oevers inspectie

KVV0702

Functionele inspectie



	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld		17-dec-2001	
goedgekeurd		21-12-01	

	naam:	datum:	handtekening:
gecontroleerd		13-6-05	

Ligging water	Kostverlorenvaart
Ligging straat	Baarsjesweg
Tussen objecten	186 - 199
Tussen nummers	
Lengte	738

- Lengte 738
  Constructie walmuur-metselwerk
  Bouwjaar
  Van - Tot

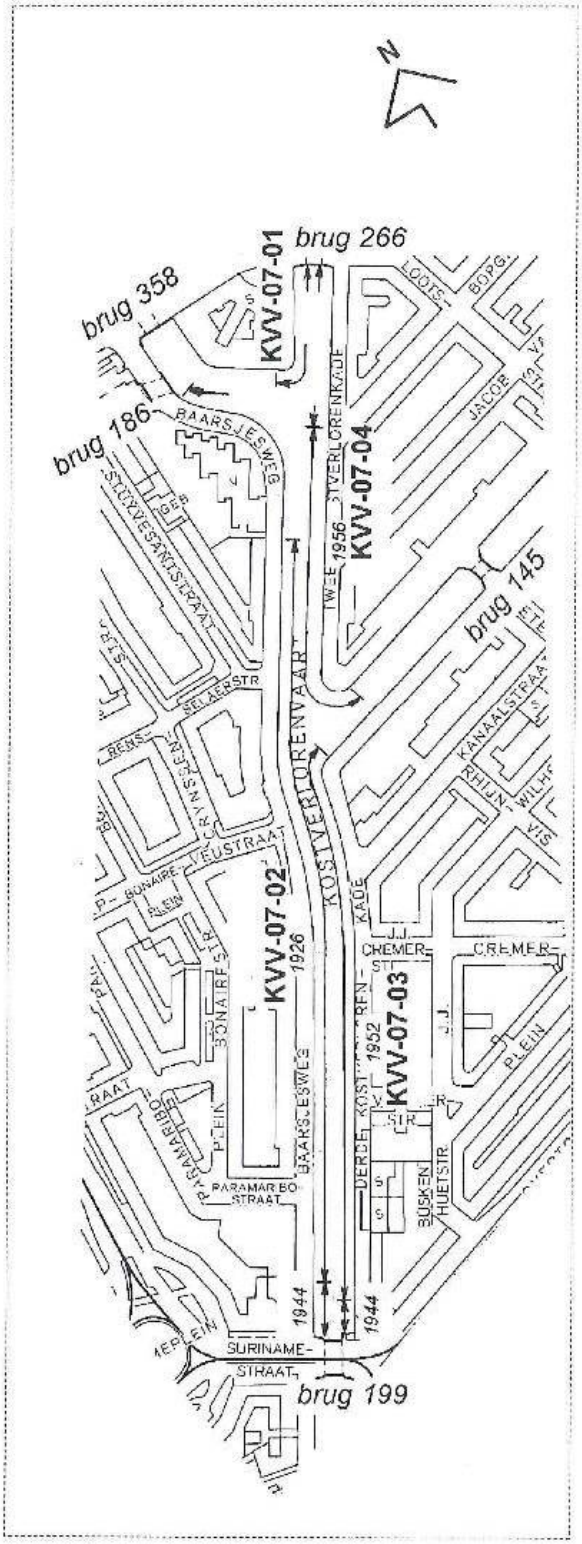

KVV0702

Inspecteurs : [redacted]
Inspectiedatum : 17-dec-2004

Nr.	Gebrek	Indicatie Kosten	Urg	Uitv. in groep
1	metselwerk, scheur, verticaal	€ [redacted]	5	
2	.., incorrect	€	3	
3	beton, verschoven	€	2	
4	metselwerk, beklad	€	5	
5	specie, los	€	2	
6	specie, begroeid	€	3	
7	metselwerk, scheef	€	5	
8	specie, scheur, horizontaal	€	3	
9	metselwerk, aangetast op de waterlijn	€	5	
10	.., beschadigd	€	5	
11	specie, aangetast op de waterlijn	€	3	
12	klinkers in het zand, verzakt	€	1	
13	metselwerk, boomgroei	€	1	
14	verf- staal, matig	€	3	
15	.., ..	€	5	
	Hoogste urgentie	€	1	
	Onderhoud noodzakelijk	€	2	
	Onderhoud gewenst	€	3	
	Lage urgentie	€	5	
	Totaal*	€		
	Nader onderzoek gewenst	Geen	4	
	In vernieuwingsprogramma	Planvorming		
	Vervanginsgswaarde ±	€ [redacted]		

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Volgnummer : 1
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : T.p.v. brug 186, 4xca.1,50mtr. T.p.v. nr.250 1xca.1,50mtr. t.p.v. nr.256 1xca.1,50mtr. t.p.v. nr.272 1xca.1,50mtr. ± 10,50 mtr

Herstel : Monitoren. ± [redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 2
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : dilatatievoeg
Materiaal : ..
Gebrek : incorrect

Specificatie : Vanaf brug 186, 4e dilatatie, voeg met specie gevuld. ± 1,00 stuks

Herstel : Specie verwijderen, kit op rugvulling aanbrengen. ± €

Vakdiscipline : Kitwerk

Volgnummer : 3
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 2



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : beton
Gebrek : verschoven

Specificatie : Nabij brug 186 in bocht ca.50,00mtr. T.p.v nr. 311 ca.5,00mtr. ± 50,00 mm

Herstel : Herleggen ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 4
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : beklad

Specificatie : Nabij brug 186. ± 4,00 m2

Herstel : Verwijderen. ± €

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 5
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 2



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : voeg
Materiaal : specie
Gebrek : los

Specificatie : Diverse plaatsen onder dekzerk. ± 100,00 mtr

Herstel : Uitslijpen en voegen. = €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 6
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : begroeid

Specificatie : Diverse plaatsen ca.20% van het totale oppervlak. ± 300,00 m2

Herstel : Schoonmaken. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 7
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheef

Specificatie : Tussen loswal en nr.310. Plaatselijk ca.60mm uit het lood op waterlijn. Stabiel beeld. ± 500,00 mtr

Herstel : Monitoren. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 8
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : scheur. horizontaal

Specificatie : Tussen nr.310 en nr.242. ± 78,00 mtr

Herstel : Uitslijpen en voegen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 9
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : aangetast op de waterlijn

Specificatie : Ca. 50% van de totale lenge. ± 370,00 mtr

Herstel : Monitoren. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 10
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : ..
Gebrek : beschadigd

Specificatie : Diverse plaatsen, beton of natuursteen, gebroken of beschadigd. ± 216,00 stuks

Herstel : Monitoren. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 11
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats	:	walmuur	
Onderdeel	:	..	
Detail	:	voeg	
Materiaal	:	specie	
Gebrek	:	aangetast op de waterlijn	
Specificatie	:	Diverse plaatsen ca.50% van de totale lengte.	± 370,00 mtr
Herstel	:	Uitslijpen en voegen m.b.v kuip.	± € [redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 12
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 1



Plaats : aansluitend
Ondercel : verharding
Detail : ..
Materiaal : klinkers in het zand
Gebrek : verzakt

Specificatie : T.p.v nr.224 over een lengte van ca.(20,00x2,00)mtr. Zie ook storingsbon 567. Oorzaak verm. onderloopsheid. ± 100,00 mm

Herstel : Met behulp van duiker oorzaak opzoeken, ontgraven, oorzaak opheffen, aanvullen en herstraten. ± €

Vakdiscipline : Combinatie werksoorten

Volgnummer : 13
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 1



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : boomgroei

Specificatie : T.p.v. nr.230. ± 1,00 stuks

Herstel : Verwijderen. ± €

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 14
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : leuning
Detail : ..
Materiaal : verf- staal
Gebrek : matig

Specificatie : T.p.v. nr.285 ca.8,00m2., nr.301 ca.8,00m2. ± 16,00 m2

Herstel : Schilderen. ± € [redacted]

Vakdiscipline : Schilderwerk

Volgnummer : 15
Code : KVV0702
Type : Oevers inspectie

urgentie 5

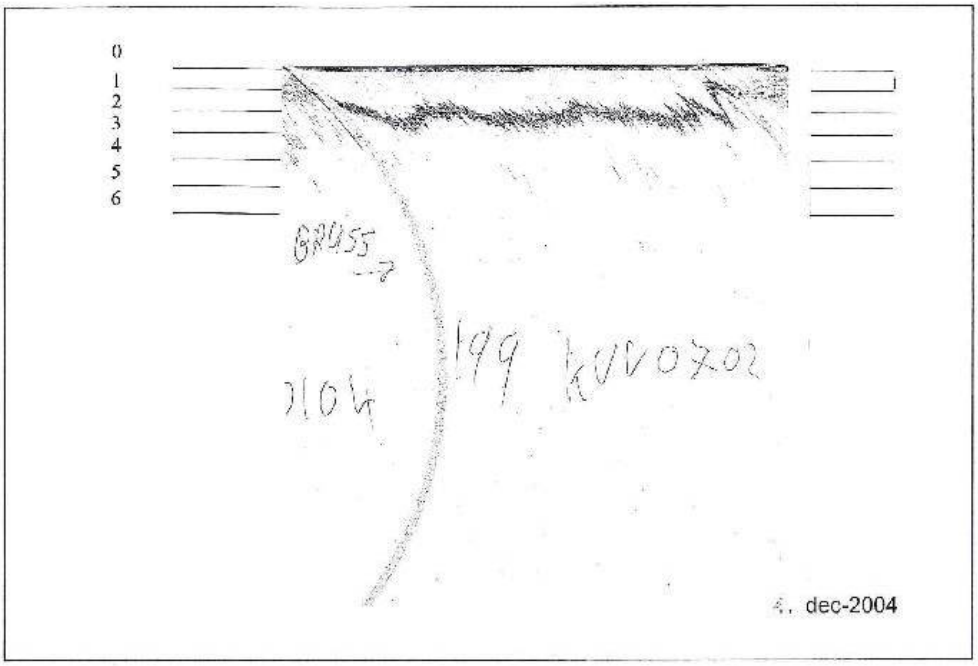

Plaats : walmuur
Onderdeel : peiling
Detail : ..
Materiaal : ..
Gebrek : ..

Specificatie : Waterstand 0.40 - NAP ± 0,00 ..

Herstel : ± €

Vakdiscipline : ..

Overspeel log

Melding

Datum : 17-12-2004 0:00: Inspectietype : Oevers inspectie
Inspecteurs : [redacted] Functionele inspectie

Verwerken inspectie

Code : KVV0702

Datum : 17-december-2004

	nieuw volgnr.	oud volgnr.		
KVV0702	000	(001)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	000	(002)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	000	(003)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	000	(007)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	000	(008)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	000	(009)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	000	(014)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	000	(016)	Gebrek is vervallen	
KVV0702	001	(004)	Gewijzigd gebrek	
KVV0702	002	(005)	Gebrek is hetzelfde gebleven	
KVV0702	003	(000)	Nieuw gebrek	! Gebrek was gereedgemeld als gebrek nr. 1 in Opdr.nr.1690
KVV0702	004	(015)	Gebrek is hetzelfde gebleven	
KVV0702	005	(000)	Nieuw gebrek	! Gebrek was gereedgemeld als gebrek nr. 2 in Opdr.nr.1690
KVV0702	006	(000)	Nieuw gebrek	! Gebrek was gereedgemeld als gebrek nr. 3 in Opdr.nr.1690
KVV0702	007	(006)	Gebrek is hetzelfde gebleven	
KVV0702	008	(010)	Gewijzigd gebrek	
KVV0702	009	(011)	Gewijzigd gebrek	
KVV0702	010	(012)	Gewijzigd gebrek	
KVV0702	011	(013)	Gebrek is hetzelfde gebleven	
KVV0702	012	(000)	Nieuw gebrek	
KVV0702	013	(000)	Nieuw gebrek	
KVV0702	014	(000)	Nieuw gebrek	
KVV0702	015	(017)	Gebrek is hetzelfde gebleven	

Inspectie ingelezen
Aantal ingelezen gebreken : 23

Overspeel resultaat

Aantal geïnspecteerde objecten : 1
Ingelezen gebreken : 23
