

Brug 160 Bullebakssluis, Gefaseerd

Acti ID	Nr.	Activiteit	Start	Duur (werkd)	Gereed
		Algemeen			
	201	Regelen dekking	06-09-16 A	8	15-09-16 A
	202	START PROJECT	02-01-17 A	0	
	203	Overleg SRA voorlopig besluit over sub.	02-01-17 A	30	10-02-17
	204	Definitieve subsidie beschikking	13-02-17	90	21-06-17
	205	Opstellen BLVC-scan	02-09-16 A	20	29-09-16 A
	206	Opstellen 1ste hoofdlijnennplanning	02-09-16 A	26	07-10-16 A
	207	Uitwerken Projectplan	02-09-16 A	41	28-10-16 A
		Besluitv. Projectbesluit en Voorbereidingskrediet			
	208	Toets SSK-raming	31-10-16 A	10	11-11-16 A
	209	Opstellen flap tbv B&W, Cie. ID & Raad	14-11-16 A	10	25-11-16 A
	210	Afstemmen met AOG , Advies SARP, eind concept tbv DMC DJZ	28-11-16 A	11	12-12-16 A
	211	Akkoord DMC en DJZ	23-12-16 A	11	09-01-17 A
	212	Verwerken reactie DMC en DJZ	10-01-17 A	7	18-01-17 A
	213	AOG akkoord met def. versie	01-03-17*	1	01-03-17
	214	Aanleveren voor toetsing	02-03-17	2	03-03-17
	215	Toetsing	06-03-17	1	06-03-17
	216	STAND STIIIPERIODE tbv DJZ & DMC	07-03-17	4	10-03-17
	217	Ter info naar Stadsdeel Centrum	10-01-17 A	2	11-01-17 A
	218	Staf Litjens	13-03-17	0	
	219	Aanleveren B&W	14-03-17	5	20-03-17
	220	Behandeling in B&W	21-03-17	0	
	221	Aanleveren cie. ID en Raad ter kennisname	24-03-17	14	12-04-17
	222	In Cie I&D ter kennisname		0	12-04-17*
	223	Gemeenteraad	10-05-17*	2	11-05-17
		Besluitvorming Uitvoeringsfasering			
	224	Opstellen flap	17-08-17	15	06-09-17
	225	Afstemmen met AOG (en Advies SARP)	07-09-17	5	13-09-17
	226	Verwerken reacties AOG	14-09-17	1	14-09-17
	227	Aanleveren voor toetsing	15-09-17	2	18-09-17
	228	Toetsing	19-09-17	1	19-09-17
	229	Ter info naar Stadsdeel Centrum	15-09-17	2	18-09-17
	230	Staf Litjens	20-09-17	0	
		Bestuurlijke Besluitvorming Uitvoeringskrediet			
	231	Opstellen flappen tbv Besluit UV-krediet	13-03-18	16	04-04-18
	232	Afstemmen met AOG (en Advies SARP)	29-03-18	14	18-04-18
	233	Verwerken reacties uit preé-toets en afstem. SRA	19-04-18	4	24-04-18
	234	Aanleveren bij AOG	25-04-18	3	01-05-18
	235	Verwerken reacties AOG	02-05-18	2	03-05-18
	236	Aanleveren voor toetsing	04-05-18*	2	07-05-18
	237	Toetsing	08-05-18	1	08-05-18
	238	Ter info naar Stadsdeel	04-05-18	2	07-05-18
	239	STAND STIIIPERIODE tbv DJZ & DMC	09-05-18	5	15-05-18
	240	Staf Litjens	23-05-18	0	
	241	Behandeling in B&W		0	31-05-18
	242	Aanleverperiode commissie ID	01-06-18	16	22-06-18
	243	Behandeling in Cie I&D		0	22-06-18
	244	Gemeenteraad	06-07-18	2	09-07-18
		Onderzoek			
	245	Melding CoCuWo	21-10-16 A	15	11-11-16 A
	246	Offerte Inmeting uit	07-02-17*	20	06-03-17
	247	Aanbieding en opdracht inmeting	07-03-17	10	20-03-17
	248	Inplannen en uitvoering inmeting	21-03-17	20	18-04-17
	249	Uitvraag, offerte en opdracht aan ONDERZOEKBureau's	06-07-17	20	02-08-17
	250	Uitvoeren onderzoeken	03-08-17	25	06-09-17
	251	Review onderzoek Antea, inclusief aanvullende onderzoeken	02-01-17 A	110	07-06-17
	252	Besluit V&OR wel/niet vervangen	08-06-17	30	19-07-17
	253	Varianten onderzoek, fasering uitvoering	06-07-17	30	16-08-17
		Onderzoeken omgeving			
	254	Inventarisatie aanpak omliggende belendingen	03-04-17*	25	10-05-17
	255	Aanschrijven eigenaren funderingsherstel (gelijk met Br. 149)	11-05-17	25	14-06-17
	256	Periode tot start uitvoering	11-05-17	507	03-05-19
		Voorontwerp			
	257	Risicoanalyse sessie	06-07-17	5	12-07-17
	258	Stakeholder analyse	03-04-17	15	24-04-17
	259	Opstellen KES	03-04-17	65	05-07-17
	260	Opstellen Referentie en raming	17-08-17	65	15-11-17
	261	Opstellen SES	28-09-17	65	29-12-17
	262	Verwerken onderzoeken in VO	17-10-17	20	13-11-17
	263	Opstellen Inkoopstrategie en behandeling bij Leadbuyer	24-08-17	30	04-10-17
		Definitief ontwerp			
	264	Aanmelden en behandeling WVA	16-11-17	10	29-11-17
	265	Aanmelden behandeling CVC	30-11-17	10	13-12-17
	266	Aanpassen ontwerp nav CVC	14-12-17	10	29-12-17

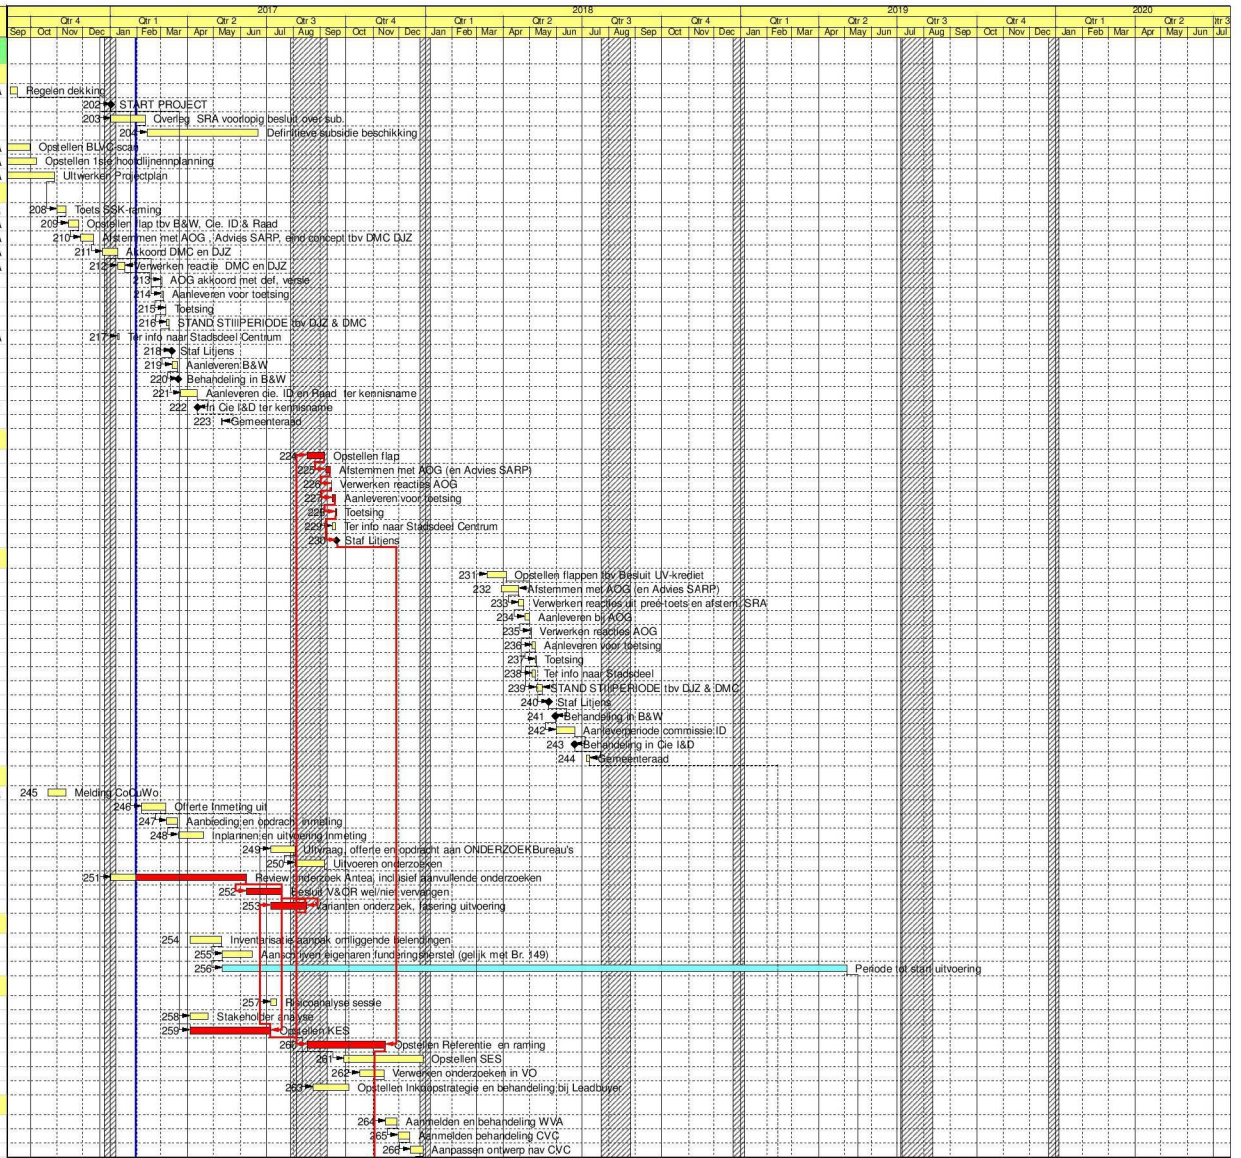


Acti ID	Nr.	Activiteit	Start	Duur (werkd)	Gereed
	267	Opstellen Definitief Ontwerp	16-11-17	65	19-02-18
	268	Opstellen SSK Raming op basis van DO, inclusief toets	20-02-18	15	12-03-18
	269	Toets DO en aanpassen (// aan bestek)	13-03-18	30	24-04-18
	270	Opstellen BLVC (in overleg met SD)	02-01-18	20	29-01-18
	271	WWU overleg	20-02-18	0	
	272	Opstellen/ 1ste concept BLVC (Kader BLVC)	17-08-17	20	13-09-17
	273	Aanvraag en procedure verkeersbesluit	02-01-18	60	26-03-18
		Kabel & Leidingwerkzaamheden			
		Investeringsraming			
	274	Opstellen tekeningen voor overleg (obv Referentie ontwerp) en verstur	16-11-17	5	22-11-17
	275	Afspraak maken met K&L-Bedrijven	23-11-17	5	29-11-17
	276	Beoordelen tekeningen door K&L-Bedrijven	09-01-18	15	29-01-18
	277	Overleg met K&L-Bedrijven	30-01-18	5	05-02-18
	278	Opstellen raming door KLB's	06-02-18	15	26-02-18
	279	Indienen ramingen door KLB's	27-02-18	5	05-03-18
	280	RESERVE BUFFER	06-03-18	15	26-03-18
	281	KLB's investeringsraming gereed tbv Voordracht Uitvoeringsbesluit		0	26-03-18
		Wenstracé en werkvoorbereiding K&L			
	282	Opstellen aanvraag wenstracé o.b.v. Referentie ontwerp	16-11-17	5	22-11-17
	283	Aanvraag wenstracé verzenden	23-11-17	5	29-11-17
	284	Reactietijd K&Lbedrijven	30-11-17	20	29-12-17
	285	Verwerken reacties op aanvraag wenstracé	02-01-18	10	15-01-18
	286	Opstellen akkoord wenstracé	16-01-18	20	12-02-18
	287	reactie tijd KLB's op akkoord wenstracé	06-02-18	10	19-02-18
	288	Opstellen DTA	13-02-18	5	19-02-18
	289	DTA		0	19-02-18
	290	Werkvoorbereiding door K&L-bedrijven	20-02-18	125	16-08-18
	291	Uitvoering door KLB's	17-08-18	80	06-12-18
	292	RESERVE BUFFER	07-12-18	20	08-01-19
	293	VROEGSTE START UITVOERING BRUG (vanuit K&L-optiek)	09-01-19	0	
	294	Werkzaamheden Liander Gas voor 15 september (seizoensgebonden)	17-08-18	21	14-09-18*
		GEEN WERKZAAMHEDEN LIANDER GAS tussen 15/09-15/05	18-09-18*	168	15-05-19
		Vergunningen, procedures en toestemmingen			
	295	Overleg over EN Procedure TBGN	02-01-17 A	190	27-09-17
	296	Flora en Fauna scan (vleermuizen?!)	02-01-17 A	260	08-01-18
	297	Aanvragen vergunning Werken in/nabij Spoor	27-07-18	40	20-09-18
	298	Aanvragen omgevings vergunning (4wkn ontv.& 8wkn proc. &6 wkn ee	25-04-18	90	30-08-18
	299	Bezwaar termijn volgens AWB	31-08-18	30	11-10-18
	300	Aanvragen Waterwet vergunning (4wkn ontv.& 8wkn proc. &6 wkn een	25-04-18	90	30-08-18
	301	Bezwaar termijn volgens AWB	31-08-18	30	11-10-18
		Bestek			
	302	Opstellen bestek/leidraad, inclusief afstemming met GVB	25-04-18	65	26-07-18
	303	Bestek, toets, goedkeuren en aanpassen (incl. 3 wkn verlenhing)	27-07-18	45	27-09-18
		Inschrijving / Aanbesteding en Gunning			
	304	Procedure aanbesteding (nationaal openbaar) dlt in kalenderdagen	28-09-18	60	26-11-18
	305	Gunning incl. Alcatel (incl. 2 weken verlenging)	27-11-18	45	31-01-19
		Uitvoering gefaseerd			
	306	Voorbereiding aannemer	01-02-19	65	03-05-19
	307	Aanvragen WIOR	12-04-19	15	03-05-19
	308	Uitvoering Sloop en hulpwerken, omleggen K&L, aanpassingen boven	13-05-19	80	30-08-19
	309	FASE 1 (e zijde)	02-09-19	72	10-12-19
	310	Uitvoering sloop 1 zijde	02-09-19	15	20-09-19
	311	Uitvoering schroeven palen	23-09-19	15	11-10-19
	312	Uitvoering balken	14-10-19	21	11-11-19
	313	aanbrengen overige (dek) werkzaamheden	12-11-19	21	10-12-19
	314	FASE 2(e zijde)	11-12-19	82	07-04-20
	315	Uitvoering sloop 1 zijde	11-12-19	15	03-01-20
	316	Uitvoering schroevem palen (incl 2 wkn B.vak)	06-01-20	25	07-02-20
	317	Uitvoering balken	10-02-20	21	09-03-20
	318	aanbrengen overige (dek) werkzaamheden	10-03-20	21	07-04-20
	319	FASE 3 TRAM	08-04-20	10	22-04-20
	320	Uitvoering slopen tramdek	08-04-20	2	09-04-20
	321	Uitvoering fundering, prefabbalken-&dek en GVB werkzaamheden	10-04-20	8	22-04-20
	322	Uitvoering K&L en GVB werkzaamheden	23-04-20	45	25-06-20
	323	Afbouw en afronden werkzaamheden	26-06-20	21	24-07-20*
		Omgevingsprojecten			
		Werkzaamheden NOG NIET GEINVENTARISEERD	01-03-17*	152	03-10-17

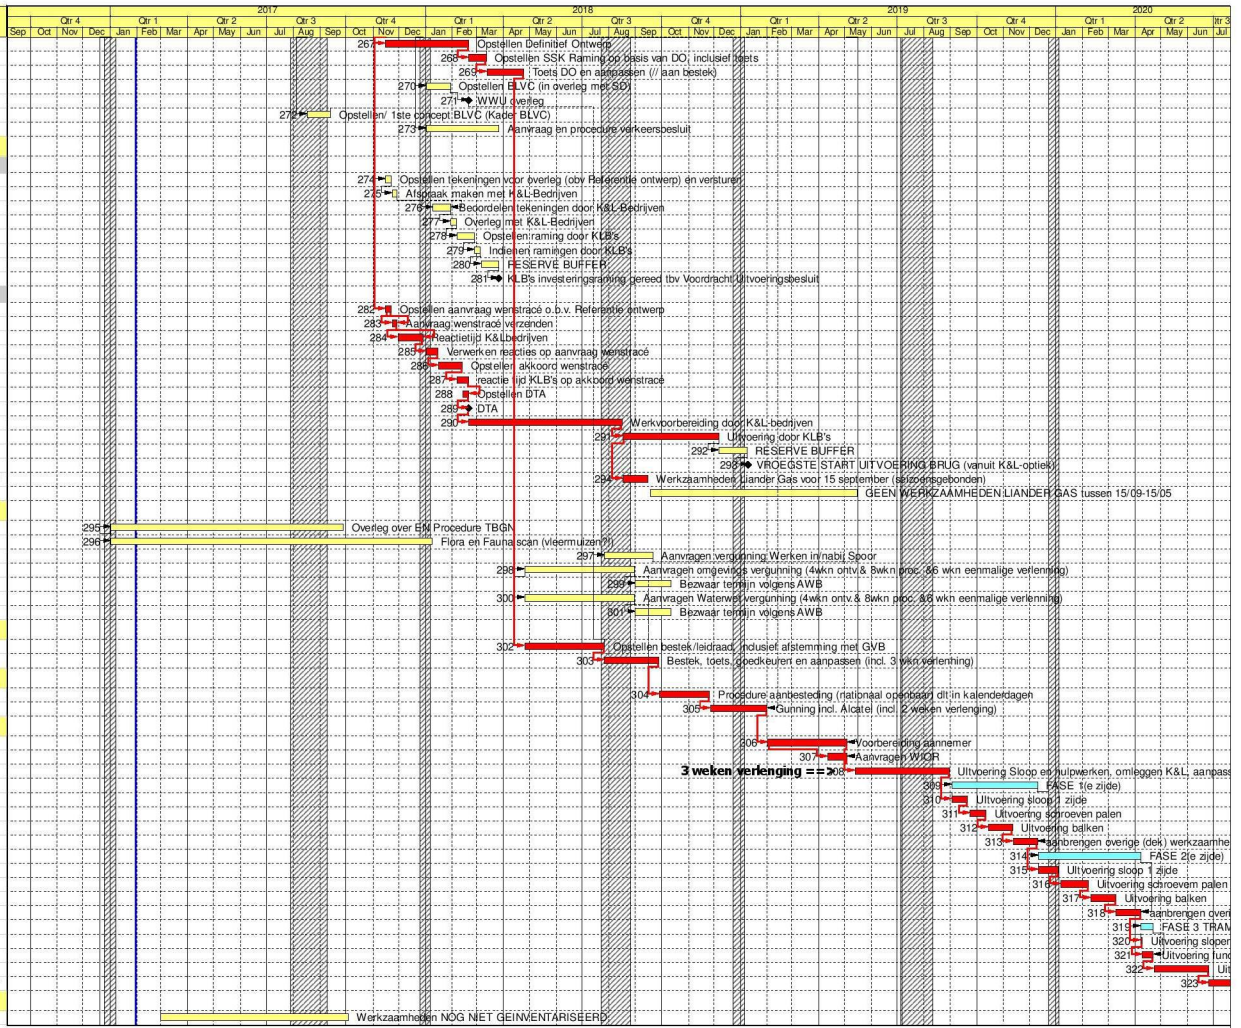

Brug 160 Bullebakssluis, volledig uit verkeer

Acti ID	Nr.	Activiteit	Start	Duur (werkd)	Gereed
		Algemeen			
	401	Regelen dekking	06-09-16 A	8	15-09-16 A
	402	START PROJECT	02-01-17 A	0	
	403	Overleg SRA voorlopig besluit over sub.	02-01-17 A	30	10-02-17
	404	Definitieve subsidie beschikking	13-02-17	90	21-06-17
	405	Opstellen BLVC-scan	02-09-16 A	20	29-09-16 A
	406	Opstellen 1ste hoofdlijnennplanning	02-09-16 A	26	07-10-16 A
	407	Uitwerken Projectplan	02-09-16 A	41	28-10-16 A
		Besluitv. Projectbesluit en Voorbereidingskrediet			
	408	Toets SSK-raming	31-10-16 A	10	11-11-16 A
	409	Opstellen flap tbv B&W, Cie. ID & Raad	14-11-16 A	10	25-11-16 A
	410	Afstemmen met AOG , Advies SARP, eind concept tbv DMC DJZ	28-11-16 A	11	12-12-16 A
	411	Akkoord DMC en DJZ	23-12-16 A	11	09-01-17 A
	412	Verwerken reactie DMC en DJZ	10-01-17 A	7	18-01-17 A
	413	AOG akkoord met def. versie	01-03-17*	1	01-03-17
	414	Aanleveren voor toetsing	02-03-17	2	03-03-17
	415	Toetsing	06-03-17	1	06-03-17
	416	STAND STIIIPERIODE tbv DJZ & DMC	07-03-17	4	10-03-17
	417	Ter info naar Stadsdeel Centrum	10-01-17 A	2	11-01-17 A
	418	Staf Litjens	13-03-17	0	
	419	Aanleveren B&W	14-03-17	5	20-03-17
	420	Behandeling in B&W	21-03-17	0	
	421	Aanleveren cie. ID en Raad ter kennisname	24-03-17	14	12-04-17
	422	In Cie I&D ter kennisname		0	12-04-17*
	423	Gemeenteraad	10-05-17*	2	11-05-17
		Besluitvorming Uitvoeringsfasering			
	424	Opstellen flap	17-08-17	15	06-09-17
	425	Afstemmen met AOG (en Advies SARP)	07-09-17	5	13-09-17
	426	Verwerken reacties AOG	14-09-17	1	14-09-17
	427	Aanleveren voor toetsing	15-09-17	2	18-09-17
	428	Toetsing	19-09-17	1	19-09-17
	429	Ter info naar Stadsdeel Centrum	15-09-17	2	18-09-17
	430	Staf Litjens	20-09-17	0	
		Bestuurlijke Besluitvorming Uitvoeringskrediet			
	431	Opstellen flappen tbv Besluit UV-krediet	13-03-18	16	04-04-18
	432	Afstemmen met AOG en Advies SARP	29-03-18	14	18-04-18
	433	Verwerken reacties uit preé-toets en afstem. SRA	19-04-18	4	24-04-18
	434	Aanleveren bij AOG	25-04-18	3	01-05-18
	435	Verwerken reacties AOG	02-05-18	2	03-05-18
	436	Aanleveren voor toetsing	04-05-18*	2	07-05-18
	437	Toetsing	08-05-18	1	08-05-18
	438	Ter info naar Stadsdeel	04-05-18	2	07-05-18
	439	STAND STIIIPERIODE tbv DJZ & DMC	09-05-18	5	15-05-18
	440	Staf Litjens	23-05-18	0	
	441	Behandeling in B&W		0	31-05-18
	442	Aanleverperiode commissie ID	01-06-18	16	22-06-18
	443	Behandeling in Cie I&D		0	22-06-18
	444	Gemeenteraad	06-07-18	2	09-07-18
		Onderzoek			
	445	Melding CoCuWo	21-10-16 A	15	11-11-16 A
	446	Offerte Inmeting uit	07-02-17*	20	06-03-17
	447	Aanbieding en opdracht inmeting	07-03-17	10	20-03-17
	448	Inplannen en uitvoering inmeting	21-03-17	20	18-04-17
	449	Uitvraag, offerte en opdracht aan ONDERZOEKBureau's	06-07-17	20	02-08-17
	450	Uitvoeren onderzoeken	03-08-17	25	06-09-17
	451	Review onderzoek Antea, incll. aanvullende onderzoeken	02-01-17 A	110	07-06-17
	452	Besluit V&OR wel/niet vervangen	08-06-17	30	19-07-17
	453	Varianten onderzoek	06-07-17	30	16-08-17
		Onderzoeken omgeving			
	454	Inventarisatie aanpak omliggende belendingen	03-04-17*	25	10-05-17
	455	Aanschrijven eigenaren funderingsherstel (gelijk met Br. 149)	11-05-17	25	14-06-17
	456	Periode tot start uitvoering	11-05-17	507	03-05-19
		Voorontwerp			
	457	Risicoanalyse sessie	25-04-17	5	03-05-17
	458	Stakeholder analyse	03-04-17	15	24-04-17
	459	Opstellen KES	03-04-17	65	05-07-17
	460	Opstellen Voorontwerp en raming	17-08-17	65	15-11-17
	461	Opstellen SES	28-09-17	65	29-12-17
	462	Verwerken onderzoeken in VO	17-10-17	20	13-11-17
	463	Opstellen Inkoopstrategie en behandeling bij Leadbuyer	24-08-17	30	04-10-17
		Definitief ontwerp			
	464	Aanmelden en behandeling WVA	16-11-17	10	29-11-17
	465	Aanmelden behandeling CVC	30-11-17	10	13-12-17
	466	Aanpassen ontwerp nav CVC	14-12-17	10	29-12-17

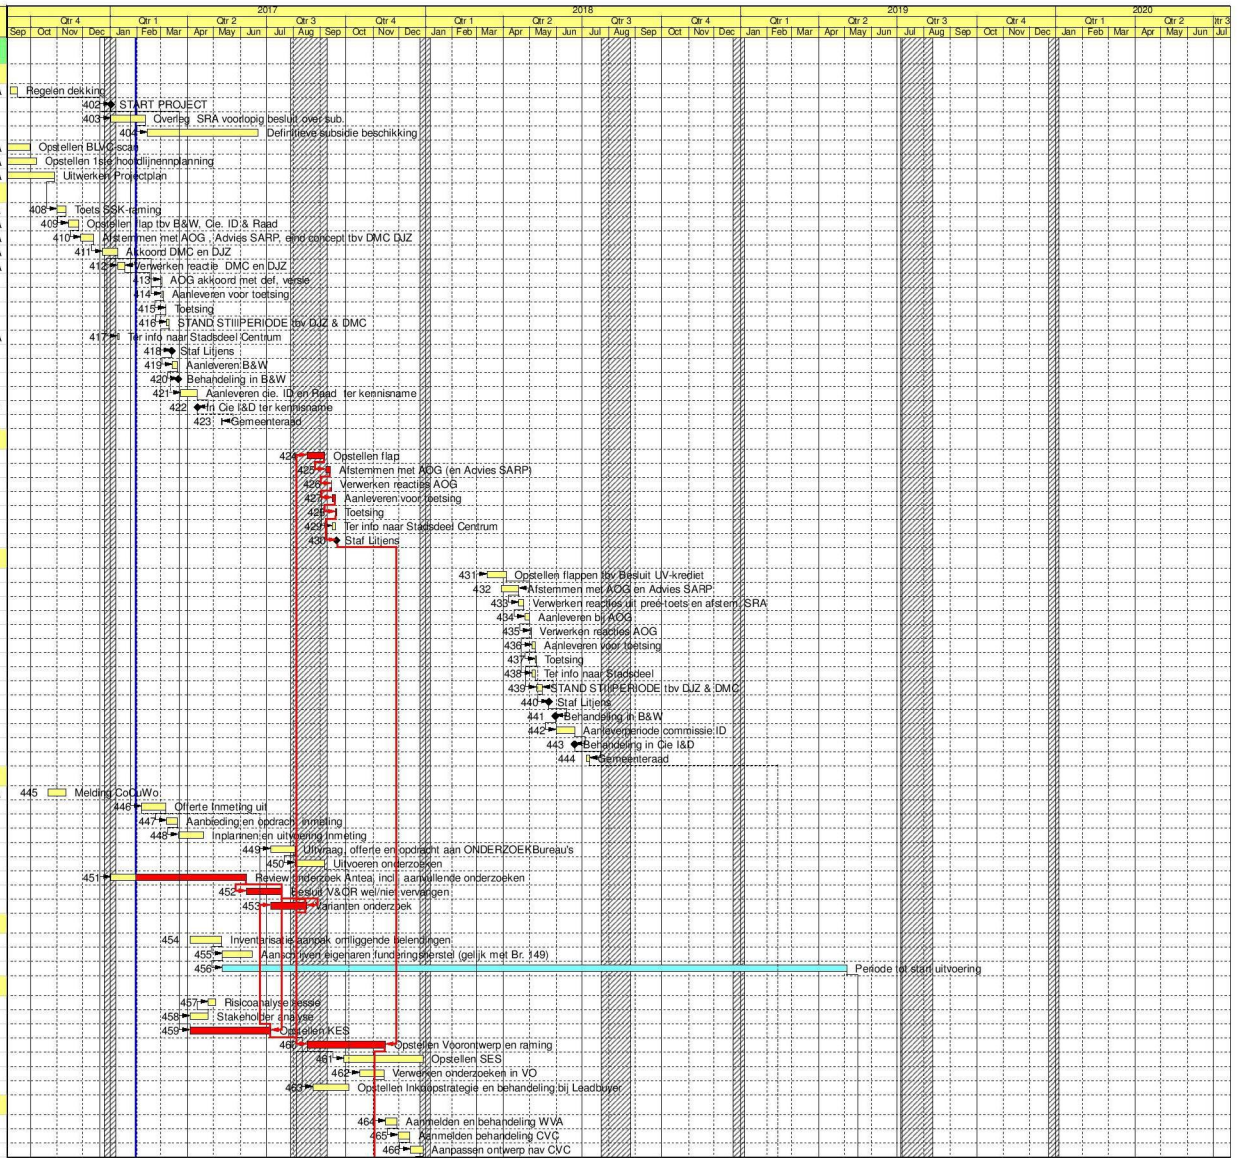

Acti ID	Nr.	Activiteit	Start	Duur (werkd)	Gereed
	467	Opstellen Definitief Ontwerp	16-11-17	65	19-02-18
	468	Opstellen SSK Raming op basis van DO, inclusief toets	20-02-18	15	12-03-18
	469	Toets DO en aanpassen	13-03-18	30	24-04-18
	470	Opstellen BLVC (in overleg met SD)	02-01-18	20	29-01-18
	471	WWU overleg	20-02-18*	0	
	472	Opstellen/ 1ste concept BLVC (Kader BLVC)	17-08-17	20	13-09-17
	473	Aanvraag en procedure verkeersbesluit	02-01-18	60	26-03-18
		Kabel & Leidingwerkzaamheden			
		Investeringsraming			
	474	Opstellen tekeningen voor overleg (obv Referentie ontwerp) en verstur	16-11-17	5	22-11-17
	475	Afspraak maken met K&L-Bedrijven	23-11-17	5	29-11-17
	476	Beoordelen tekeningen door K&L-Bedrijven	09-01-18	15	29-01-18
	477	Overleg met K&L-Bedrijven	30-01-18	5	05-02-18
	478	Opstellen raming door KLB's	06-02-18	15	26-02-18
	479	Indienen ramingen door KLB's	27-02-18	5	05-03-18
	480	RESERVE BUFFER	06-03-18	15	26-03-18
	481	KLB's investeringsraming gereed tbv Voordracht Uitvoeringsbesluit		0	26-03-18
		Wenstracé en werkvoorbereiding K&L			
	482	Opstellen aanvraag wenstracé o.b.v. Referentie ontwerp	16-11-17	5	22-11-17
	483	Aanvraag wenstracé verzenden	23-11-17	5	29-11-17
	484	Reactietijd K&Lbedrijven	30-11-17	20	29-12-17
	485	Verwerken reacties op aanvraag wenstracé	02-01-18	10	15-01-18
	486	Opstellen akkoord wenstracé	16-01-18	20	12-02-18
	487	reactie tijd KLB's op akkoord wenstracé	06-02-18	10	19-02-18
	488	Opstellen DTA	13-02-18	5	19-02-18
	489	DTA		0	19-02-18
	490	Werkvoorbereiding door K&L-bedrijven	20-02-18	125	16-08-18
	491	Uitvoering door KLB's	17-08-18	80	06-12-18
	492	RESERVE BUFFER	07-12-18	20	08-01-19
	493	VROEGSTE START UITVOERING BRUG (vanuit K&L-optiek)	09-01-19	0	
	494	Werkzaamheden Liander Gas voor 15 september (seizoensgebonden)	17-08-18	21	14-09-18*
		GEEN WERKZAAMHEDEN LIANDER GAS tussen 15/09-15/05	18-09-18*	168	15-05-19
		Vergunningen, procedures en toestemmingen			
	495	Overleg over EN Procedure TBGN	02-01-17 A	190	27-09-17
	496	Flora en Fauna scan (vleermuizen?!)	02-01-17 A	260	08-01-18
	497	Aanvragen vergunning Werken in/nabij Spoor	27-07-18	40	20-09-18
	498	Aanvragen omgevings vergunning (4wkn ontv.& 8wkn proc. &6 wkn ee	25-04-18	90	30-08-18
	499	Bezwaar termijn volgens AWB	31-08-18	30	11-10-18
	500	Aanvragen Waterwet vergunning (4wkn ontv.& 8wkn proc. &6 wkn een	25-04-18	90	30-08-18
	501	Bezwaar termijn volgens AWB	31-08-18	30	11-10-18
		Bestek			
	502	Opstellen bestek/leidraad	25-04-18	65	26-07-18
	503	Bestek, toets, goedkeuren en aanpassen (incl. 3 wkn)	27-07-18	45	27-09-18
		Inschrijving / Aanbesteding en Gunning			
	504	Procedure aanbesteding (nationaal openbaar) dlt in kalenderdagen	28-09-18	60	26-11-18
	505	Gunning incl. Alcatel	27-11-18	45	31-01-19
		Uitvoering volledig uit verkeer			
	506	Voorbereiding aannemer	01-02-19	65	03-05-19
	507	Aanvragen WIOR	12-04-19	15	03-05-19
	508	Uitvoering Sloop en hulpwerken, omleggen K&L, aanpassingen boven	13-05-19	65	09-08-19
	509	Uitvoering sloop (incl. 3 wkn Bouwvak)	12-08-19	25	13-09-19
	510	Uitvoering schroeven palen	16-09-19	15	04-10-19
	511	Uitvoering balken	07-10-19	21	04-11-19
	512	aanbrengen overige (dek) werkzaamheden	05-11-19	21	03-12-19
	513	Uitvoering K&L en GVB werkzaamheden	04-12-19	55	21-02-20
	514	Afbouw en afronden werkzaamheden	24-02-20	21	23-03-20*
		Omgevingsprojecten			
		Werkzaamheden NOG NIET GEINVENTARISEERD	01-03-17*	152	03-10-17

