Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

BouwRisk®

Bout nummer	Nulmeting (0) 10-7-2017	HH meting 1 (1) 21-11-2017	verschil (1-0) in mm	HH meting 2 (2) 23-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
1002A	1,7903	1,7906	0,3	1,7906	0,3	0,0						
1002B	1,7154	1,7164	1,0	1,7160	0,6	-0,4						
1002C	1,6205	1,6215	1,0	1,6205	0,0	-1,0						
1002D	1,4994	1,4998	0,4	1,4989	-0,5	-0,9						
1002E	1,3058	1,3067	0,9	1,3056	-0,2	-1,1						
1002F	1,4244	1,4251	0,7	1,4242	-0,2	-0,9						
1002G	1,2176	1,2185	0,9	1,2176	0,0	-0,9						
1003A	1,1620	1,1628	0,8	1,1619	-0,1	-0,9						
1003B	1,1440	1,1442	0,2	1,1432	-0,8	-1,0						
1005A	0,9962	0,9963	0,1	0,9952	-1,0	-1,1						
1005B	0,9872	0,9876	0,4	0,9865	-0,7	-1,1						
1005C	1,2721	1,2721	0,0	1,2714	-0,7	-0,7						
1006A	1,3189	1,3196	0,7	1,3193	0,4	-0,3						
1006B	1,2708	1,2709	0,1	1,2706	-0,2	-0,3						
1006C	0,7165	0,7168	0,3	0,7161	-0,4	-0,7						
1007	0,6202	0,6209	0,7	0,6202	0,0	-0,7						
1009A	0,6227	0,6231	0,4	0,6223	-0,4	-0,8						
1009B	0,6443	0,6445	0,2	0,6434	-0,9	-1,1						
1011	0,7269	0,7277	0,8	0,7268	-0,1	-0,9						
1012A	1,2541	1,2529	-1,2	1,2506	-3,5	-2,3						
1012B	0,6381	0,6362	-1,9	0,6334	-4,7	-2,8						
1013	1,2484	1,2465	-1,9	1,2436	-4,8	-2,9						
1014	0,6782	0,6770	-1,2	0,6746	-3,6	-2,4						
1016A	0,7215	0,7212	-0,3	0,7192	-2,3	-2,0						
1016B	0,6935	0,6933	-0,2	0,6919	-1,6	-1,4						
1018	0,7706	0,7708	0,2	0,7695	-1,1	-1,3						
1019A	0,6115	0,6076	-3,9	0,6030	-8,5	-4,6						
1019B	1,1932	1,1872	-6,0	1,1795	-13,7	-7,7						

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

BouwRisk®

Bout nummer	Nulmeting (0) 10-7-2017	HH meting 1 (1) 21-11-2017	verschil (1-0) in mm	HH meting 2 (2) 23-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
1021A	0,8135	0,8065	-7,0	0,7978	-15,7	-8,7						
1022A	0,7795	n.t.m.		0,7640	-15,5							
1022B	0,8650	0,8589	-6,1	0,8538	-11,2	-5,1						
1024A	1,3553	1,3501	-5,2	1,3446	-10,7	-5,5						
1024B	0,9161	0,9125	-3,6	0,9082	-7,9	-4,3						
1026A	1,4033	1,4004	-2,9	1,3970	-6,3	-3,4						
1026B	0,6949	0,6929	-2,0	0,6901	-4,8	-2,8						
1028A	1,5187	1,5165	-2,2	1,5140	-4,7	-2,5						
1028B	0,6842	0,6825	-1,7	0,6800	-4,2	-2,5						
1029	0,7082	0,7070	-1,2	0,7043	-3,9	-2,7						
1031A	0,6996	0,6983	-1,3	0,6958	-3,8	-2,5						
1031B	1,2429	1,2421	-0,8	1,2399	-3,0	-2,2						
1031C	1,7585	1,7583	-0,2	1,7556	-2,9	-2,7						
Opmerkingen herhalingsmetingen												

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

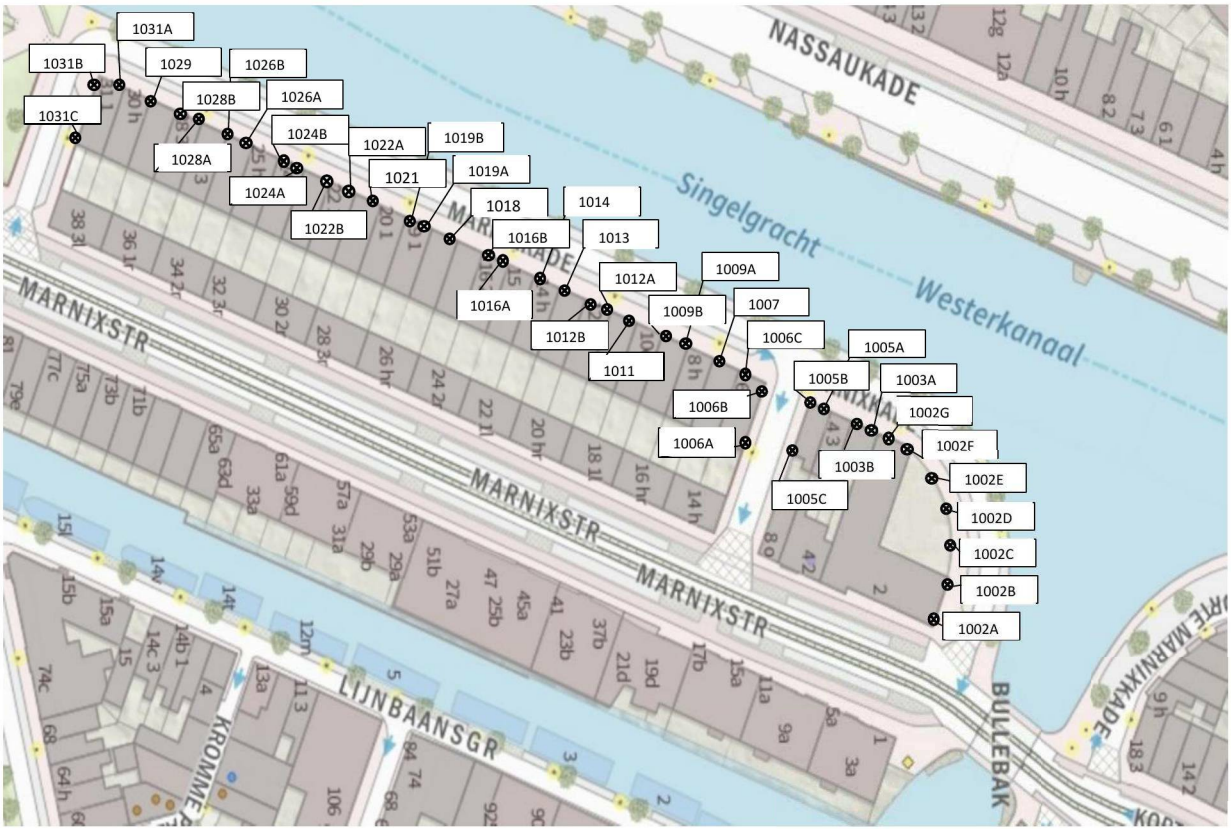

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

