heijmans

damwandplanning sloopkuipen: BRM Buiksloterham

Level 1
Pagina 1 van 1
Printdatum: 22-09-21

ID Activity	Activiteit	Omschrijving activiteit	Hoeveelheid (m1)	Duur (dgn)	Start	Finish	Bestekspost	Kuip	WBS Name
NEW									
Stelling 1									
B-645-1	Verwijderen	Damwand	65	4	27-09-21	30-09-21	645660	08	V-11-5 Machinezaal dep
B-644-1	Verwijderen	Damwand	154	6	27-09-21	04-10-21	644660	09	V-11-5 Machinezaal hoofdgebouw
B-615165	Aanbrengen	Damwand	-170	10	04-10-21	15-10-21	621210	11	CN-01 Ketelhuis 1
B-623	Aanbrengen	Damwand	-21	2	29-11-21	30-11-21	623210	10	CN-08 Diepe asput
B-633	Aanbrengen	Damwand	-82	4	01-12-21	06-12-21	633210	05C	CN-34 Koelwaterkanaal (boven)
B-635b	Aanbrengen	Damwand	-120	6	07-12-21	14-12-21	635660	06B	CN-35 Koelwaterkanaal (rt. Papaverweg)
B-631b	Aanbrengen	Damwand	-90	5	15-12-21	21-12-21	631660	05B	CN-33 Koelwaterkanaal (rt. Papaverweg)
B-624-1	Verwijderen	Damwand	246	8	22-12-21	14-01-22	624660	10	CN-08 Hoofdgebouw + uitbreiding CNII
B-623-1	Verwijderen	Damwand	21	2	22-12-21	23-12-21	623660	10	CN-08 Diepe asput
B-633-1	Verwijderen	Damwand	82	3	18-01-22	20-01-22	633660	05C	CN-34 Koelwaterkanaal (boven)
B-635b-l	Verwijderen	Damwand	120	4	17-02-22	22-02-22	635210	06B	CN-35 Koelwaterkanaal (rt. Papaverweg)
B-631b-l	Verwijderen	Damwand	90	3	23-02-22	25-02-22	631210	05B	CN-33 Koelwaterkanaal (rt. Papaverweg)
B-622-3	Verwijderen	Damwand	170	5	28-02-22	04-03-22	621660	11	CN-01 Ketelhuis 1
B-634	Aanbrengen	Damwand	-180	8	07-03-22	16-03-22	634210	13	CN-35 Koelwaterkanaal midden
B-647b	Aanbrengen	Damwand	-227	5	17-03-22	23-03-22	647210	07	V-14-2 Aanvoerkanaal (fase 2)
B-628	Aanbrengen	Damwand	-131	5	24-03-22	30-03-22	628210	14	CN-27 Silogebouw
B-630	Aanbrengen	Damwand	-295	12	31-03-22	15-04-22	630210	18	CN-33 Koelwaterkanaal midden
B-647-4	Verwijderen	Damwand	227	3	04-05-22	06-05-22	647660	07	V-14-2 Aanvoerkanaal (fase 2)
B-634-1	Verwijderen	Damwand	180	5	09-05-22	13-05-22	634660	13	CN-35 Koelwaterkanaal midden
B-629-1	Verwijderen	Damwand	70	4	16-05-22	19-05-22	629660	21	CN-33 Koelwaterkanaal utmonding/inlaat
B-632-1	Verwijderen	Damwand	120	5	20-05-22	30-05-22	632660	23	CN-34 + CN-35 Koelwaterkanaal (waterzijde)
B-636-1	Verwijderen	Damwand	231	7	31-05-22	09-06-22	636660	22	CN-08-32 Sinkput
B-627	Aanbrengen	Damwand	-118	6	10-06-22	17-06-22	627210	15	CN-24 Kolentransportoost
B-625	Aanbrengen	Damwand	-118	6	20-06-22	27-06-22	625210	16	CN-24 Kolentransport
B-626	Aanbrengen	Damwand	-40	3	28-06-22	30-06-22	626210	17	CN-24 Kolentransport
B-628-1	Verwijderen	Damwand	131	5	05-07-22	11-07-22	628660	14	CN-27 Silogebouw
B-630-1	Verwijderen	Damwand	295	12	12-07-22	27-07-22	630660	18	CN-33 Koelwaterkanaal midden
B-622-1	Verwijderen	Damwand	170	5	13-07-22	20-07-22	622660	12	CN-02 Ketelhuis 2, 1e ged.
B-625-1	Verwijderen	Damwand	118	4	01-08-22	04-08-22	625660	16	CN-24 Kolentransport
B-627-1	Verwijderen	Damwand	118	4	05-08-22	31-08-22	627660	15	CN-24 Kolentransportoost
B-626-1	Verwijderen	Damwand	40	3	01-09-22	05-09-22	626660	17	CN-24 Kolentransport
B-643-1	Verwijderen	Damwand	175	8	06-09-22	15-09-22	643660	20	V-11-1 Vuilnisbunker
Stelling 2									
B-645	Aanbrengen	Damwand	58	2	07-03-22	08-03-22	646210	19	V-14-1 Filtergebouw
B-632	Aanbrengen	Damwand	-120	5	09-03-22	15-03-22	632210	23	CN-34 + CN-35 Koelwaterkanaal (waterzijde)
B-629	Aanbrengen	Damwand	-70	4	16-03-22	21-03-22	629210	21	CN-33 Koelwaterkanaal utmonding/inlaat
B-636	Aanbrengen	Damwand	-231	10	22-03-22	04-04-22	636210	22	CN-08-32 Sinkput
B-645-1	Verwijderen	Damwand	58	2	07-04-22	08-04-22	646660	19	V-14-1 Filtergebouw
B-622	Aanbrengen	Damwand	-170	10	11-04-22	25-04-22	622210	12	CN-02 Ketelhuis 2, 1e ged.
B-643	Aanbrengen	Damwand	-175	10	26-04-22	10-05-22	643210	20	V-11-1 Vuilnisbunker
KADE									
Ploeg algemeen									
B-4411	Aanbrengen	Tijdelijke dam	??	50	13-12-21	04-03-22	4411 ??		Kadeconstructie (tijdelijk)
B-4421	Aanbrengen	Definitieve dz	??	14	07-03-22	24-03-22	4421 ??		Kadeconstructie (definitief)
B-4421d	Aanbrengen	Definitieve dz	??	10	11-04-22	25-04-22	4421 ??		Kadeconstructie (definitief)
B-4411-1	Verwijderen	Tijdelijke dam	??	30	15-07-22	15-09-22	4411 ??		Kadeconstructie (tijdelijk)
B-615131	Aanbrengen	Definitieve dz	??	87	16-05-22	30-01-23	4421 ??		Kadeconstructie (definitief)

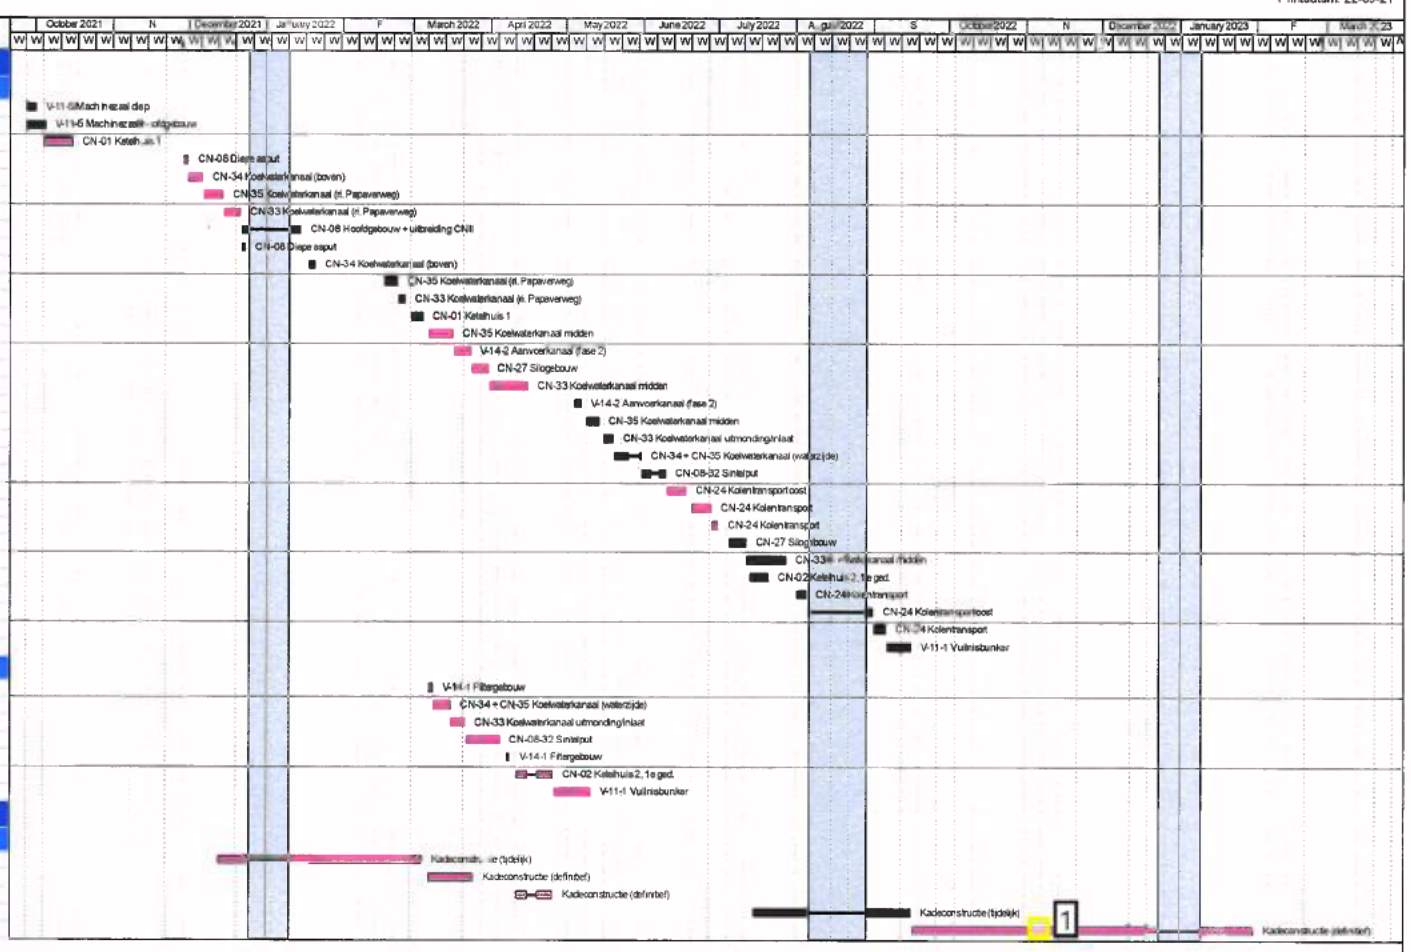

WBS Sum
Meelopend werk
Resterend werk
Milestone
Kritische mijlpal
Heijmans Funderingstechnieken
HFT verwijderen
Werk gereed

DMS Doc. nr

Date	Revision	Checked	Approved
02-06-21	damwandplanning	5.1.2.e	
06-06-21	damwandplanning bij v4.7		
25-06-21	damwandplanning bij v5.0		
22-09-21	damwandplanning bij v6.0		

Overzicht van opmerkingen bij Bijlage damwandplanning.pdf

Pagina: 1

Nummer: 1 Auteur: 5.1.2.e Onderwerp: Notitie Datum: 23-11-2021 16:42:14 +01'00'

deze werkzaamheden zijn in dit werk komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de damwand van de verontdieping waarvoor een separate vergunning is aangevraagd. De uitvoeringsplanning van de verontdieping is nog erg onzeker.
