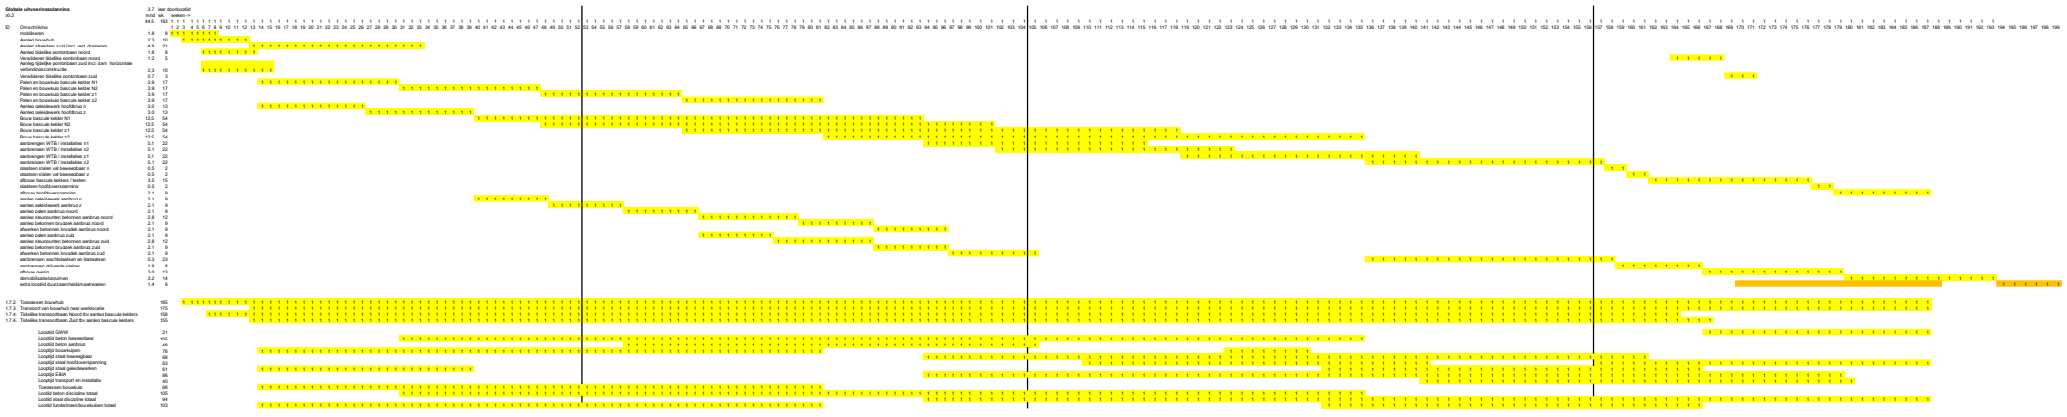

Globale uitvoeringsplanning
v0.2
3.7 jaar doorlooptijd
mnd wk werkdag nr
44.5 183 1
ID Omschrijving
mobilisaties 1.8 8
Aanleg bouwpits 1.5 10
Aanleg stabiele zomtonbaan noord 1.8 8
Verwijderen tijdelijke zomtonbaan noord 1.2 5
Verwijderen tijdelijke zomtonbaan zuid incl. dam horizontale verbindingsconstructie 2.3 10
Verwijderen tijdelijke zomtonbaan zuid 0.7 3
Palen en bouwkuip bascule ketder N1 3.9 17
Palen en bouwkuip bascule ketder N2 3.9 17
Palen en bouwkuip bascule ketder z1 3.9 17
Palen en bouwkuip bascule ketder z2 3.9 17
Aanleg oeteldewerk hoofdhoud n 3.0 13
Aanleg oeteldewerk hoofdhoud z 3.0 13
Bouw bascule ketder N1 12.5 54
Bouw bascule ketder N2 12.5 54
Bouw bascule ketder z1 12.5 54
Bouw bascule ketder z2 11.1 54
aanbrengen WTB / metalatlas n1 5.1 22
aanbrengen WTB / metalatlas n2 5.1 22
aanbrengen WTB / metalatlas z1 5.1 22
aanbrengen WTB / metalatlas z2 5.1 22
staalsen stalen val beweegbaar n 0.5 2
staalsen stalen val beweegbaar z 0.5 2
afbouw bascule ketders / kesten 3.5 15
staalsen hoofdoverspanningen 0.5 2
afbouw hoofdoverspanningen 1.1 5
aanleg oeteldewerk aanbrug n 1.1 5
aanleg oeteldewerk aanbrug z 2.1 9
aanleg oden aanbrug noord 2.1 9
aanleg betonnen brugdek aanbrug noord 2.1 9
aanleg betonnen brugdek aanbrug noord 2.1 9
afwerken betonnen brugdek aanbrug noord 2.1 9
aanleg oden aanbrug zuid 2.1 9
aanleg steunconten betonnen aanbrug zuid 2.8 12
aanleg betonnen brugdek aanbrug zuid 2.1 9
afwerken betonnen brugdek aanbrug zuid 2.1 9
aanbrengen afbouwelementen en balkdelen 1.8 8
aanbrengen afbouwelementen 1.8 8
afbouw overig 3.5 15
demobilisatiefaseringsmaas 3.2 14
extra loodtijd duurzaamheidsmaatregelen 1.4 6
1.7.2 Toeslagen bouwhuis 185
1.7.3 Transport van bouwhuis naar werklocatie 175
1.7.4 Tijdelijke transportbaan Noord tbv aanleg bascule ketders 158
1.7.4 Tijdelijke transportbaan Zuid tbv aanleg bascule ketders 150
Loodtijd GWW 21
Loodtijd beton beweegbaar n+z
Loodtijd staal beweegbaar 49
Loodtijd bouwkuipen 78
Loodtijd staal beweegbaar 63
Loodtijd staal hoofdoverspanning 63
Loodtijd staal gelddewerken 61
Loodtijd E&A 86
Loodtijd transport en installatie 40
Toeslagen bouwkuip 68
Loodtijd beton dasculke totaal 105
Loodtijd staal dasculke totaal 63
Loodtijd fundamenten/kuipwanden totaal 103
