Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	14 februari 2023	2203-17228- v 0.14
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

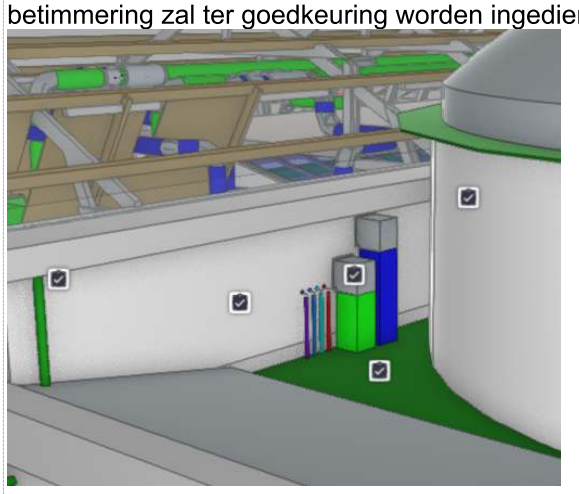
Aanwezig: 14-02-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
	ARTIS	5.1.2e
5.1.2e	M&A Amsterdam	
	M&A Amsterdam	5.1.2e
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
	Verlaan en Bouwstra	
	OTH	5.1.2e
	Salverda	
	Salverda	5.1.2e
	BBN directievoerder	Evert Woudenberg
Gerhard Lokhorst	Salverda	
Roy Wielage	Salverda	
	Venema	Erik Koops

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	- Afspraak RCE 5.1.2e en 5.1.2e (gevelbreed overleg) – 5.1.2e stemt af of 5.1.2e hierbij te betrekken, mogelijk in februari met natuursteen. Dit is afhankelijk van de planvorming en stand van het werk afhankelijk. Doel van overleg: werkplan bespreken, bemonstering en materiaal.	5.1.2e
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 24-01-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord.	
1.03	**Werkplannen**	
	Proces loopt via V&B naar stand van het werk.	5.1.2e
1.04	**Natuursteen gevel**	
	In ontwikkeling, contact hierover loopt via V&B	5.1.2e
	Onderzoek zandsteen	5.1.2e
	Zoals besproken worden nog 2 schoonmaaktechnieken uitgeprobeerd, op locatie wordt deze op 21-2 beoordeeld (sandwashing & stoom reinigen), positie zoals besproken tijdens de rondgang.	Salverda
1.05	**Stucwerkgevel**	
	Tijdens de rondgang zijn hier geen bijzonderheden opgemerkt, voortgang gaat volgens planvorming, kwaliteit van het werk is akkoord.	
1.06	**Daken**	
	Details zijn afgestemd met opdrachtgever en akkoord bevonden.	
	Roosters bouwdeel A: type en positie goedgekeurd, Salverda maakt nog een detail met aansluitingen van het rooster op zink.	Salverda 5.1.2e

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde
T 0525 - 65 16 66
info@salverda.nl
www.salverda.nl
NL26ABNA0476472725
BIC ABNANL2A
KvK 08011909
BTW NL001212527B01

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

	Uitvoering en bevestiging attiek wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B	Salverda 5.1.2e
	Schuine wanden van voormalige lichtkappen zitten op plaatsen waar de nieuwe luchtbehandelingskanalen en voorzieningen gepositioneerd zijn. De vraag is wat weg kan/mag. Salverda werkt dit verder uit en komt met voorstel. Uitgangspunt is zoveel mogelijk behoud daar waar technisch, (installatie en bouwkundig) mogelijk. Voorstel volgt later. *-> impact op aanwezige wanden minimaal, installatiewerk is zo ontworpen dat aanwezige materiaal maximaal behouden blijft*	vaststelling
	In de bestektekeningen/ontwerptekeningen en omgevingsvergunning van de installaties is het hoofdtracee ontworpen via het dak van bouwdeel B naar C aan de achterzijde van het aquarium. Tijdens engineering van de installaties komen wij niet met deze positie weg, hier is nu een alternatieve route ontworpen, zoals onderstaande tekening. Het leidingwerk zal betimmerd worden, afwerking stuclaag gelijk aan gevel. Positie leidingwerk is akkoord, voorstel voor het afwerken van de betimmering zal ter goedkeuring worden ingediend. 	
1.06	**Binnenafbouw**	
	Voorstel voor wandafwerking en detaillering volgt, aan de hand hiervan de definitieve werkzaamheden plannen.	5.1.2e
	Nooduitgangsbordjes zijn een belangrijk aandachtspunt voorstel komt via OTH (voorbeeld locatie in Amsterdam beschikbaar?) Gaat om esthetisch passende / verantwoorde oplossing	
	Aquariumzaal: 5.1.2e laat 5.1.2e kleuronderzoek uitvoeren op de 2 houten deuren (stramien 6), hier schijnt nog een originele kleur op te zitten.	5.1.2e
1.07	**Glas/Kozijnen**	
	Tekeningen m.b.t. positie van de nieuwe beglazing zijn doorgenomen en akkoord bevonden.	Vaststelling
	Tekeningen t.b.v. het toepassen van de kierdichting zijn doorgenomen en akkoord bevonden, ook de mockup die in het werk zijn gemaakt zijn akkoord bevonden. Zwarte kierdichting wordt toegepast, evenals de beglazingskit en afstandhouders in het glas.	vaststelling
	Besloten is dat in het gevelvlak (stramien 1 en 2), waar ook de stucwerk mock-up is gemaakt nu als referentie te gebruiken om daarin toe te passen het nieuwe: beglazing, kierdichting, kleurstelling van de ramen en kozijnen. Dit ter beoordeling van de betrokken partijen.	Salverda

	Beoordeling totale gevel, week 12 (onder voorbehoud van levering beglazing)	
1.08	**Overige bespreekpunten**	
	n.v.t.	
1.09	**Rondgang bouw**	
	Ronde gemaakt over de steiger langs het natuursteen. - Positie bepaald welke gereinigd wordt voor de Mock-up. - deze wordt beoordeeld op dinsdag 21-2 om 13.30uur, door M&A/OG.	
	Houtconstructie van het dak bekeken (bouwdeel A), 1e deel is gereed t.b.v. montage zink. Het gemaakte werk ziet er netjes uit.	
	Het proefstuk tochtwering is in het werk bekeken (kozijn bouwdeel C) en zoals hierboven omschreven akkoord bevonden.	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2
