Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 24-Jun-24

Activity ID	Actiehouder	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
Herengracht 107-169 Planning tot GSU			29-Nov-23	27-Sep-27	867.00
Referentie mijlpalen			10-Oct-25	22-Apr-26	125.00
A2700		MIJLPAAL: Concept bestek gereed		10-Oct-25	0.00
A2710		MIJLPAAL: Definitief bestek gereed		19-Dec-25	0.00
A2760		MIJLPAAL: NOK Realisatie overeengekomen		20-Mar-26	0.00
A2765		MIJLPAAL: GSU Herengracht 107-169		22-Apr-26	0.00
WP8 - DO Maaiveld			04-Oct-24	01-May-25	138.00
A2665		Stakeholderanalyse en opstellen KES	04-Oct-24	14-Nov-24	30.00
A2670		Opstellen en vastellen definitief Stedebouwkundig ontwerp	15-Nov-24	06-Feb-25	50.00
A2680		Uitwerken technisch maaiveldontwerp	26-Feb-25	08-Apr-25	30.00
A2690		Review en vaststellen definitief maaiveldontwerp	09-Apr-25	01-May-25	15.00
WP9 - Ontwerp, bestek en NOK Realisatie			02-Sep-24	20-Mar-26	362.00
WP9.0 - Conditionering en review stukken			02-Sep-24	09-Jan-25	84.00
A2980		Verzamelen reeds uitgevoerde onderzoeken	02-Sep-24*	06-Sep-24	5.00
A2990		Toets geldigheid en volledigheid van onderzoeken en beschikbare documentatie (ON)	09-Sep-24	03-Oct-24	19.00
A3000		Uitvoeren aanvullende onderzoeken tbv benodigde informatie voor opstellen ontwerp (OG+ON)	04-Oct-24	09-Jan-25	60.00
WP9.1 - Voorlopig ontwerp			04-Oct-24	25-Feb-25	93.00
A1000		Opstellen Voorlopig Ontwerp HGR 2 incl Ontwerpnotitie en Variantenstudie	04-Oct-24	17-Dec-24	53.00
A1001		Review Voorlopig Ontwerp (gem Ams + BeensCC)	18-Dec-24	21-Jan-25	15.00
A1011		Vaststellen Voorlopig Ontwerp i.o.m. gemeente Amsterdam	22-Jan-25	11-Feb-25	15.00
A3120	OG	VO-kostenraming (SSK) opstellen	12-Feb-25	25-Feb-25	10.00
A3130		Voorlopig Ontwerp vastgesteld incl. SSK-raming		25-Feb-25	0.00
WP9.2 - Definitief ontwerp			26-Feb-25	16-Jul-25	95.00
A1002		Opstellen Definitief Ontwerp (DO) HGR 2 incl Ontwerpnotitie	26-Feb-25	09-May-25	50.00
A1005	ON	Review Definitief Ontwerp (gem Ams + BeensCC)	12-May-25	11-Jun-25	20.00
A1015		Vaststellen Definitief Ontwerp i.o.m. gemeente Amsterdam	12-Jun-25	02-Jul-25	15.00
A1025	OG	DO-kostenraming (SSK) opstellen	03-Jul-25	16-Jul-25	10.00
A1035		Definitief Ontwerp vastgesteld incl. SSK-raming		16-Jul-25	0.00
WP9.3 - Bestek			17-Jul-25	19-Dec-25	95.00
A1560	OG	Bestek HGR 2 schrijven	17-Jul-25	19-Sep-25	30.00
A1600	OG	Bestekstekeningen opstellen o.b.v. DO incl hoeveelheden verwerken in deel 2.2	22-Sep-25	10-Oct-25	15.00
A2255	OG	Concept bestek HGR 2 gereed		10-Oct-25	0.00
A2260	OG+ON	Review bestek door IPM & specialisten (OG)	13-Oct-25	24-Oct-25	10.00
A2261		Opstellen NVI door BeensCC obv concept bestek (ON)	13-Oct-25	24-Oct-25	10.00
A2270	OG	Verwerken feedback uit review IPM & specialisten en BeensCC (OG) (tot bestek 1.0)	27-Oct-25	07-Nov-25	10.00
A2271		Opstellen NVI ronde 2 door BeensCC obv bestek 1.0	10-Nov-25	21-Nov-25	10.00
A2272		Verwerken feedback uit NVI ronde 2 en uit BLVC plan (OG) (tot definitief bestek)	24-Nov-25	28-Nov-25	5.00
A2280	OG	Toets ABT op defintitief bestek (OG)	01-Dec-25	12-Dec-25	10.00
A2290	OG	Review verwerken en afstemming met ABT (OG)	15-Dec-25	19-Dec-25	5.00
A2300	OG	Definitief bestek HGR 2 gereed		19-Dec-25	0.00
WP15.8 - NOK Realisatie			22-Jan-25	20-Mar-26	270.00
A1550	ON	Start calculatieperiode bestek HGR 2	05-Jan-26		0.00
A2310	ON	Opstellen concept aanbieding door BeensCC obv definitief bestek	05-Jan-26	23-Jan-26	15.00
A2320	OG+ON	Bespreken en beoordeling concept aanbieding BeensCC+OG	26-Jan-26	30-Jan-26	5.00
A2330	ON	Opstellen definitieve aanbieding door BeensCC	02-Feb-26	20-Feb-26	15.00
A2340	OG+ON	Bespreken en beoordeling definitieve aanbieding BeensCC+OG	23-Feb-26	27-Feb-26	5.00
A2350	OG+ON	Aanvullende afstemming kostenraming definitieve aanbieding	02-Mar-26	06-Mar-26	5.00
A2360	OG	Akkoord lead-buyer en AOG	09-Mar-26	20-Mar-26	10.00
A2370	ON	NOK Realisatie overeengekomen		20-Mar-26	0.00
Werkvoorbereiding tbv overeenkomen NOK Realisatie			12-Feb-25	20-Feb-26	235.00
A2782		Opstellen eerste concept uitvoeringsplanning en fasering (LEAN-weekniveau)	12-Feb-25	11-Mar-25	20.00
A2790	ON	Opstellen Uitvoeringsplanning incl. materieelinzet tbv concept aanbieding	10-Nov-25	12-Dec-25	25.00
A2795	ON	Aanpassen en updaten Uitvoeringsplanning tbv definitieve aanbieding	02-Feb-26	20-Feb-26	15.00
A2800	ON	Opstellen Risicodossier tbv conceptaanbieding	22-Sep-25	07-Nov-25	35.00
A2890	ON	Aanpassen en updaten Risciodosser tbv definitieve aanbieiding	02-Feb-26	20-Feb-26	15.00
Bouwplaatsinrichtingstekeningen			22-Jan-25	16-Jan-26	225.00
A2920	ON	Opstellen bouwplaatsinrichtingstekeningen en stappenplan	12-Mar-25	01-Apr-25	15.00
A2925		Aanpassen en updaten bouwpaatsinrichtingstekeningen en stappenplan	15-Dec-25	16-Jan-26	15.00
A2930	ON	Opstellen faseringstekeningen (doorsnedes) (VO)	22-Jan-25	04-Mar-25	30.00
WP15 - Contract (NOK voorbereiding en NOK Inkoop Staal)			17-Jul-25	17-Oct-25	50.00
WP15.7 - NOK Inkoop staal			17-Jul-25	17-Oct-25	50.00
A2405	OG	Uitvraag NOK Inkoop staal door OG	17-Jul-25*	22-Aug-25	10.00
A2410	ON	Opstellen offerte NOK Inkoop staal door ON	25-Aug-25	19-Sep-25	20.00
A2420	OG	Beoordeling offerte NOK Inkoop staal door OG + evt. aanpassingen	22-Sep-25	17-Oct-25	20.00
A2430	OG+ON	NOK Inkoop staal gereed		17-Oct-25	0.00
WP10 - Wenstracé procedure			11-Dec-23	14-May-25	327.00
A1040	OG	Tracé Akkoord Procedure inclusief afstemmen met (K&L) nutsbeheerders	11-Dec-23*	06-Dec-24	260.00
A1620	OG	K&L werkvoorbereiding	09-Dec-24	14-May-25	100.00
WP16.2.21 - BLVC			12-Feb-25	20-Mar-26	255.00
BLVC versie 1.0			12-Feb-25	23-Jun-25	88.00

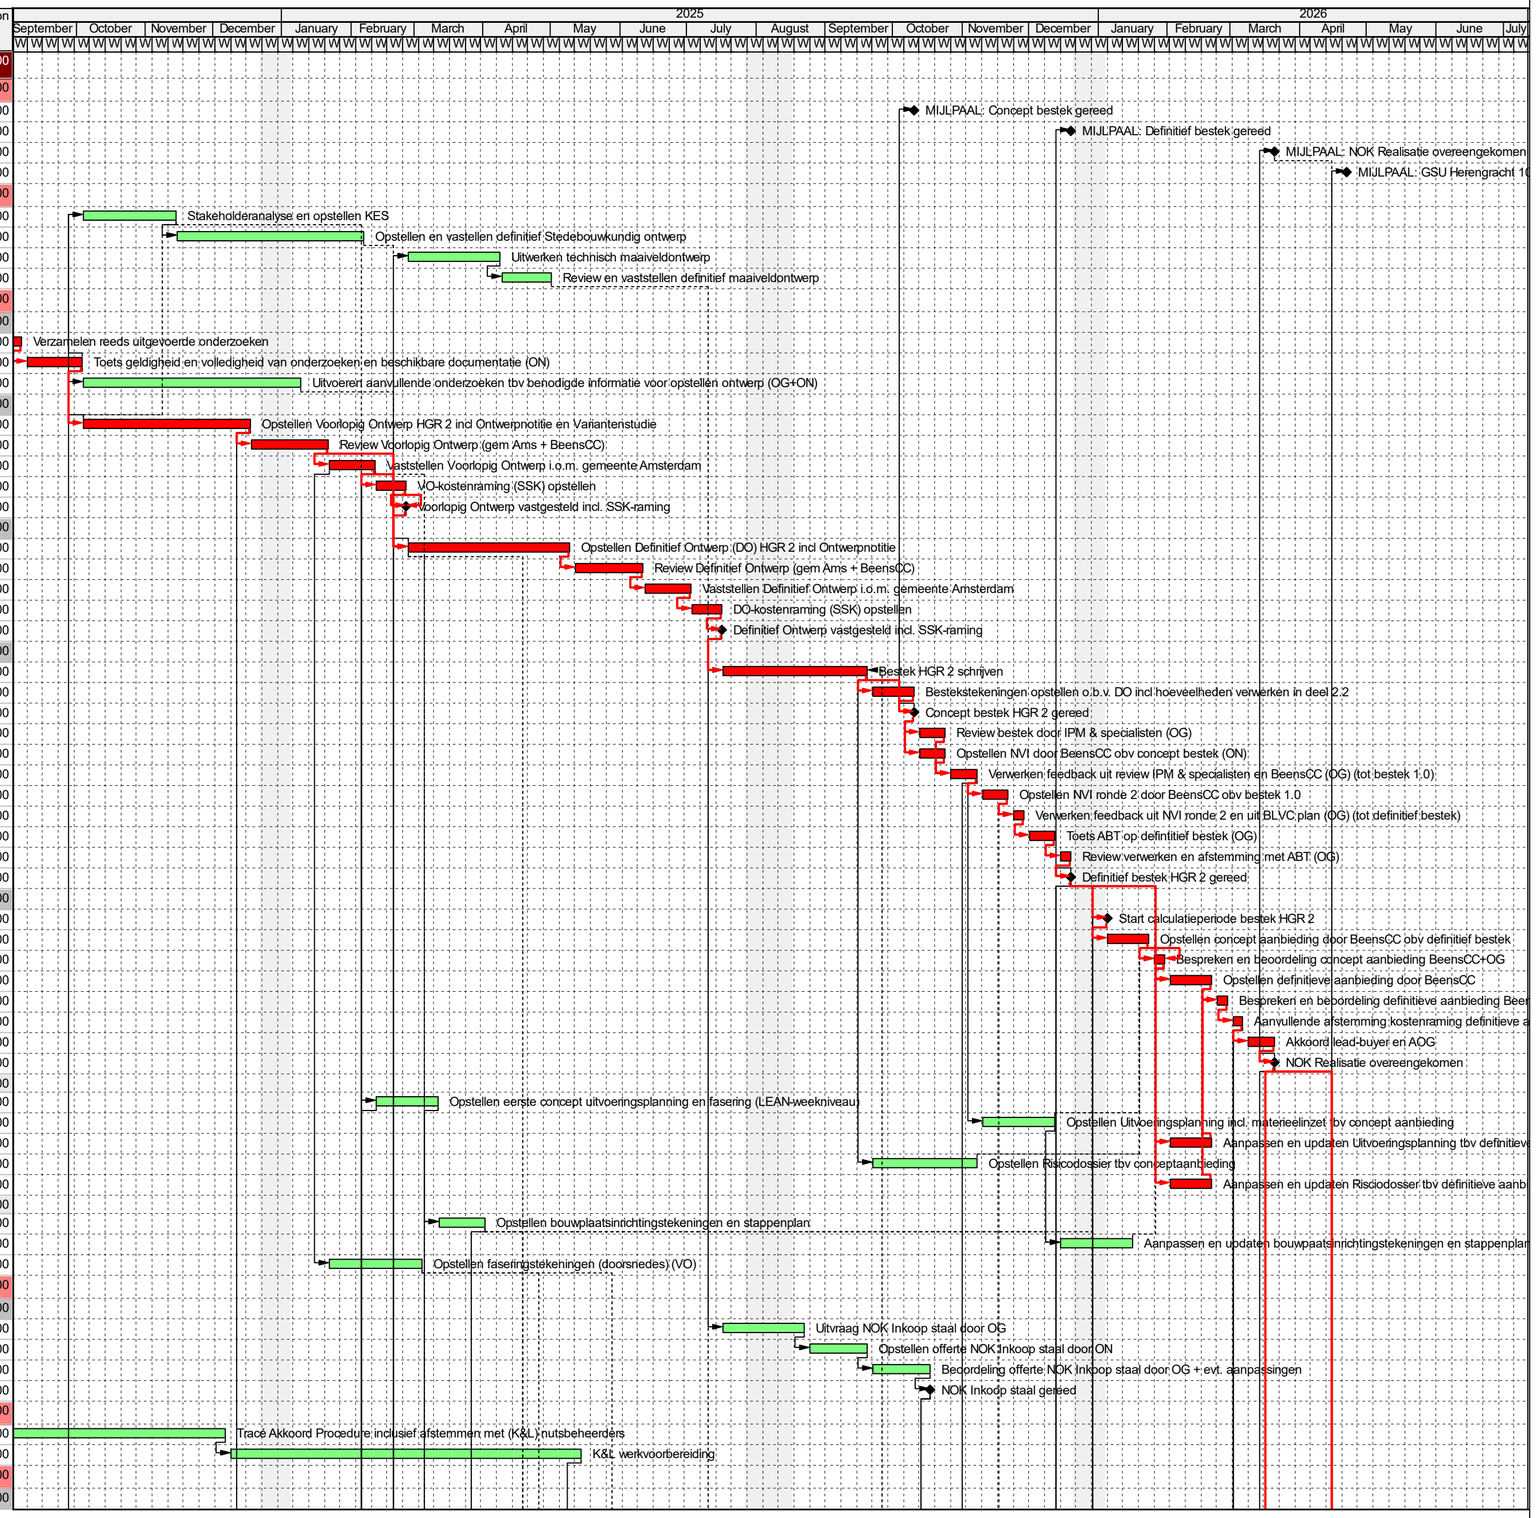

◆ Milestone
Critical Remaining Work
Actual Work
Actual Level of Effort
Remaining Level of Effort
Remaining Work

TASK filter: *SOK | No Completed Activities.

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: Herengracht 107-169 Planning tot GSU
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 24-Jun-24

Activity ID	Actiehouder	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
A1348		Opstellen BLVC-kader (door OG)	12-Feb-25	11-Mar-25	20.00
A1351	OG+ON	Opstellen concept BLVC plan (door ON)	02-Apr-25	24-Apr-25	15.00
A1352	OG+ON	Review concept BLVC plan door OG	25-Apr-25	01-May-25	5.00
A1360	OG+ON	Verwerken review en definitief maken BLVC plan HGR 2	02-May-25	16-May-25	10.00
A1370	OG+ON	WIOR vooroverleg	19-May-25	03-Jun-25	10.00
A1380	OG+ON	BLVC uitvoeringsplan HGR 2 bijwerken nav WIOR vooroverleg	04-Jun-25	16-Jun-25	8.00
A1390	OG+ON	Aanleveren BLVC plan HGR 2 tbv WWU (dinsdagen)		16-Jun-25	0.00
A1400	OG+ON	WWU beoordeling BLVC plan HGR 2 (1x per 2 weken, dinsdagen)		23-Jun-25	0.00
A1420	OG+ON	BLVC uitvoeringsplan HGR 2 definitief		23-Jun-25	0.00
TVM-tekeningen (tbv BLVC)			25-Apr-25	23-May-25	20.00
A3110	O	Opstellen TVM-tekeningen (tbv BLVC plan)	25-Apr-25	23-May-25	20.00
BLVC versie 2.0			09-Mar-26	20-Mar-26	10.00
A3010		Opstellen BLVC versie 2.0 nav aanbieding (wijzigingen/optimalisaties)	09-Mar-26	20-Mar-26	10.00
A3020		Aanleveren BLVC plan versie 2.0 HGR 2 tbv WWU (dinsdagen)		20-Mar-26	0.00
A3030		BLVC uitvoeringsplan versie 2.0 HGR 2 definitief btv uitvoering		20-Mar-26	0.00
WP11 - Vergunningen OG			04-Oct-24	13-Mar-26	333.00
A2210	OG	Vergunningen OG tbv GSU verleend (8 + 6 + 6 weken)		19-Aug-25	0.00
WP11.1 - Omgevingsvergunningen (sloop)			04-Oct-24	23-Sep-25	220.00
Omgevingsvergunning sloop (kadewerkzaamheden)			26-Feb-25	23-Sep-25	127.00
A1130	OG	Indienen aanvraag omgevingsvergunning sloop	26-Feb-25	25-Mar-25	20.00
A1140	OG	Procedure aanvraag omgevingsvegunning sloop (8 + 6 weken)	26-Mar-25	01-Jul-25	70.00
A1150	OG	Omgevingsvergunning sloop herroepelijk		01-Jul-25	0.00
A1160	OG	Bezwaartermijn omgevingsvergunning sloop (6 weken)	02-Jul-25	12-Aug-25	30.00
A1170	OG	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning sloop (bij geen bezwaar)		12-Aug-25	0.00
A1180	OG	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning sloop (6 weken)	13-Aug-25	23-Sep-25	30.00
A1190	OG	Omgevingsvergunning sloop onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		23-Sep-25	0.00
Omgevingsvergunning sloop (kapvergunning bomen)			04-Oct-24	01-May-25	138.00
A3040	OG	Indienen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen	04-Oct-24	31-Oct-24	20.00
A3050	OG	Procedure aanvraag omgevingsvegunning kappen bomen (8 + 6 weken)	01-Nov-24	06-Feb-25	70.00
A3060	OG	Omgevingsvergunning kappen bomen herroepelijk		06-Feb-25	0.00
A3070	OG	Bezwaartermijn omgevingsvergunning kappen bomen (6 weken)	07-Feb-25	20-Mar-25	30.00
A3080	OG	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning kappen bomen (bij geen bezwaar)		20-Mar-25	0.00
A3090	OG	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning kappen bomen (6 weken)	21-Mar-25	01-May-25	30.00
A3100	OG	Omgevingsvergunning kappen bomen onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		01-May-25	0.00
WP11.2 - Omgevingsvergunning (bouw)			26-Feb-25	23-Sep-25	127.00
A1060	OG	Indienen aanvraag omgevingsvergunning bouw	26-Feb-25	25-Mar-25	20.00
A1070	OG	Procedure aanvraag omgevingsvegunning bouw (8 + 6 weken)	26-Mar-25	01-Jul-25	70.00
A1080	OG	Omgevingsvergunning bouw herroepelijk		01-Jul-25	0.00
A1090	OG	Bezwaartermijn omgevingsvergunning bouw (6 weken)	02-Jul-25	12-Aug-25	30.00
A1100	OG	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning bouw (bij geen bezwaar)		12-Aug-25	0.00
A1110	OG	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning bouw (6 weken)	13-Aug-25	23-Sep-25	30.00
A1120	OG	Omgevingsvergunning bouw onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		23-Sep-25	0.00
WP11.3 - Watervergunning			26-Feb-25	23-Sep-25	127.00
A1200	OG	Indienen aanvraag watervergunning	26-Feb-25	25-Mar-25	20.00
A1210	OG	Procedure aanvraag watervergunning (8 + 6 weken)	26-Mar-25	01-Jul-25	70.00
A1220	OG	Watervergunning herroepelijk		01-Jul-25	0.00
A1230	OG	Bezwaartermijn watervergunning (6 weken)	02-Jul-25	12-Aug-25	30.00
A1240	OG	Vergunning onherroepelijk watervergunning (bij geen bezwaar)		12-Aug-25	0.00
A1250	OG	Bezwaarschriftprocedure watervergunning (6 weken)	13-Aug-25	23-Sep-25	30.00
A1260	OG	Watervergunning onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		23-Sep-25	0.00
WP11.4 - Traject welstandscommissie en CRK			18-Dec-24	25-Feb-25	40.00
A2215	OG	Afstemmen ontwerp met welstand	18-Dec-24	25-Feb-25	40.00
A2220	OG	Voorkeurssteen vastgesteld door CRK tbv inkoop metselstenen		25-Feb-25	0.00
WP11.5 - BUS-melding			05-Jan-26	13-Mar-26	50.00
A1270	OG	Opstellen en aanvragen BUS-melding	05-Jan-26	09-Jan-26	5.00
A1280	OG	Proceduretermijn BUS-melding	12-Jan-26	06-Feb-26	20.00
A1282	OG	Start melding termijn BUS-melding (kort termijn)	09-Feb-26	13-Feb-26	5.00
A1285	OG	Start melding termijn BUS-melding (lang termijn)	09-Feb-26	13-Mar-26	25.00
WP11.6 - WIOR vergunning			24-Jun-25	07-Jul-25	10.00
A1950	OG	Proceduretermijn WIOR vergunning	24-Jun-25	07-Jul-25	10.00
A1960	OG	WIOR vergunning verleend		07-Jul-25	0.00
WP11.7 - Verkeersbesluit			24-Jun-25	19-Aug-25	23.00
A1300	OG	Opstellen en aanvragen Verkeersbesluit	24-Jun-25	07-Jul-25	10.00
A1310	OG	Proceduretermijn Verkeersbesluit	08-Jul-25	04-Aug-25	20.00
A1320	OG	Verkeersbesluit gereed		19-Aug-25	0.00
WP11.7 - Sloopmelding			19-Aug-25	22-Sep-25	25.00
A2010	OG	Opstellen en aanvragen sloopmelding	19-Aug-25	25-Aug-25	5.00
A2020	OG	Proceduretermijn sloopmelding	26-Aug-25	22-Sep-25	20.00
A2110	OG	Sloopmelding verleend		22-Sep-25	0.00
WP11.8 - Monitoringsplan ontwerp en uitvoering			12-Feb-25	25-Jun-25	90.00
A1330		Opstellen Monitoringsplan (OG+ON)	25-Apr-25	11-Jun-25	30.00

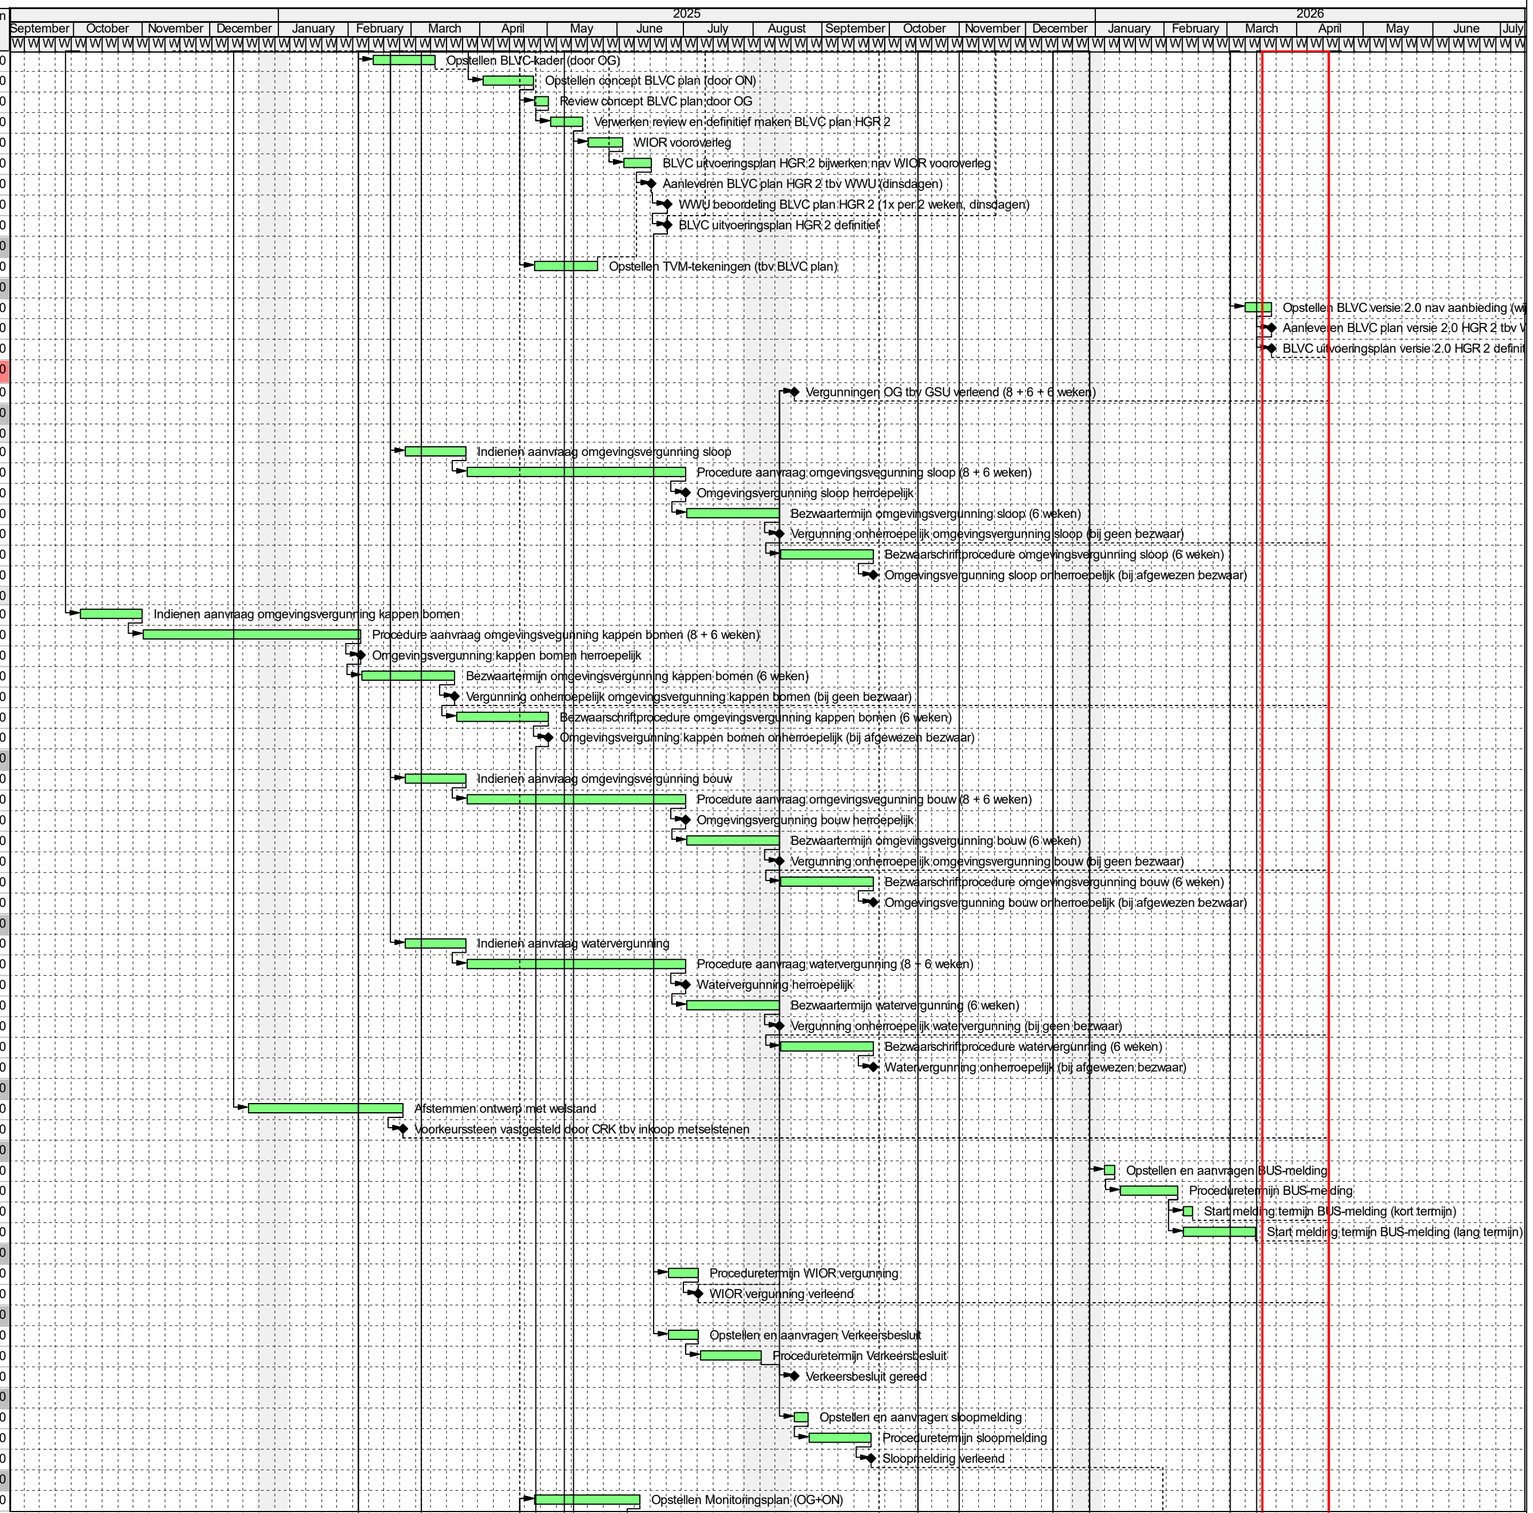

◆ Milestone
Critical Remaining Work
Actual Work
Actual Level of Effort
Remaining Level of Effort
Remaining Work

TASK filter: *SOK | No Completed Activities.

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: Herengracht 107-169 Planning tot GSU
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 24-Jun-24

Activity ID	Actiehouder	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
A1340		Beoordelen Monitoringsplan (OG+ON)	12-Jun-25	25-Jun-25	10.00
A1350		Monitoringsplan goedgekeurd (tbv input bestek)		25-Jun-25	0.00
Geluids- en trillingspredicties			12-Feb-25	24-Apr-25	50.00
A2770	ON	Opstellen geluidspredicties obv eerste concept planning (keuze uitvoeringsmethode)	12-Mar-25	24-Apr-25	30.00
A2780	ON	Startoverleg VTH tbv keuze uitvoeringsmethode	16-Apr-25	24-Apr-25	5.00
A2970	ON	Opstellen trillingspredictie obv VO	12-Feb-25	11-Mar-25	20.00
WP14 - Besluitvorming			05-Jan-26	13-Feb-26	30.00
WP14.1 - CAR verzekering			05-Jan-26	16-Jan-26	10.00
A1430	OG	Opsturen stukken naar VGA tbv CAR verzekering	05-Jan-26	16-Jan-26	10.00
A1460	OG	Indienen monitoringsplan bij VGA tbv CAR verzekering	05-Jan-26		0.00
A1470	OG	CAR verzekering gereed tbv GSU		16-Jan-26	0.00
WP14.2 - BAP toets			19-Jan-26	13-Feb-26	20.00
A1440	OG	Beheer Acceptatie Proces (BAP) toets	19-Jan-26	30-Jan-26	10.00
A1450	OG	Faseovergangsrapport (OG)	02-Feb-26	13-Feb-26	10.00
A1480	OG	Vastgesteld Uitvoeringskrediet en Uitvoeringsbesluit		13-Feb-26	0.00
WP16 - Voorbereiden ON			29-Nov-23	02-Dec-26	687.00
WP16.1 - Detail engineering			20-Oct-25	20-Oct-25	0.00
A1565	ON	UO Werkzaamheden (NTB)	20-Oct-25*		0.00
WP16.2 - Plannen en planning			12-Feb-25	22-May-26	295.00
A2610	ON	Start opstellen operationele plannen (na bestek gereed)		19-Dec-25	0.00
A2660	ON	Operationele plannen gereed voor GSU		27-Feb-26	0.00
WP16.2.1 - Operationele plannen			12-Feb-25	20-Mar-26	255.00
Opstellen Kwaliteitsplan			05-Jan-26	27-Feb-26	40.00
A2470	ON	Opstellen Kwaliteitsplan	05-Jan-26	13-Feb-26	30.00
A2480	ON	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen Kwaliteitsplan	16-Feb-26	27-Feb-26	10.00
A2490	ON	Stoppunt: Kwaliteitsplan gereed		27-Feb-26	0.00
Opstellen V&G plan uitvoering			05-Jan-26	27-Feb-26	40.00
A2500	ON	Opstellen V&G plan uitvoering	05-Jan-26	13-Feb-26	30.00
A2510	ON	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen V&G plan uitvoering	16-Feb-26	27-Feb-26	10.00
A2520	ON	Stoppunt: V&G plan uitvoering gereed		27-Feb-26	0.00
Opstellen Veiligheidsplan Art 8.7			05-Jan-26	13-Mar-26	50.00
A1640	ON	Opstellen Veiligheidsplan Art 8.7	05-Jan-26	13-Feb-26	30.00
A2450	ON	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen Veiligheidsplan Art 8.7	16-Feb-26	27-Feb-26	10.00
A2460	ON	Stoppunt: Veiligheidsplan Art 8.7 gereed		27-Feb-26	0.00
A2570	ON	Beoordelingstermijn bevoegd gezag	16-Feb-26	13-Mar-26	20.00
Opstellen Keuringsplan			05-Jan-26	26-Feb-26	39.00
A1650	ON	Opstellen en goedkeuren Keuringsplan (incl. stoppunt)	05-Jan-26	26-Feb-26	39.00
Opstellen Bemalingsplan			05-Jan-26	27-Feb-26	40.00
A1660	ON	Opstellen en goedkeuren Bemalingsplan (incl. stoppunt)	05-Jan-26	27-Feb-26	40.00
Opstellen Stabiliteitsberekeningen			05-Jan-26	20-Mar-26	55.00
A2530	ON	Opstellen Stabiliteitsberekeningen	05-Jan-26	13-Feb-26	30.00
A2540	ON	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen Stabiliteitsberekeningen	16-Feb-26	27-Feb-26	10.00
A2550	ON	Stoppunt: Stabiliteitsberekeningen gereed		27-Feb-26	0.00
A2590	ON	Toetstermijn Stabiliteitsberekeningen bevoegd gezag	02-Mar-26	20-Mar-26	15.00
Opstellen Vaarwegmanagementplan			12-Feb-25	02-Jul-25	95.00
A2555		Afstemmen werkwijze en fasering met Nautisch Beheer	12-Feb-25	25-Mar-25	30.00
A2560	ON	Opstellen Vaarwegmanagementplan + afstemmen vaarwegbeheerder	19-May-25	02-Jul-25	30.00
A2580	ON	Stoppunt: Vaarwegmanagementplan gereed		02-Jul-25	0.00
Opstellen Ecologisch werkprotocol			05-Jan-26	26-Feb-26	39.00
A1800	ON	Opstellen en goedkeuren Ecologisch werkprotocol (incl. stoppunt)	05-Jan-26	26-Feb-26	39.00
WP16.2.2 - Opstellen werkplannen			07-Nov-25	22-May-26	125.00
A2400	ON	Start opstellen werkplannen (na NOK realisatie gereed)		20-Mar-26	0.00
A2600	ON	Start opstellen werkplannen (na review op bestek)		07-Nov-25	0.00
A2650	ON	Werkplannen gereed tbv GSU		16-Jan-26	0.00
WPL01 Aanbrengen en verwijderen damwanden			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
A1700	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Aanbrengen en verwijderen damwanden	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WPL02 Boorpalen			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
A1710	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Boorpalen	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WPL04 IHWG Betonconstructies incl. stortplan			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
A1790	ON	Opstellen en goedkeuren WPL IHWG Betonconstructies incl stortplan	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WPL05 Productieplan incl. transport en montageplan betonconstructies			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
A2620	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Productieplan incl. transport en montageplan betonconstructies	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WPL06 Metselwerk			23-Mar-26	22-May-26	40.00
A1720	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Metselwerk	23-Mar-26	22-May-26	40.00
WPL07 Grondwerk			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
A1730	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Grondwerk	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WPL08 Riolering			23-Mar-26	22-May-26	40.00
A1740	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Riolering	23-Mar-26	22-May-26	40.00
WPL09 Straatwerk			23-Mar-26	22-May-26	40.00
A1750	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Straatwerk	23-Mar-26	22-May-26	40.00
WPL13 Vrijkomende materialen			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
A1760	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Vrijkomende materialen	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WPL15 Sloopwerk incl. WPL cf. Art. 41.14.03			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00

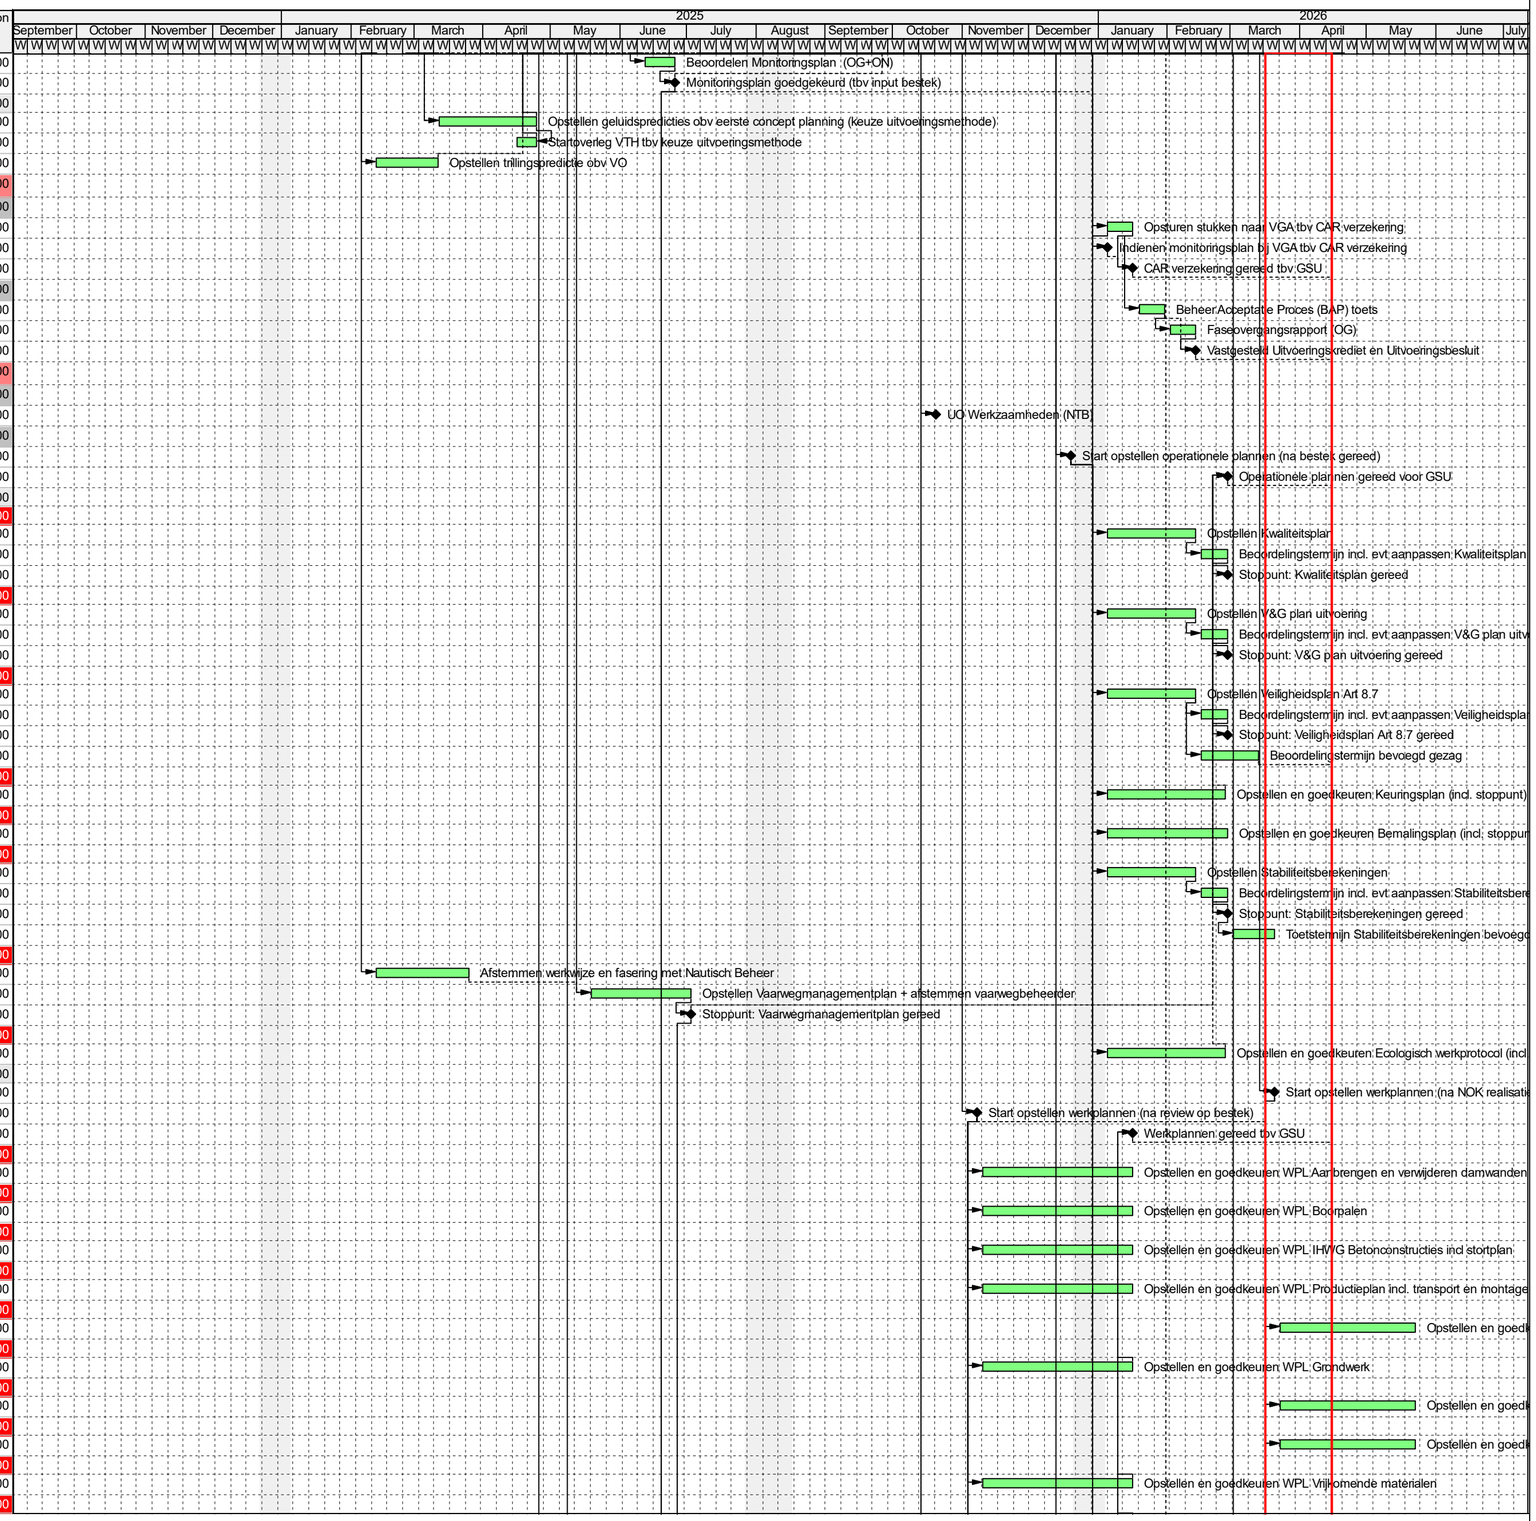

◆ Milestone
Critical Remaining Work
Actual Work
Actual Level of Effort
Remaining Level of Effort
Remaining Work

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: Herengracht 107-169 Planning tot GSU
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 24-Jun-24

Activity ID	Actiehouder	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
A1770	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Sloopwerk incl. WPL cf. ART. 41.14.03	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WPL16 Omgang verontreinigd water en grond			10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
A1780	ON	Opstellen en goedkeuren WPL Omgang verontreinigd water en grond	10-Nov-25	16-Jan-26	40.00
WP16.3 - Inkoop			20-Oct-25	02-Dec-26	260.00
WP16.3.1 - Inkoop damwanden			20-Oct-25	20-Mar-26	100.00
A1810	ON	Inkoopprocedure damwanden	20-Oct-25	14-Nov-25	20.00
A1820	ON	Levertijd damwanden	17-Nov-25	20-Mar-26	80.00
WP16.3.2 - Inkoop boorpalen (incl. boorpunten)			20-Oct-25	20-Mar-26	100.00
A1830	ON	Inkoopprocedure boorpalen (incl. boorpunten)	20-Oct-25	14-Nov-25	20.00
A1840	ON	Levertijd boorpalen (incl. boorpunten)	17-Nov-25	20-Mar-26	80.00
WP16.3.3 - Inkoop wapening			23-Mar-26	06-Jul-26	70.00
A1850	ON	Inkoopprocedure wapening	23-Mar-26	21-Apr-26	20.00
A1860	ON	Levertijd wapening	22-Apr-26	06-Jul-26	50.00
WP16.3.4 - Inkoop metselstenen			22-Apr-26	20-Nov-26	132.00
A1870	ON	Inkoopprocedure metselstenen	22-Apr-26	22-May-26	20.00
A1880	ON	Levertijd metselstenen	25-May-26	20-Nov-26	130.00
WP16.3.5 - Inkoop maaiveldinrichting			23-Mar-26	09-Sep-26	100.00
A1890	ON	Inkoopprocedure maaiveldinrichting	23-Mar-26	07-May-26	30.00
A1900	ON	Levertijd maaiveldinrichting	08-May-26	09-Sep-26	70.00
WP16.3.6 - Inkoop natuurstenen dekstenen			22-Apr-26	02-Dec-26	140.00
A1910	ON	Inkoopprocedure natuurstenen dekstenen	22-Apr-26	07-May-26	10.00
A1920	ON	Levertijd natuurstenen dekstenen	08-May-26	02-Dec-26	130.00
WP16.3.7 - Inkoop bomengrond			22-Apr-26	23-Sep-26	90.00
A1930	ON	Inkoopprocedure bomengrond	22-Apr-26	22-May-26	20.00
A1940	ON	Levertijd bomengrond	26-May-26	23-Sep-26	70.00
WP16.3.8 - Inkoop betonwerk			22-Apr-26	09-Sep-26	80.00
A2810	ON	Inkoopprocedure betonwerk	22-Apr-26	07-May-26	10.00
A2820	ON	Levertijd betonwerk	08-May-26	09-Sep-26	70.00
WP16.3.9 - Inkoop dekstenen			22-Apr-26	09-Sep-26	80.00
A2830	ON	Inkoopprocedure dekstenen	22-Apr-26	07-May-26	10.00
A2840	ON	Levertijd dekstenen	08-May-26	09-Sep-26	70.00
WP16.3.10 - Inkoop onderaanneming maaiveldinrichting			22-Apr-26	12-Aug-26	60.00
A2850	ON	Inkoopprocedure onderaanneming maaiveldinrichting	22-Apr-26	08-Jun-26	30.00
A2860	ON	Overeenkomst sluiten onderaanneming maaiveldinrichting	09-Jun-26	12-Aug-26	30.00
WP16.3.11 - Inkoop onderaanneming riolering			22-Apr-26	12-Aug-26	60.00
A2870	ON	Inkoopprocedure onderaanneming riolering	22-Apr-26	08-Jun-26	30.00
A2880	ON	Overeenkomst sluiten onderaanneming riolering	09-Jun-26	12-Aug-26	30.00
WP16.3.12 - Inkoop sloopwerk			22-Apr-26	12-Aug-26	60.00
A2940	ON	Inkoopprocedure onderaanneming sloopwerk	22-Apr-26	08-Jun-26	30.00
A2950	ON	Overeenkomst sluiten onderaanneming sloopwerk	09-Jun-26	12-Aug-26	30.00
WP16.4 - Vergunningen (VOTBM) ON			29-Nov-23	20-Mar-26	527.00
A2229	ON	Start aanvragen vergunningen ON		19-Dec-25	0.00
A2230	ON	Vergunningen ON tbv GSU verleend		06-Feb-26	0.00
WP16.4.1 - Objectenvergunning			05-Jan-26	16-Jan-26	10.00
A2730	ON	Opstellen en aanvragen objectenvergunning bouwplaatsinrichting	05-Jan-26	09-Jan-26	5.00
A2740	ON	Procedure termijn objectenvergunning bouwplaatsinrichting	12-Jan-26	16-Jan-26	5.00
A2750	ON	Objectenvergunning bouwplaatsinrichting verleend		16-Jan-26	0.00
WP16.4.2 - Ontheffing geluidhinder			26-Jun-25	22-Aug-25	25.00
A1970	ON	Opstellen en aanvragen ontheffing geluidhinder	26-Jun-25	02-Jul-25	5.00
A1980	ON	Procedure termijn ontheffing geluidhinder	03-Jul-25	22-Aug-25	20.00
A2090	ON	Geluidsontheffing verleend		22-Aug-25	0.00
WP16.4.3 - Ontheffing trillen			26-Jun-25	22-Aug-25	25.00
A1990	ON	Opstellen en aanvragen ontheffing trillen	26-Jun-25	02-Jul-25	5.00
A2000	ON	Procedure termijn ontheffing trillen	03-Jul-25	22-Aug-25	20.00
A2100	ON	Ontheffing trillen verleend		22-Aug-25	0.00
WP16.4.5 - BLBI meldingen			05-Jan-26	06-Feb-26	25.00
A2030	ON	Opstellen en aanvragen BLBI meldingen	05-Jan-26	09-Jan-26	5.00
A2040	ON	Procedure termijn BLBI meldingen	12-Jan-26	06-Feb-26	20.00
A2120	ON	BLBI meldingen verleend		06-Feb-26	0.00
WP16.4.6 - Tijdelijke Verkeers Maatregelen			09-Mar-26	20-Mar-26	10.00
A2910	ON	Procedure tijd aanvragen TVM's (obv mondelinge overeenkomst NOK Realisatie)	09-Mar-26	20-Mar-26	10.00
WP16.4.7 - Aanvragen bouwaansluiting			29-Nov-23	23-Aug-24	160.00
A2900	ON	Aanvraagperiode bouwaansluiting	29-Nov-23	23-Aug-24	160.00
WP16.5 - Vaarweg- en wegmanagment			03-Jul-25	24-Sep-25	43.00
WP16.5.1 - Nautische ontheffingen			03-Jul-25	24-Sep-25	43.00
A2150	ON	Procedure termijn Nautische ontheffingen	03-Jul-25	27-Aug-25	40.00
A2160	ON	Nautische ontheffingen verleend		27-Aug-25	0.00
A2630	ON	Inkoop Nautische bebording en plaatsen bebording	28-Aug-25	10-Sep-25	10.00
A2640	ON	Vooraankondigingstermijn Nautische bebording	11-Sep-25	24-Sep-25	10.00
WP17 - Uitvoering derden			02-May-25	16-Jul-25	50.00
WP17.1 - Uitvoering K&L			15-May-25	16-Jun-25	20.00
A2960		Werkzaamheden mbt kast Liander (werkzaamheden NTB vóór of tijdens uitvoering)	15-May-25	16-Jun-25	20.00
WP17.2 - Uitvoering bomen			02-May-25	16-Jul-25	50.00

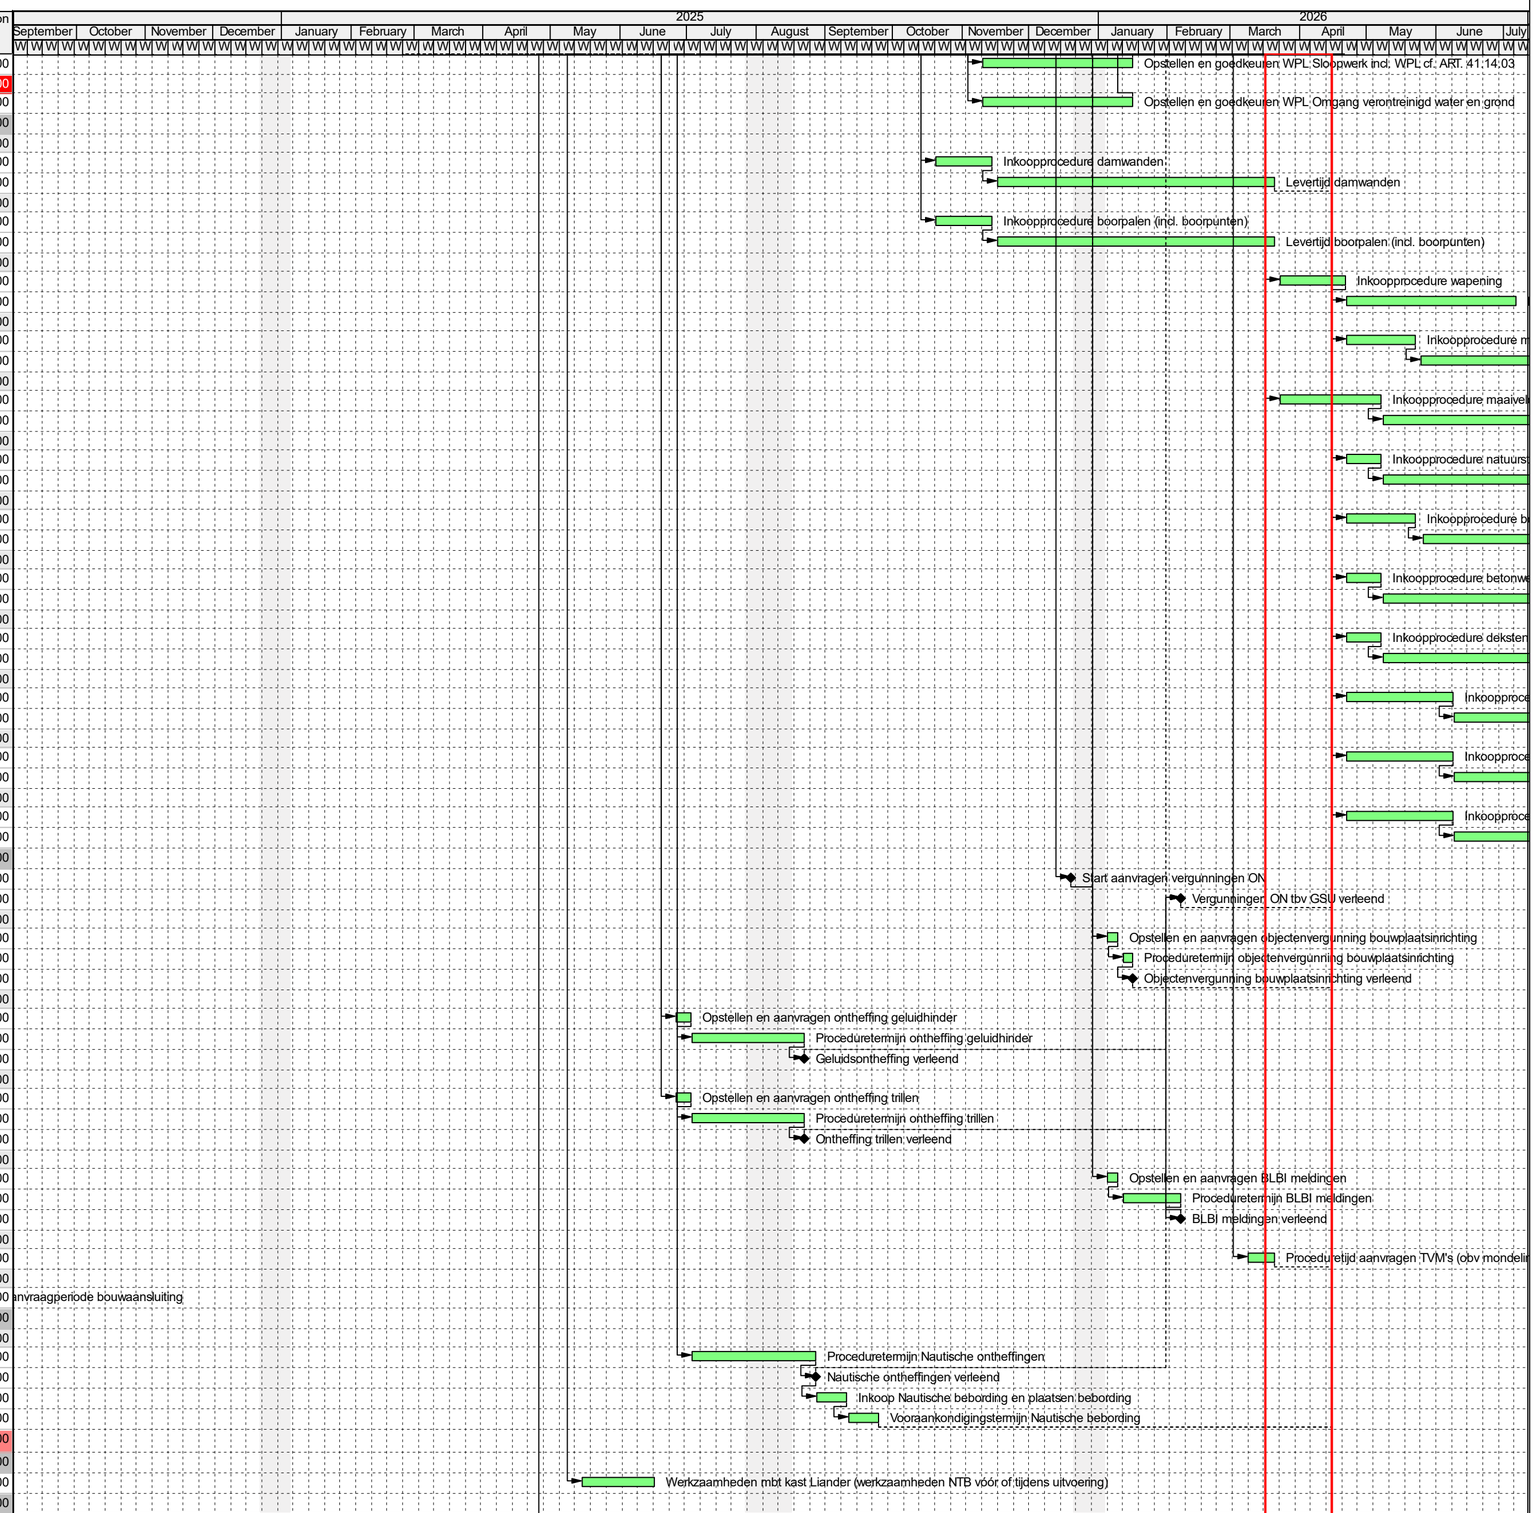

◆ Milestone
Critical Remaining Work
Actual Work
Actual Level of Effort
Remaining Level of Effort
Remaining Work

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: Herengracht 107-169 Planning tot GSU
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 24-Jun-24

Activity ID	Actiehouder	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
A2165	OG	Opdrachtverlening en voorbereiding groenaannemer	02-May-25	02-Jul-25	40.00
A2170	OG	Kappen/verplanten bomen HGR 2 (kappen tussen 1 okt en 1 mrt)	03-Jul-25	16-Jul-25	10.00
WP18 - Uitvoering ON			23-Mar-26	27-Sep-27	340.00
A2175		Voorbereidede werkzaamheden (afroepen mensen en materieel etc.) na overeenkomen NOK Realis	23-Mar-26	21-Apr-26	20.00
A2180	ON	GSU HGR 2	22-Apr-26		0.00
A2185	ON	Inrichten bouwplaats en mobiliseren materieel	22-Apr-26	22-May-26	20.00
A2195		Uitvoering HGR 2 (uitvoeringsduur NTB)	26-May-26	27-Sep-27	300.00



Milestone
Critical Remaining Work
Actual Work
Actual Level of Effort
Remaining Level of Effort
Remaining Work

TASK filter: *SOK | No Completed Activities.

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: Herengracht 107-169 Planning tot GSU
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
