Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 01-Dec-23

Activity ID	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
Herengracht 107-169 Planning tot GSU		29-Nov-23 A	24-Nov-26	705.00
Referentie mijlpalen		23-Jan-25	20-Aug-25	125.00
A2700	MIJLPAAL: Concept bestek gereed		23-Jan-25	0.00
A2710	MIJLPAAL: Definitief bestek gereed		03-Apr-25	0.00
A2720	MIJLPAAL: GSU HGR 2		20-Aug-25	0.00
A2760	MIJLPAAL: NOK Realisatie overeengekomen		27-Jun-25	0.00
WP8 - DO Maaiveld		22-Jan-24	29-Aug-24	138.00
A2665	Stakeholderanalyse en opstellen KES	22-Jan-24	01-Mar-24	30.00
A2670	Opstellen en vastellen definitief Stedebouwkundig ontwerp	04-Mar-24	16-May-24	50.00
A2680	Uitwerken technisch maaiveldontwerp	06-Jun-24	17-Jul-24	30.00
A2690	Review en vaststellen definitief maaiveldontwerp	18-Jul-24	29-Aug-24	15.00
WP9 - Ontwerp, bestek en NOK Realisatie		29-Nov-23 A	27-Jun-25	365.00
WP9.0 - Conditionering en review stukken		29-Nov-23 A	16-Apr-24	87.00
A2980	Verzamelen reeds uitgevoerde onderzoeken	29-Nov-23 A	08-Dec-23	10.00
A2990	Toets geldigheid en volledigheid van onderzoeken en beschikbare documentatie (ON)	11-Dec-23	19-Jan-24	19.00
A3000	Uitvoeren aanvullende onderzoeken tbv benodigde informatie voor opstellen ontwerp (OG+ON)	22-Jan-24	16-Apr-24	60.00
WP9.1 - Voorlopig ontwerp		22-Jan-24	05-Jun-24	93.00
A1000	Opstellen Voorlopig Ontwerp HGR 2 incl Ontwerpnotitie en Variantenstudie	22-Jan-24	05-Apr-24	53.00
A1001	Review Voorlopig Ontwerp (gem Ams + BeensCC)	08-Apr-24	26-Apr-24	15.00
A1011	Vaststellen Voorlopig Ontwerp i.o.m. gemeente Amsterdam	29-Apr-24	22-May-24	15.00
A3120	VO-kostenraming (SSK) opstellen	23-May-24	05-Jun-24	10.00
A3130	Voorlopig Ontwerp vastgesteld incl. SSK-raming		05-Jun-24	0.00
WP9.2 - Definitief ontwerp		06-Jun-24	07-Nov-24	95.00
A1002	Opstellen Definitief Ontwerp (DO) HGR 2 incl Ontwerpnotitie	06-Jun-24	05-Sep-24	50.00
A1005	Review Definitief Ontwerp (gem Ams + BeensCC)	06-Sep-24	03-Oct-24	20.00
A1015	Vaststellen Definitief Ontwerp i.o.m. gemeente Amsterdam	04-Oct-24	24-Oct-24	15.00
A1025	DO-kostenraming (SSK) opstellen	25-Oct-24	07-Nov-24	10.00
A1035	Definitief Ontwerp vastgesteld incl. SSK-raming		07-Nov-24	0.00
WP9.3 - Bestek		08-Nov-24	03-Apr-25	95.00
A1560	Bestek HGR 2 schrijven	08-Nov-24	19-Dec-24	30.00
A1600	Bestekstekeningen opstellen o.b.v. DO incl hoeveelheden verwerken in deel 2.2	20-Dec-24	23-Jan-25	15.00
A2255	Concept bestek HGR 2 gereed		23-Jan-25	0.00
A2260	Review bestek door IPM & specialisten (OG)	24-Jan-25	06-Feb-25	10.00
A2261	Opstellen NVI door BeensCC obv concept bestek (ON)	24-Jan-25	06-Feb-25	10.00
A2270	Verwerken feedback uit review IPM & specialisten en BeensCC (OG) (tot bestek 1.0)	07-Feb-25	20-Feb-25	10.00
A2271	Opstellen NVI ronde 2 door BeensCC obv bestek 1.0	21-Feb-25	06-Mar-25	10.00
A2272	Verwerken feedback uit NVI ronde 2 en uit BLVC plan (OG) (tot definitief bestek)	07-Mar-25	13-Mar-25	5.00
A2280	Toets ABT op defintitief bestek (OG)	14-Mar-25	27-Mar-25	10.00
A2290	Review verwerken en afstemming met ABT (OG)	28-Mar-25	03-Apr-25	5.00
A2300	Definitief bestek HGR 2 gereed		03-Apr-25	0.00
WP15.8 - NOK Realisatie		29-Apr-24	27-Jun-25	270.00
A1550	Start calculatieperiode bestek HGR 2	04-Apr-25		0.00
A2310	Opstellen concept aanbieding door BeensCC obv definitief bestek	04-Apr-25	28-Apr-25	15.00
A2320	Bespreken en beoordeling concept aanbieding BeensCC+OG	29-Apr-25	06-May-25	5.00
A2330	Opstellen definitieve aanbieding door BeensCC	07-May-25	27-May-25	15.00
A2340	Bespreken en beoordeling definitieve aanbieding BeensCC+OG	28-May-25	05-Jun-25	5.00
A2350	Aanvullende afstemming kostenraming definitieve aanbieding	06-Jun-25	13-Jun-25	5.00
A2360	Akkoord lead-buyer en AOG	16-Jun-25	27-Jun-25	10.00
A2370	NOK Realisatie overeengekomen		27-Jun-25	0.00
Werkvoorbereiding tbv overeenkomen NOK Realisatie		23-May-24	27-May-25	235.00
A2782	Opstellen eerste concept uitvoeringsplanning en fasering (LEAN-weekniveau)	23-May-24	19-Jun-24	20.00
A2790	Opstellen Uitvoeringsplanning incl. materieelinzet tbv concept aanbieding	21-Feb-25	27-Mar-25	25.00
A2795	Aanpassen en updaten Uitvoeringsplanning tbv definitieve aanbieding	07-May-25	27-May-25	15.00
A2800	Opstellen Risicodossier tbv conceptaanbieding	20-Dec-24	20-Feb-25	35.00
A2890	Aanpassen en updaten Risciodosser tbv definitieve aanbieiding	07-May-25	27-May-25	15.00
Bouwplaatsinrichtingstekeningen		29-Apr-24	17-Apr-25	225.00
A2920	Opstellen bouwplaatsinrichtingstekeningen en stappenplan	20-Jun-24	10-Jul-24	15.00
A2925	Aanpassen en updaten bouwpaatsinrichtingstekeningen en stappenplan	28-Mar-25	17-Apr-25	15.00
A2930	Opstellen faseringstekeningen (doorsnedes) (VO)	29-Apr-24	12-Jun-24	30.00
WP15 - Contract (NOK voorbereiding en NOK Inkoop Staal)		08-Nov-24	30-Jan-25	50.00
WP15.7 - NOK Inkoop staal		08-Nov-24	30-Jan-25	50.00
A2405	Uitvraag NOK Inkoop staal door OG	08-Nov-24*	21-Nov-24	10.00
A2410	Opstellen offerte NOK Inkoop staal door ON	22-Nov-24	19-Dec-24	20.00
A2420	Beoordeling offerte NOK Inkoop staal door OG + evt. aanpassingen	20-Dec-24	30-Jan-25	20.00
A2430	NOK Inkoop staal gereed		30-Jan-25	0.00
WP10 - Wenstracé procedure		11-Dec-23	14-May-25	328.00
A1040	Tracé Akkoord Procedure inclusief afstemmen met (K&L) nutsbeheerders	11-Dec-23*	06-Dec-24	260.00
A1620	K&L werkvoorbereiding	09-Dec-24	14-May-25	100.00
WP16.2.21 - BLVC		23-May-24	27-Jun-25	255.00
BLVC versie 1.0		23-May-24	15-Oct-24	88.00
A1348	Opstellen BLVC-kader (door OG)	23-May-24	19-Jun-24	20.00

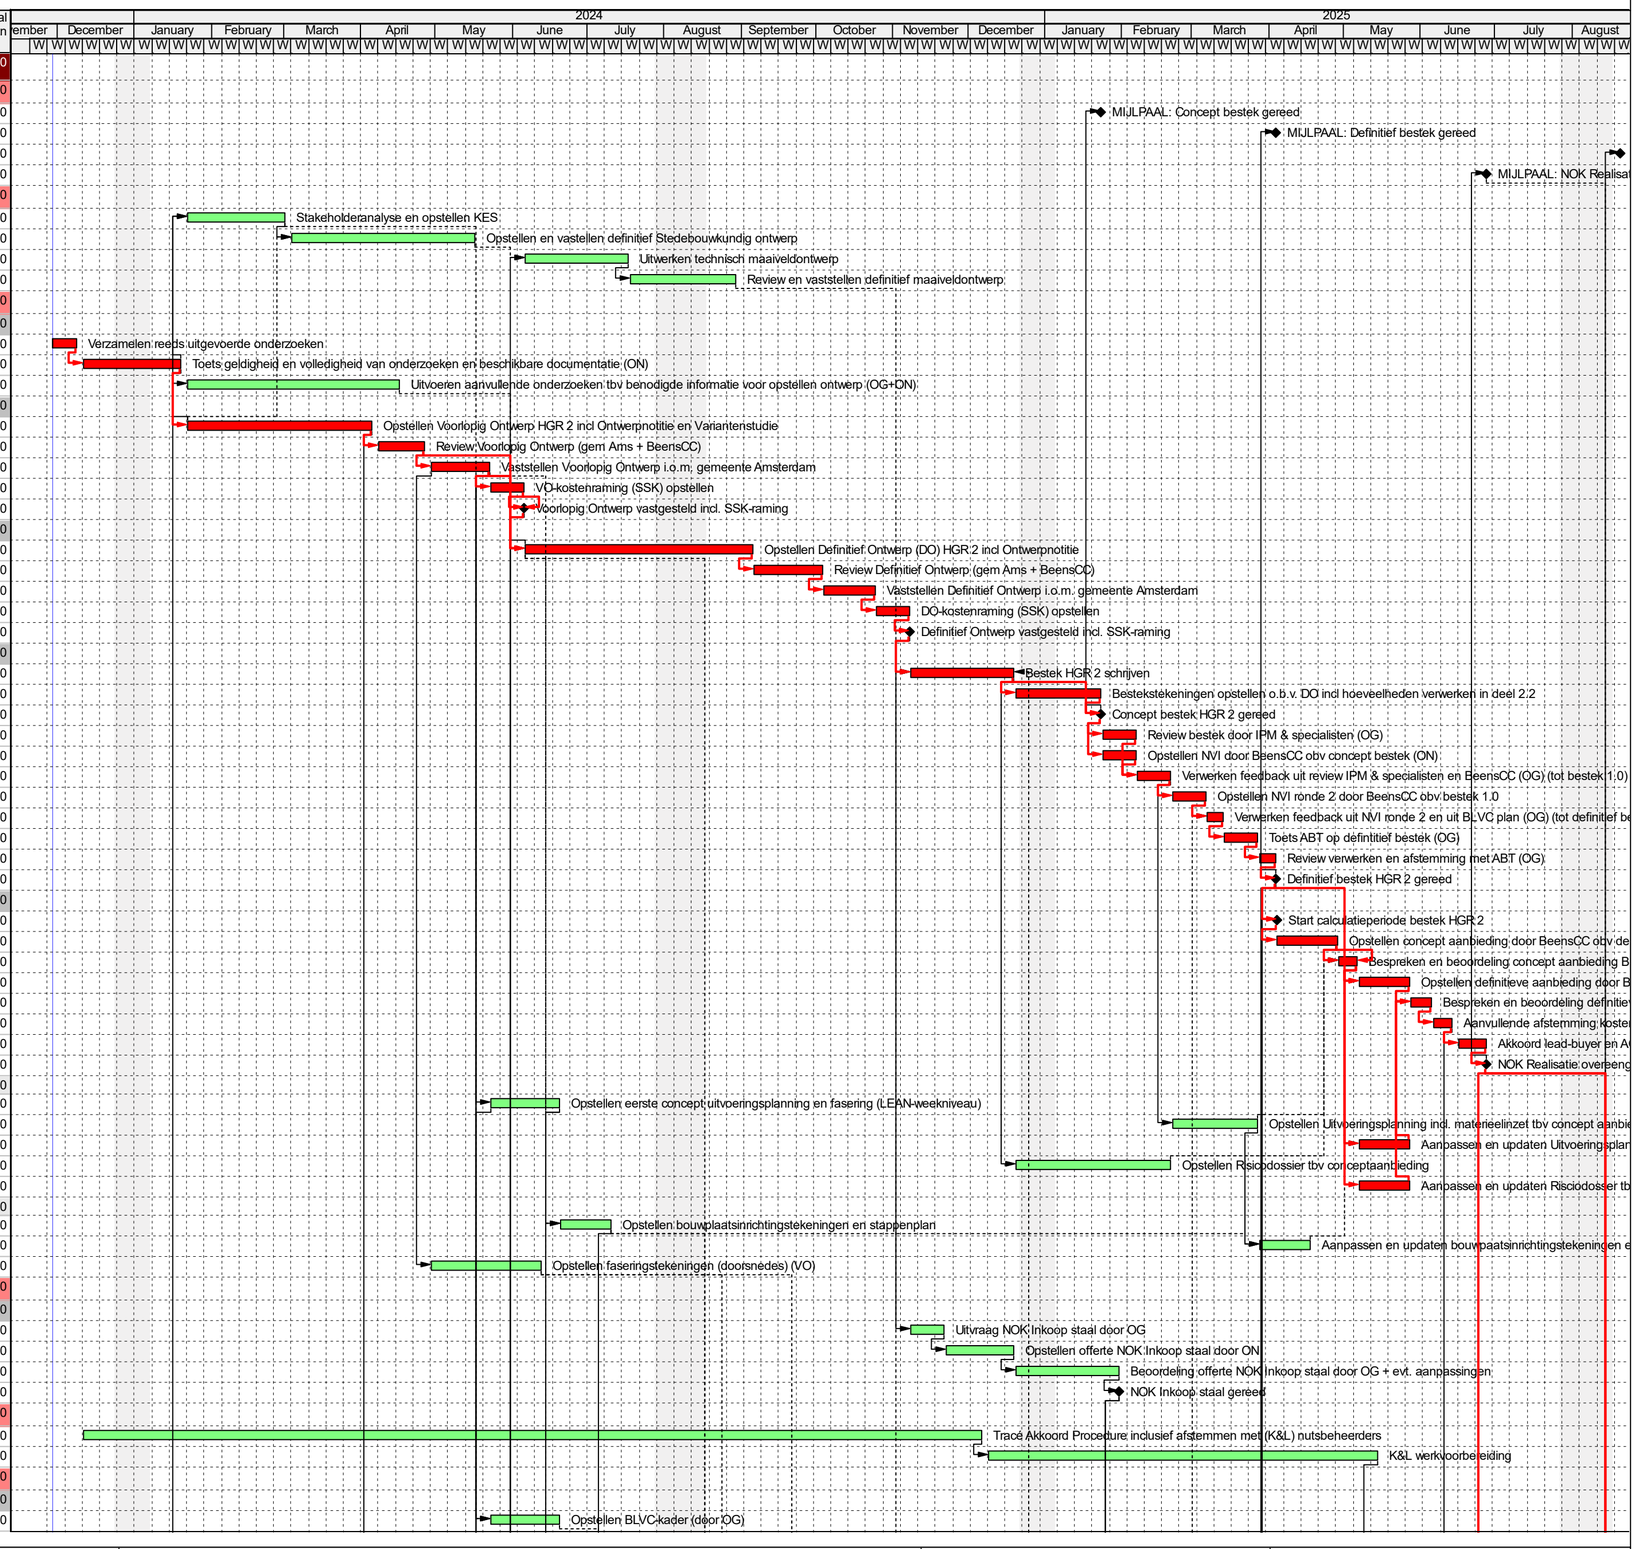

◆ Milestone
Remaining Work
Critical Remaining Work
Actual Work

TASK filter: *SOK | No Completed Activities.

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: Herengracht 107-169 Planning tot GSU
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 01-Dec-23

Activity ID	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
A1351	Opstellen concept BLVC plan (door ON)	11-Jul-24	22-Aug-24	15.00
A1352	Review concept BLVC plan door OG	23-Aug-24	29-Aug-24	5.00
A1360	Verwerken review en definitief maken BLVC plan HGR 2	30-Aug-24	12-Sep-24	10.00
A1370	WIOR vooroverleg	13-Sep-24	26-Sep-24	10.00
A1380	BLVC uitvoeringsplan HGR 2 bijwerken nav WIOR vooroverleg	27-Sep-24	08-Oct-24	8.00
A1390	Aanleveren BLVC plan HGR 2 tbv WWU (dinsdagen)		08-Oct-24	0.00
A1400	WWU beoordeling BLVC plan HGR 2 (1x per 2 weken, dinsdagen)		15-Oct-24	0.00
A1420	BLVC uitvoeringsplan HGR 2 definitief		15-Oct-24	0.00
TVM-tekeningen (tbv BLVC)		23-Aug-24	19-Sep-24	20.00
A3110	Opstellen TVM-tekeningen (tbv BLVC plan)	23-Aug-24	19-Sep-24	20.00
BLVC versie 2.0		16-Jun-25	27-Jun-25	10.00
A3010	Opstellen BLVC versie 2.0 nav aanbieding (wijzigingen/optimalisaties)	16-Jun-25	27-Jun-25	10.00
A3020	Aanleveren BLVC plan versie 2.0 HGR 2 tbv WWU (dinsdagen)		27-Jun-25	0.00
A3030	BLVC uitvoeringsplan versie 2.0 HGR 2 definitief btv uitvoering		27-Jun-25	0.00
WP11 - Vergunningen OG		22-Jan-24	12-Jun-25	327.00
A2210	Vergunningen OG tbv GSU verleend (8 + 6 + 6 weken)		20-Nov-24	0.00
WP11.1 - Omgevingsvergunningen (sloop)		22-Jan-24	01-Jan-25	219.00
Omgevingsvergunning sloop (kadewerkzaamheden)		06-Jun-24	01-Jan-25	126.00
A1130	Indienen aanvraag omgevingsvergunning sloop	06-Jun-24	03-Jul-24	20.00
A1140	Procedure aanvraag omgevingsvegunning sloop (8 + 6 weken)	04-Jul-24	09-Oct-24	70.00
A1150	Omgevingsvergunning sloop herroepelijk		09-Oct-24	0.00
A1160	Bezwaartermijn omgevingsvergunning sloop (6 weken)	10-Oct-24	20-Nov-24	30.00
A1170	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning sloop (bij geen bezwaar)		20-Nov-24	0.00
A1180	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning sloop (6 weken)	21-Nov-24	01-Jan-25	30.00
A1190	Omgevingsvergunning sloop onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		01-Jan-25	0.00
Omgevingsvergunning sloop (kapvergunning bomen)		22-Jan-24	16-Aug-24	130.00
A3040	Indienen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen	22-Jan-24	16-Feb-24	20.00
A3050	Procedure aanvraag omgevingsvegunning kappen bomen (8 + 6 weken)	19-Feb-24	24-May-24	70.00
A3060	Omgevingsvergunning kappen bomen herroepelijk		24-May-24	0.00
A3070	Bezwaartermijn omgevingsvergunning kappen bomen (6 weken)	27-May-24	05-Jul-24	30.00
A3080	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning kappen bomen (bij geen bezwaar)		05-Jul-24	0.00
A3090	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning kappen bomen (6 weken)	08-Jul-24	16-Aug-24	30.00
A3100	Omgevingsvergunning kappen bomen onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		16-Aug-24	0.00
WP11.2 - Omgevingsvergunning (bouw)		06-Jun-24	01-Jan-25	126.00
A1060	Indienen aanvraag omgevingsvergunning bouw	06-Jun-24	03-Jul-24	20.00
A1070	Procedure aanvraag omgevingsvegunning bouw (8 + 6 weken)	04-Jul-24	09-Oct-24	70.00
A1080	Omgevingsvergunning bouw herroepelijk		09-Oct-24	0.00
A1090	Bezwaartermijn omgevingsvergunning bouw (6 weken)	10-Oct-24	20-Nov-24	30.00
A1100	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning bouw (bij geen bezwaar)		20-Nov-24	0.00
A1110	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning bouw (6 weken)	21-Nov-24	01-Jan-25	30.00
A1120	Omgevingsvergunning bouw onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		01-Jan-25	0.00
WP11.3 - Watervergunning		06-Jun-24	01-Jan-25	126.00
A1200	Indienen aanvraag watervergunning	06-Jun-24	03-Jul-24	20.00
A1210	Procedure aanvraag watervergunning (8 + 6 weken)	04-Jul-24	09-Oct-24	70.00
A1220	Watervergunning herroepelijk		09-Oct-24	0.00
A1230	Bezwaartermijn watervergunning (6 weken)	10-Oct-24	20-Nov-24	30.00
A1240	Vergunning onherroepelijk watervergunning (bij geen bezwaar)		20-Nov-24	0.00
A1250	Bezwaarschriftprocedure watervergunning (6 weken)	21-Nov-24	01-Jan-25	30.00
A1260	Watervergunning onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		01-Jan-25	0.00
WP11.4 - Traject welstandscommissie en CRK		08-Apr-24	05-Jun-24	40.00
A2215	Afstemmen ontwerp met welstand	08-Apr-24	05-Jun-24	40.00
A2220	Voorkeurssteen vastgesteld door CRK tbv inkoop metselstenen		05-Jun-24	0.00
WP11.5 - BUS-melding		04-Apr-25	12-Jun-25	44.00
A1270	Opstellen en aanvragen BUS-melding	04-Apr-25	10-Apr-25	5.00
A1280	Proceduretermijn BUS-melding	11-Apr-25	08-May-25	20.00
A1282	Start melding termijn BUS-melding (kort termijn)	09-May-25	15-May-25	5.00
A1285	Start melding termijn BUS-melding (lang termijn)	09-May-25	12-Jun-25	25.00
WP11.6 - WIOR vergunning		16-Oct-24	29-Oct-24	10.00
A1950	Proceduretermijn WIOR vergunning	16-Oct-24	29-Oct-24	10.00
A1960	WIOR vergunning verleend		29-Oct-24	0.00
WP11.7 - Verkeersbesluit		16-Oct-24	26-Nov-24	30.00
A1300	Opstellen en aanvragen Verkeersbesluit	16-Oct-24	29-Oct-24	10.00
A1310	Proceduretermijn Verkeersbesluit	30-Oct-24	26-Nov-24	20.00
A1320	Verkeersbesluit gereed		26-Nov-24	0.00
WP11.7 - Sloopmelding		21-Nov-24	08-Jan-25	25.00
A2010	Opstellen en aanvragen sloopmelding	21-Nov-24	27-Nov-24	5.00
A2020	Proceduretermijn sloopmelding	28-Nov-24	08-Jan-25	20.00
A2110	Sloopmelding verleend		08-Jan-25	0.00
WP11.8 - Monitoringsplan ontwerp en uitvoering		23-May-24	17-Oct-24	90.00
A1330	Opstellen Monitoringsplan (OG+ON)	23-Aug-24	03-Oct-24	30.00
A1340	Beoordelen Monitoringsplan (OG+ON)	04-Oct-24	17-Oct-24	10.00
A1350	Monitoringsplan goedgekeurd (tbv input bestek)		17-Oct-24	0.00

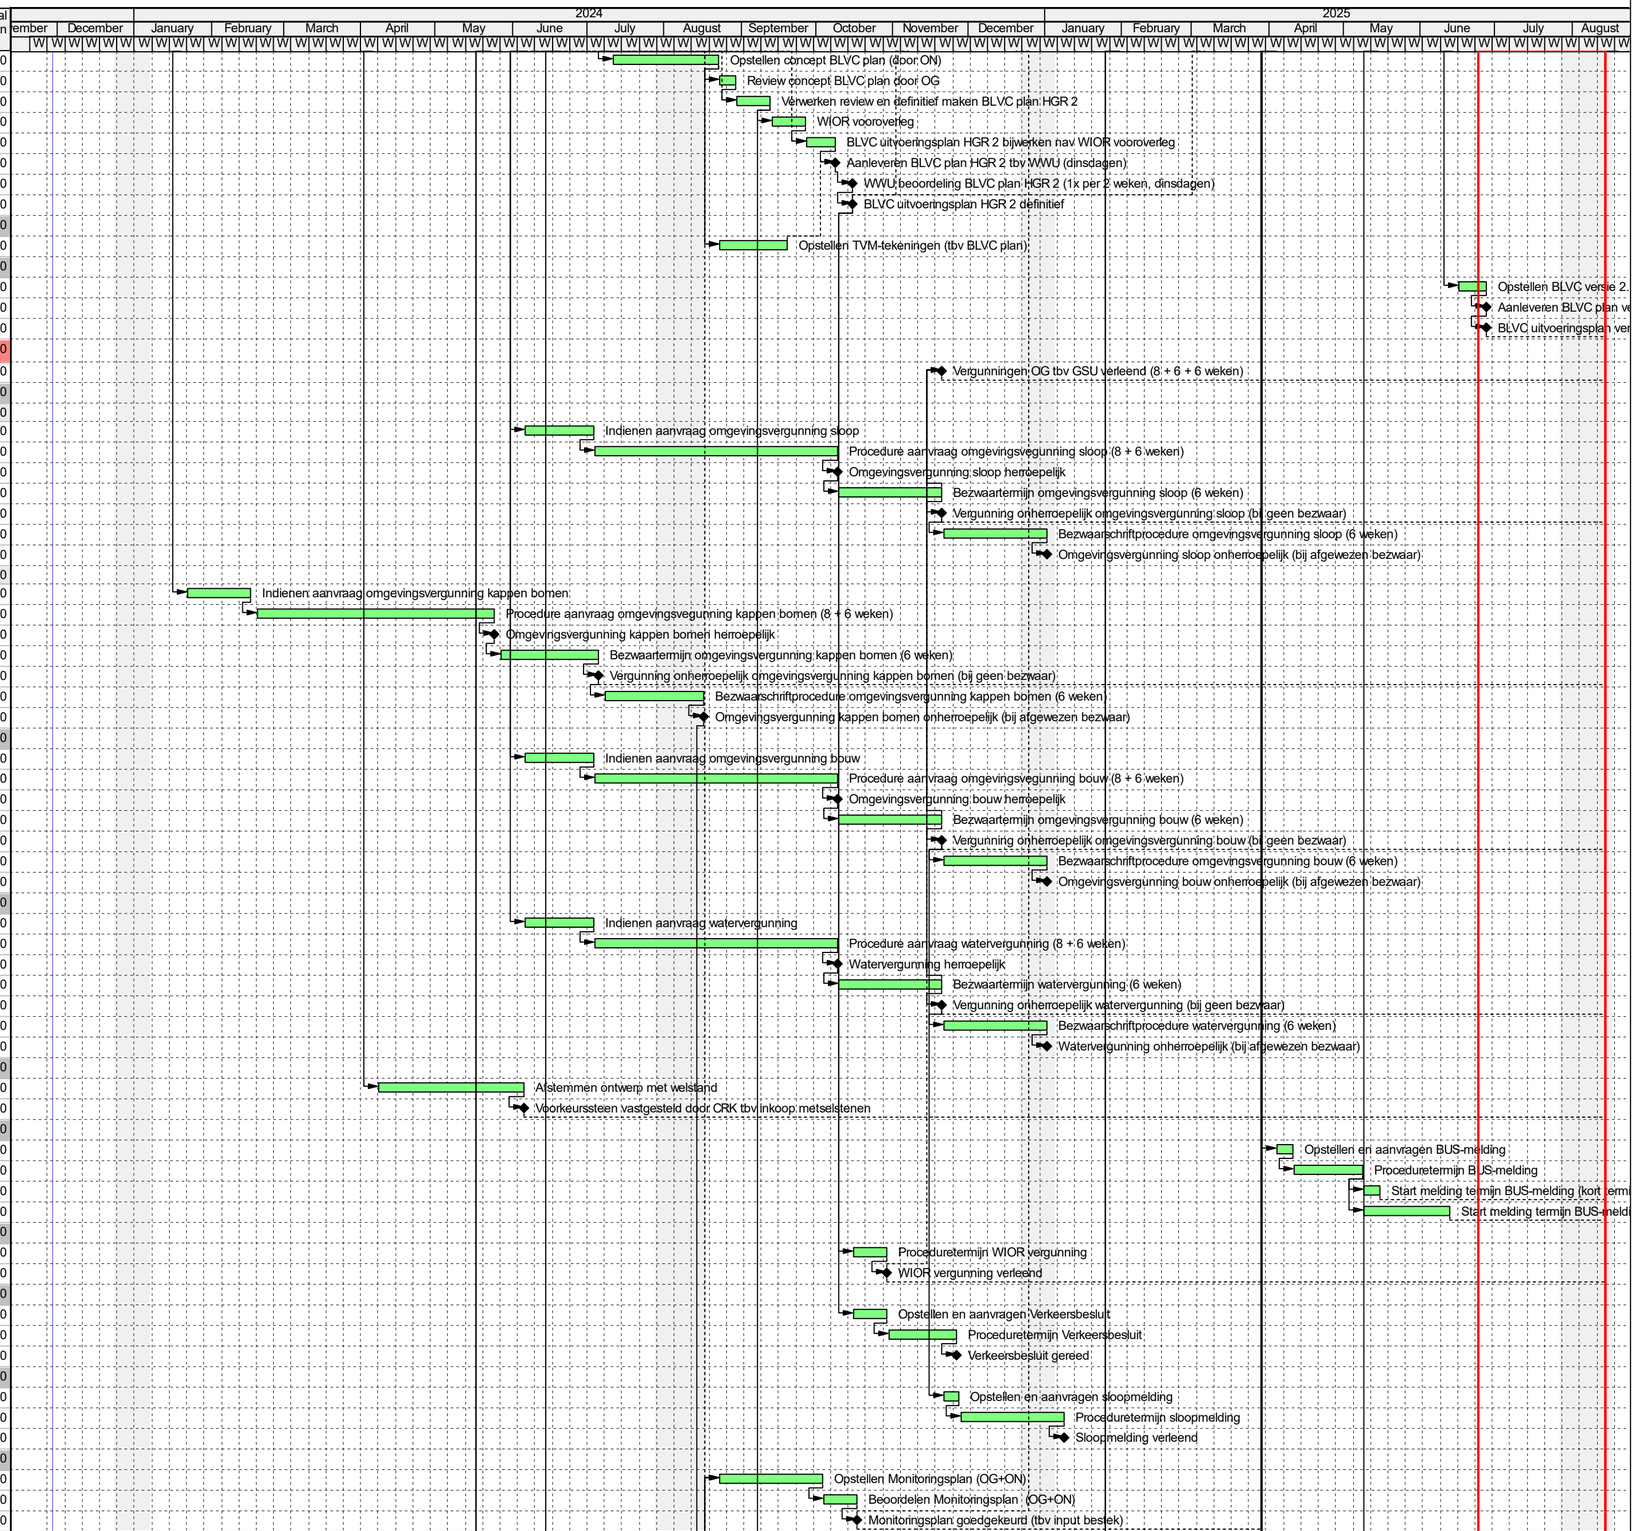

◆ Milestone
Critical Remaining Work
Actual Work
Remaining Work

TASK filter: *SOK | No Completed Activities.

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: Herengracht 107-169 Planning tot GSU
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Uitsnede: *SOK | Algemene layout

Baseline:
Standlijn: 29-Nov-23
Printdatum: 01-Dec-23

Activity ID	Activiteiten	Start	Finish	Original Duration
	Geluids- en trillingspredicties	23-May-24	22-Aug-24	50.00
A2770	Opstellen geluidspredicties obv eerste concept planning (keuze uitvoeringsmethode)	20-Jun-24	22-Aug-24	30.00
A2780	Startoverleg VTH tbv keuze uitvoeringsmethode	25-Jul-24	22-Aug-24	5.00
A2970	Opstellen trillingspredictie obv VO	23-May-24	19-Jun-24	20.00
	WP14 - Besluitvorming	04-Apr-25	20-May-25	30.00
	WP14.1 - CAR verzekering	04-Apr-25	17-Apr-25	10.00
A1430	Opsturen stukken naar VGA tbv CAR verzekering	04-Apr-25	17-Apr-25	10.00
A1460	Indienen monitoringsplan bij VGA tbv CAR verzekering	04-Apr-25		0.00
A1470	CAR verzekering gereed tbv GSU		17-Apr-25	0.00
	WP14.2 - BAP toets	22-Apr-25	20-May-25	20.00
A1440	Beheer Acceptatie Proces (BAP) toets	22-Apr-25	06-May-25	10.00
A1450	Faseovergangsrapport (OG)	07-May-25	20-May-25	10.00
A1480	Vastgesteld Uitvoeringskrediet en Uitvoeringsbesluit		20-May-25	0.00
	WP16 - Voorbereiden ON	29-Nov-23	17-Mar-26	525.00
	WP16.1 - Detail engineering	31-Jan-25	31-Jan-25	0.00
	WP16.2 - Plannen en planning	23-May-24	16-Sep-25	295.00
A2610	Start opstellen operationele plannen (na bestek gereed)		03-Apr-25	0.00
A2660	Operationele plannen gereed voor GSU		05-Jun-25	0.00
	WP16.2.1 - Operationele plannen	23-May-24	26-Jun-25	254.00
	Opstellen Kwaliteitsplan	04-Apr-25	05-Jun-25	40.00
	Opstellen V&G plan uitvoering	04-Apr-25	05-Jun-25	40.00
	Opstellen Veiligheidsplan Art 8.7	04-Apr-25	20-Jun-25	50.00
	Opstellen Keuringsplan	04-Apr-25	04-Jun-25	39.00
	Opstellen Bemalingsplan	04-Apr-25	05-Jun-25	40.00
	Opstellen Stabiliteitsberekeningen	04-Apr-25	26-Jun-25	54.00
	Opstellen Vaarwegmanagementplan	23-May-24	24-Oct-24	95.00
A2555	Afstemmen werkwijze en fasering met Nautisch Beheer	23-May-24	03-Jul-24	30.00
A2560	Opstellen Vaarwegmanagementplan + afstemmen vaarwegbeheerder	13-Sep-24	24-Oct-24	30.00
A2580	Stoppunt: Vaarwegmanagementplan gereed		24-Oct-24	0.00
	Opstellen Ecologisch werkprotocol	04-Apr-25	04-Jun-25	39.00
	WP16.2.2 - Opstellen werkplannen	20-Feb-25	16-Sep-25	125.00
	WP16.3 - Inkoop	31-Jan-25	17-Mar-26	260.00
	WP16.3.1 - Inkoop damwanden	31-Jan-25	27-Jun-25	100.00
A1810	Inkoopprocedure damwanden	31-Jan-25	27-Feb-25	20.00
A1820	Levertijd damwanden	28-Feb-25	27-Jun-25	80.00
	WP16.3.2 - Inkoop boorpalen (incl. boorpunten)	31-Jan-25	27-Jun-25	100.00
A1830	Inkoopprocedure boorpalen (incl. boorpunten)	31-Jan-25	27-Feb-25	20.00
A1840	Levertijd boorpalen (incl. boorpunten)	28-Feb-25	27-Jun-25	80.00
	WP16.3.3 - Inkoop wapening	30-Jun-25	28-Oct-25	70.00
	WP16.3.4 - Inkoop metselstenen	20-Aug-25	17-Mar-26	140.00
	WP16.3.5 - Inkoop maaiveldinrichting	30-Jun-25	09-Dec-25	100.00
	WP16.3.6 - Inkoop natuurstenen dekstenen	20-Aug-25	17-Mar-26	140.00
	WP16.3.7 - Inkoop bomengrond	20-Aug-25	06-Jan-26	90.00
	WP16.3.8 - Inkoop betonwerk	20-Aug-25	09-Dec-25	80.00
	WP16.3.9 - Inkoop dekstenen	20-Aug-25	09-Dec-25	80.00
	WP16.3.10 - Inkoop onderaanneming maaiveldinrichting	20-Aug-25	11-Nov-25	60.00
	WP16.3.11 - Inkoop onderaanneming riolering	20-Aug-25	11-Nov-25	60.00
	WP16.3.12 - Inkoop sloopwerk	20-Aug-25	11-Nov-25	60.00
	WP16.4 - Vergunningen (VOTBM) ON	29-Nov-23	27-Jun-25	365.00
	WP16.5 - Vaarweg- en wegmanagment	25-Oct-24	30-Jan-25	60.00
	WP17 - Uitvoering derden	20-Aug-24	16-Jun-25	199.00
	WP17.1 - Uitvoering K&L	15-May-25	16-Jun-25	20.00
A2960	Werkzaamheden mbt kast Liander (werkzaamheden NTB vóór of tijdens uitvoering)	15-May-25	16-Jun-25	20.00
	WP17.2 - Uitvoering bomen	20-Aug-24	28-Oct-24	50.00
A2165	Opdrachtverlening en voorbereiding groenaannemer	20-Aug-24	14-Oct-24	40.00
A2170	Kappen/verplanten bomen HGR 2 (kappen tussen 1 okt en 1 mrt)	15-Oct-24	28-Oct-24	10.00
	WP18 - Uitvoering ON	30-Jun-25	24-Nov-26	340.00
A2175	Voorbereidede werkzaamheden (afroepen mensen en materieel etc.) na overeenkomen NOK Realisa	30-Jun-25	19-Aug-25	20.00
A2180	GSU HGR 2	20-Aug-25		0.00
A2185	Inrichten bouwplaats en mobiliseren materieel	20-Aug-25	16-Sep-25	20.00
A2195	Uitvoering HGR 2 (uitvoeringsduur NTB)	17-Sep-25	24-Nov-26	300.00

