
Activity Name	Start	Duur <T>	Finish
Ontwikkellocaties Noord	01-07-21	1055	16-07-25
Meidoornweg	01-07-21	1055	16-07-25
Kavelpaspoort / Bouwenvelop	01-07-21	180	09-03-22
Gemeente Amsterdam	01-07-21	180	09-03-22
Startmoment	01-07-21	0	
Input ophalen	01-07-21	55	15-09-21
Participatiebijeenkomst	16-09-21	0	
Input verwerken	16-09-21	20	13-10-21
Financiele toets	14-10-21	20	10-11-21
Afstemming supervisor / CRK	14-10-21	20	10-11-21
Afronden voor besluitvorming	11-11-21	20	08-12-21
Besluitvorming DB	09-12-21	65	09-03-22
BD stelt kavelpaspoort vast		0	09-03-22
Juridisch Planologisch Kader	12-08-21	375	18-01-23
Gemeente Amsterdam	12-08-21	375	18-01-23
Opstarten voorontwerp bestemmingplan	12-08-21	45	13-10-21
Scope gereed voor uitzetten laatste onderzoeken		0	13-10-21
Afronden voorontwerp bestemmingplan (ON+verwerken, ntd met Mark)	14-10-21	75	26-01-22
Besluitvorming vrijgave	27-01-22	30	09-03-22
Wethouder / college geeft vrij voor 311	10-03-22	0	
311-overleg	10-03-22	30	20-04-22
Verwerken in ontwerp bestemmingplan	21-04-22	20	18-05-22
Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan college	19-05-22	45	20-07-22
Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan door college		0	20-07-22
Tervisielegging en opstellen NvB	21-07-22	45	21-09-22
Verwerken in bestemmingsplan	22-09-22	20	19-10-22
Vaststellen bestemmingsplan (ntd obv besluitvorming 22)	20-10-22	65	18-01-23
Bestemmingsplan vastgesteld		0	18-01-23
Bouwplan	01-07-21	990	16-04-25
Ontwikkelende partijen	01-07-21	990	16-04-25
Opstellen DO	01-07-21	65	29-09-21
Sloopwerk	01-07-22*	65	30-09-22
Gewenste start uitvoering	30-09-22	0	
GSU vergunningplichtige werkzaamheden	20-04-23	0	
Realisatie tot start woonrijpmaken	20-04-23	520	16-04-25
Gemeente Amsterdam	30-09-21	405	19-04-23
Toets DO	30-09-21	45	01-12-21
Contract afronden	02-12-21	20	29-12-21
Behandeling bouwaanvraag	19-01-23	65	19-04-23
Besluit omgevingsvergunning		0	19-04-23
Bouwrijpmaken	30-09-21	370	01-03-23
Gemeente Amsterdam	30-09-21	370	01-03-23
Opstellen akkoord wenstrace	30-09-21	45	01-12-21
Wenstraceprocedure	02-12-21	85	30-03-22
Uitvoeringsvoorbereiding KLB en IB	31-03-22	175	30-11-22
Realisatie bouwrijpmaken	01-12-22	65	01-03-23
Woonrijpmaken	17-04-25	65	16-07-25
Gemeente Amsterdam	17-04-25	65	16-07-25
Realisatie woonrijpmaken	17-04-25	65	16-07-25

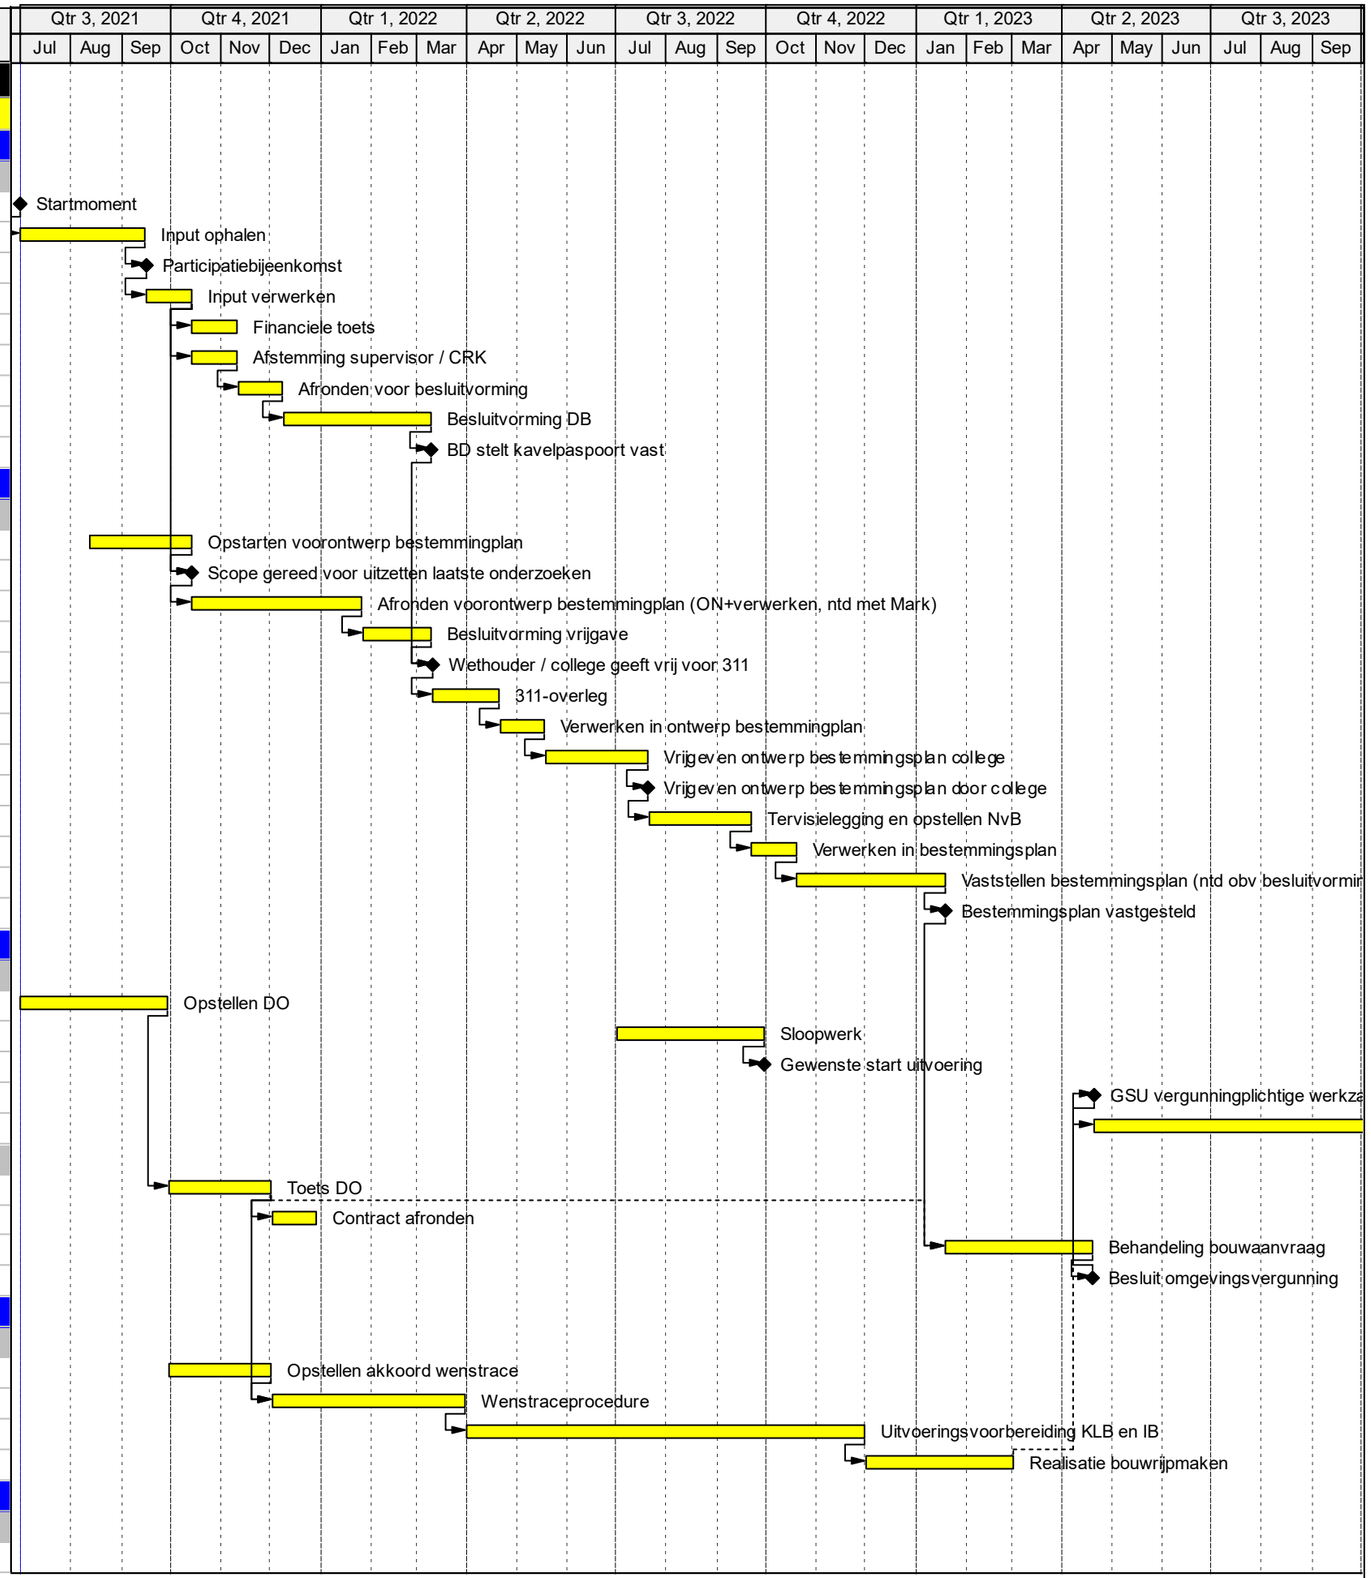

Remaining Level of Effort ◆ ◆ Milestone
Remaining Work
Actual Work

Meidoornweg
opzet projectplanning

Planningsadvies PMB: Th. Brouwer
printdatum: 19-08-21
