Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Constructieve beoordeling van gegevens/documenten voor het (bouw)project met de volgende gegevens:
Projectlocatie: Centrumeiland bl08, k05 GAO (6257375)
Projectomschrijving: oprichten appartementen
Aanvraagnummer: OLO-6257375

Toetsnummer - 2 Onderwerp: WOONGEBOUW - UITV (Wapening funderingsbalken) 13-9-2022

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**			
3.3	Fundatiebalken en poeren	De tekening en berekening van het stekkenplan ontbreekt	Ontbreekt	De tekening en berekening van het stekkenplan
	Conclusie :	Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.		

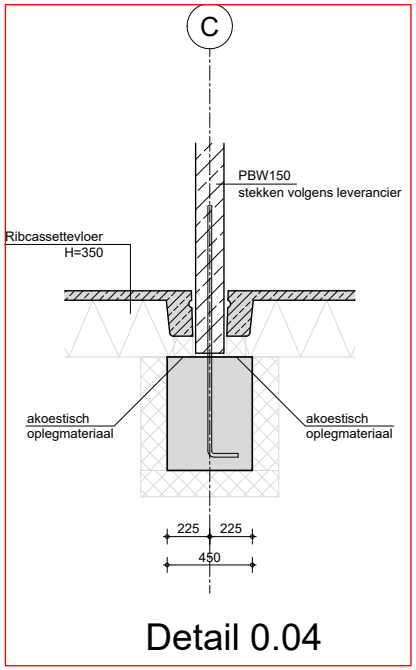

Detail 0.04

Stekkenplan t.b.v. prefab betonwand dient door de prefab leverancier te worden berekend en getekend conform DO-100 en detail 0.04

Prefab beton
Afmeting zie plattegrond
Milieuklasse XC1
Betonkwaliteit C45/55
Tekening en berekening incl. stekken volgens leverancier (categorie 4b)

5.1. 2. e

M E

Datum 13-9-2022

Naam

Aandachtspunten/risico's

Nr.	Onderwerp		Beheersmaatregel	
A1	Tekening en berekening van de paalmisstanden tijdig indienen.			
A2				
A3				
