Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Baseline 1.0 planning tot GSU HEG0202

Printdatum: 27-6-2025

Gemeente Amsterdam · Beens Groep · COUNT & COOPER

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration
Herengracht 107-169 Planning tot GSU		13-May-25	15-May-29	935
Referentie mijlpalen		13-May-25	15-May-29	935
A2720	MIJLPAAL: Start NOK Voorbereiding HGR 107-169	13-May-25*		0
A4220	MIJLPAAL: Voorlopig Ontwerp gereed		19-Dec-25	0
A4240	MIJLPAAL: SSK VO-fase gereed		16-Jan-26	0
A4260	MIJLPAAL: Definitief Ontwerp gereed		16-Jul-26	0
A4250	MIJLPAAL: Bestekstekeningen gereed		31-Aug-26	0
A2700	MIJLPAAL: Concept bestek gereed		21-Sep-26	0
A2710	MIJLPAAL: Definitief bestek gereed		09-Nov-26	0
A4270	MIJLPAAL: Concept aanbieding gereed		30-Nov-26	0
A4280	MIJLPAAL: Definitieve aanbieding gereed		11-Jan-27	0
A2760	MIJLPAAL: NOK Realisatie overeengekomen		08-Feb-27	0
A2765	MIJLPAAL: GSU Herengracht 107-169		09-Feb-27	0
A4300	MIJLPAAL: GEU Herengracht 107-169 (indicatief)		15-May-29	0
WP8 - Definitief Ontwerp (maaiveld) (inc. participatie/inspraak)		19-Aug-25	14-Jul-26	220
A3610	Start WP8 - Definitief Ontwerp (maaiveld) (inc. participatie/inspraak)	19-Aug-25		0
A4070	Participatie met de buurt	19-Aug-25	19-Aug-25	0
A4080	SO (maaiveld) uitwerken tot Voorlopig Ontwerp (VO) (maaiveld) met oplegnotitie en afstemming interne stakeholders	19-Aug-25	01-Sep-25	10
A4090	Bestuurlijk akkoord door stadsdeelcommissie	02-Sep-25	15-Sep-25	10
A3630	Uitgangspunten maaiveld gereed voor start Definitief Ontwerp WP9.0		15-Sep-25	0
A4100	VO (maaiveld) vrijgeven voor inspraak)	16-Sep-25	13-Oct-25	20
A4110	Inspraakperiode	14-Oct-25	10-Nov-25	20
A2665	Stakeholderanalyse en opstellen KES	10-Nov-25	05-Dec-25	20
A4120	Nota van Beantwoording opstellen en VO (maaiveld) aanpassen tot Definitief Ontwerp (DO) (maaiveld)	11-Nov-25	08-Dec-25	20
A4130	VO (maaiveld) vaststellen (Stedenbouwkundigontwerp)	09-Dec-25	05-Jan-26	10
A3650	VO (maaiveld) vastgesteld (Stedenbouwkundig ontwerp)		05-Jan-26	0
A4230	Opstellen DO maaiveld	06-Jan-26	14-Jul-26	130
A4290	DO (maaiveld) gereed		14-Jul-26	0
WP9 - Ontwerp, bestek en NOK Realisatie		13-May-25	08-Feb-27	392
WP9.0 - Conditionering en review stukken		13-May-25	03-Oct-25	84
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A2990	Toets geldigheid en volledigheid van onderzoeken en beschikbare documentatie (ON)	20-May-25	18-Jun-25	19
A3000	Uitvoeren aanvullende onderzoeken tbv benodigde informatie voor opstellen ontwerp (OG+ON)	19-Jun-25	03-Oct-25	60
WP9.1 - Schetsontwerp		20-May-25	24-Jul-25	45
A3140	Vaststellen scope en werkgrens	20-May-25	06-Jun-25	12
A3150	Inventariseren en beoordelen bestaande informatie kade	20-May-25	20-Jun-25	21
A3160	Onderzoeken bestaande kade (o.a. bestaande paallocaties)	10-Jun-25	21-Jul-25	30
A3170	Inventariseren K&L	23-Jun-25	21-Jul-25	21
A3180	Voorbereiden opname omgeving	23-Jun-25	04-Jul-25	10
A3190	Inventariseren bestaand/nieuw straatmeubilair en voorzieningen	23-Jun-25	21-Jul-25	21
A3200	Uitvoeren opname omgeving (3D-scan)	07-Jul-25	24-Jul-25	14
A3210	Verwerken 3D scan	07-Jul-25	24-Jul-25	14
A3220	Vaststellen nieuwe kadelijn	07-Jul-25	24-Jul-25	14
A3230	Vaststellen ontwerpprincipes / fasering in uitgangspuntennotitie	07-Jul-25	24-Jul-25	14
A3240	Startvoorwaarden voor opstellen Voorlopig Ontwerp gereed		24-Jul-25	0
WP9.2 - Voorlopig ontwerp		19-Aug-25	13-Feb-26	119
WP9.2.1 - Voorlopig Ontwerp Constructief Tekenwerk		19-Aug-25	16-Jan-26	99
A3250	Opstellen Voorlopig Ontwerp Constructief Tekenwerk	19-Aug-25	07-Nov-25	59
A1010	Start opstellen Voorlopig Ontwerp Constructief Tekenwerk	19-Aug-25		0
A3400	Uitvoeren eisenverificatie Voorlopig ontwerp constructief tekenwerk	10-Nov-25	21-Nov-25	10
A3260	Review Voorlopig Ontwerp Constructief Tekenwerk (gemAms + BeensCC)	24-Nov-25	05-Dec-25	10
A3410	Verwerken review Voorlopig Ontwerp Constructief Tekenwerk (gemAms + BeensCC)	08-Dec-25	19-Dec-25	10
A3420	Voorlopig Ontwerp Constructief Tekenwerk gereed		19-Dec-25	0
A3280	Opstellen VO-kostenraming (SSK)	05-Jan-26	16-Jan-26	10
A3290	Voorlopig Ontwerp vastgesteld incl. SSK-raming		16-Jan-26	0
WP9.2.2 - Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwingen		19-Aug-25	08-Dec-25	80
WP9.2.2.1 - Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing Constructief		19-Aug-25	08-Dec-25	80
A3440	Start opstellen Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing	19-Aug-25		0
A3590	Voorbereidende werkzaamheden Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing	19-Aug-25	01-Sep-25	10
A3430	Opstellen Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing	02-Sep-25	27-Oct-25	40
A3450	Uitvoeren eisenverificatie Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing	28-Oct-25	10-Nov-25	10
A3460	Review Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing (gem Ams + BeensCC)	11-Nov-25	24-Nov-25	10
A3470	Verwerken review Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing (gemAms + BeensCC)	25-Nov-25	08-Dec-25	10
A3500	Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing gereed		08-Dec-25	0
WP9.2.2.1 - Voorlopig Ontwerp Constructieve beschouwing Geotechnisch		19-Aug-25	08-Dec-25	80
A3520	Start opstellen Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing	19-Aug-25		0
A3600	Voorbereidende werkzaamheden Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing	19-Aug-25	01-Sep-25	10
A3510	Opstellen Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing	02-Sep-25	27-Oct-25	40
A3530	Uitvoeren eisenverificatie Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing	28-Oct-25	10-Nov-25	10
A3540	Review Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing (gem Ams + BeensCC)	11-Nov-25	24-Nov-25	10

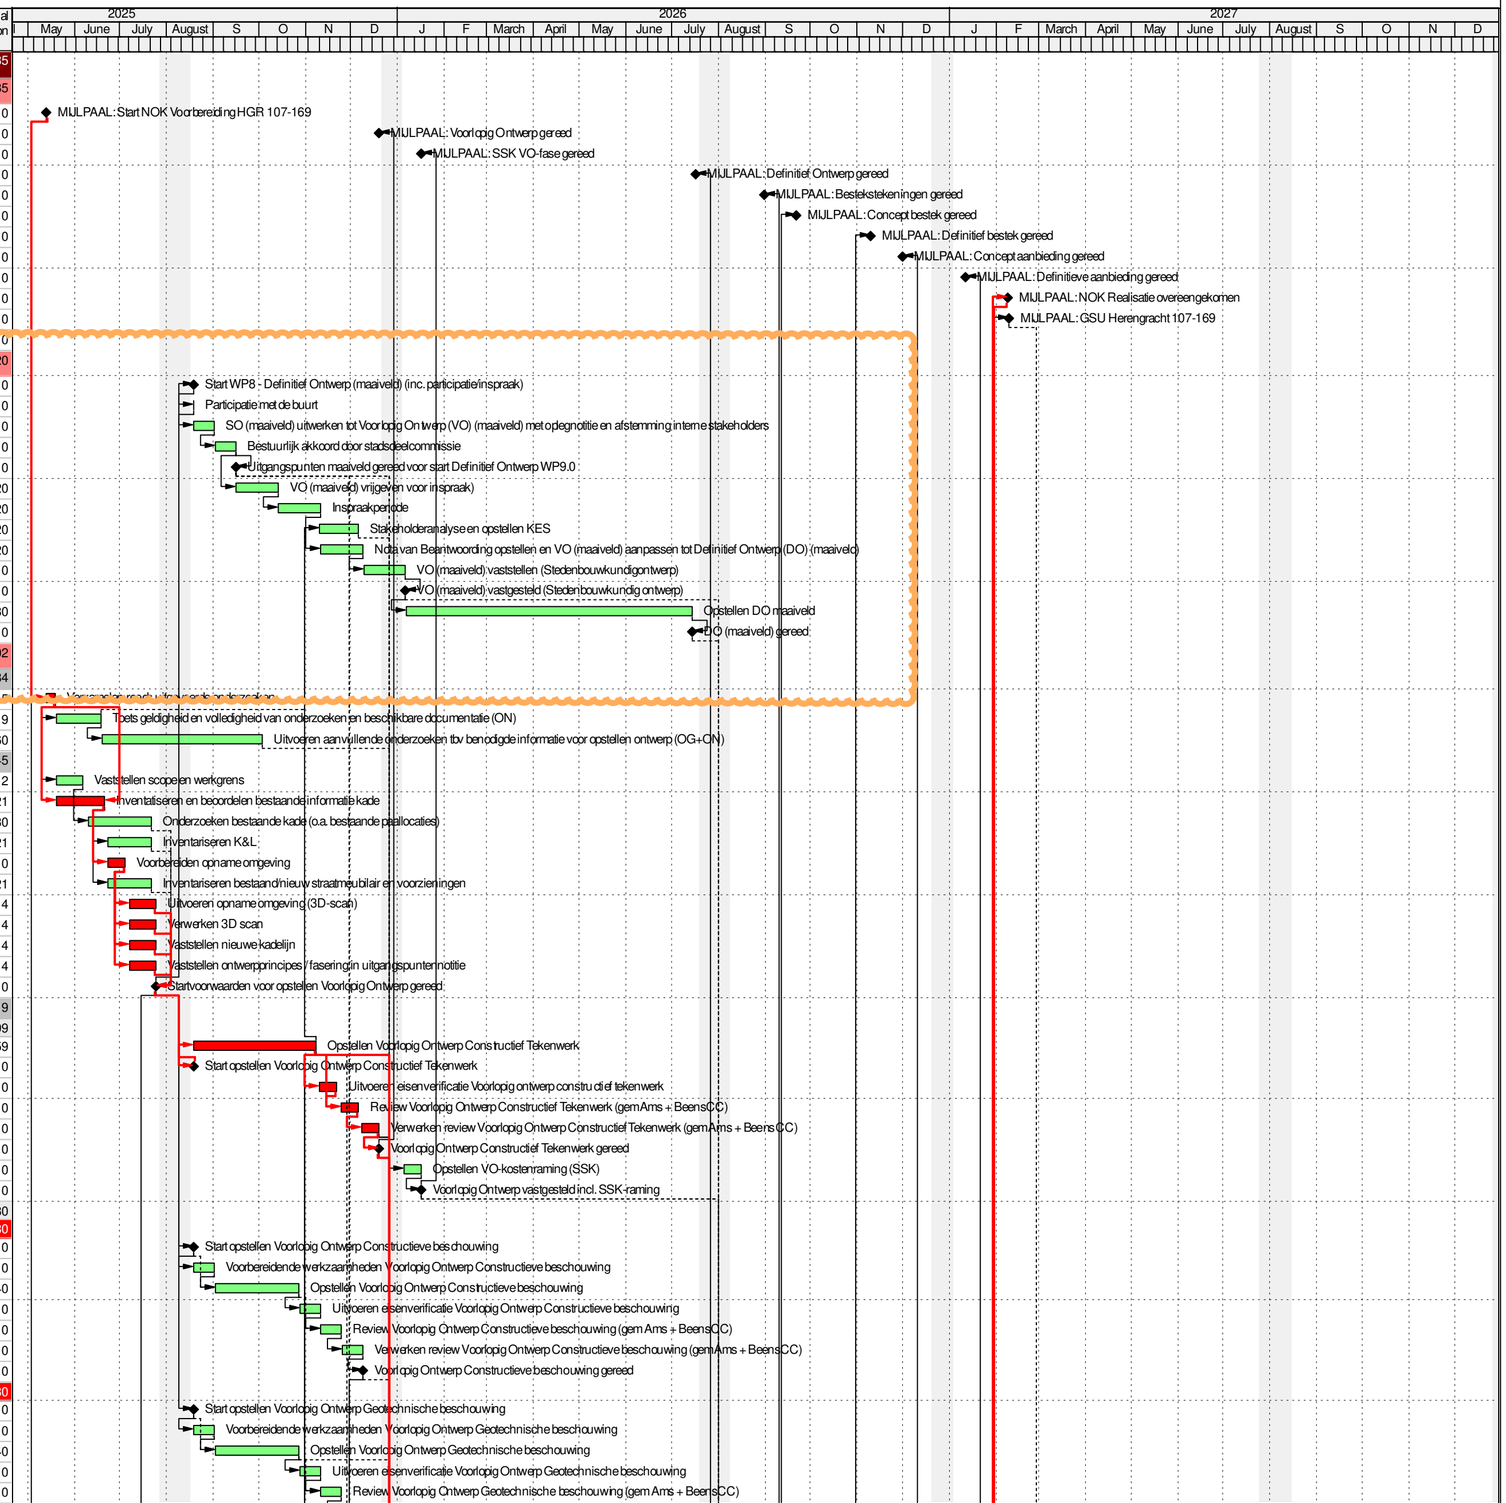

Remaining Level of Effort · Remaining Work · Actual Level of Effort · Actual Work · Critical Remaining Work · Milestone

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: NOK
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Baseline 1.0 planning tot GSU HEG0202

Printdatum: 27-6-2025

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration
A3550	Verwerken review Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing (gem Arns + BeensCC)	25-Nov-25	08-Dec-25	10
A3580	Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing gereed		08-Dec-25	0
WP9.2.4 - Voorlopig Ontwerp BAP-Toets		05-Jan-26	13-Feb-26	30
A3990	Toetstermijn Voorlopig Ontwerp BAP-Toets	05-Jan-26	30-Jan-26	20
A4000	Start Voorlopig Ontwerp BAP-Toets	05-Jan-26		0
A4020	Verwerken toetscommentaar Voorlopig Ontwerp BAP-Toets	02-Feb-26	13-Feb-26	10
A4010	Voorlopig Ontwerp BAP-toets gereed		13-Feb-26	0
WP9.3 - Definitief ontwerp		09-Dec-25	21-Sep-26	172
WP9.2.1 - Definitief Ontwerp Constructief Tekenwerk		05-Jan-26	24-Aug-26	143
A3660	Opstellen Definitief Ontwerp Constructief Tekenwerk	05-Jan-26	08-Jun-26	105
A3670	Start opstellen Definitief Ontwerp Constructief Tekenwerk	05-Jan-26		0
A3680	Uitvoeren eisenverificatie Definitief ontwerp constructief tekenwerk	09-Jun-26	22-Jun-26	10
A3690	Review Definitief Ontwerp Constructief Tekenwerk (gem Arns + BeensCC)	23-Jun-26	06-Jul-26	10
A3700	Verwerken review Definitief Ontwerp Constructief Tekenwerk (gem Arns + BeensCC)	07-Jul-26	16-Jul-26	8
A3730	Definitief Ontwerp Constructief Tekenwerk gereed		16-Jul-26	0
A3710	Opstellen DO-kostenraming (SSK)	11-Aug-26	24-Aug-26	10
A3720	Definitief Ontwerp vastgesteld incl. SSK-raming		24-Aug-26	0
WP9.2.2 - Definitief Ontwerp Tekenwerk Tijdelijke Voorzieningen		17-Mar-26	22-Jun-26	64
A3920	Start opstellen Definitief Ontwerp Tijdelijke voorzieningen	17-Mar-26		0
A3960	Opstellen Faseringstekeningen	17-Mar-26	07-Apr-26	14
A3970	Opstellen Uitvoeringsfasering	08-Apr-26	22-May-26	30
A3980	Opstellen Bouwplaatssinrichtingstekening	26-May-26	22-Jun-26	20
A3950	Definitief Ontwerp Tekenwerk Tijdelijke Voorzieningen gereed		22-Jun-26	0
WP9.2.3 - Definitief Ontwerp Constructieve beschouwingen		09-Dec-25	30-Apr-26	90
WP9.2.3.1 - Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing Constructief		09-Dec-25	09-Mar-26	55
A3760	Opstellen Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing	09-Dec-25	26-Jan-26	25
A3740	Start opstellen Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing	09-Dec-25		0
A3770	Uitvoeren eisenverificatie Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing	27-Jan-26	09-Feb-26	10
A3780	Review Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing (gem Arns + BeensCC)	10-Feb-26	23-Feb-26	10
A3790	Verwerken review Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing (gem Arns + BeensCC)	24-Feb-26	09-Mar-26	10
A3800	Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing gereed		09-Mar-26	0
WP9.2.3.1 - Definitief Ontwerp Constructieve beschouwing Geotechnisch		09-Dec-25	30-Apr-26	90
A3830	Opstellen Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing	09-Dec-25	16-Mar-26	60
A3810	Start opstellen Definitief Ontwerp Geotechnische beschouwing	09-Dec-25		0
A3840	Uitvoeren eisenverificatie Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing	17-Mar-26	30-Mar-26	10
A3850	Review Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing (gem Arns + BeensCC)	31-Mar-26	15-Apr-26	10
A3860	Verwerken review Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing (gem Arns + BeensCC)	16-Apr-26	30-Apr-26	10
A3870	Voorlopig Ontwerp Geotechnische beschouwing gereed		30-Apr-26	0
WP9.2.4 - Definitief Ontwerp BAP-Toets		11-Aug-26	21-Sep-26	30
A4030	Toetstermijn Definitief Ontwerp BAP-Toets	11-Aug-26	07-Sep-26	20
A4040	Start Definitief Ontwerp BAP-Toets	11-Aug-26		0
A4060	Verwerken toetscommentaar Definitief Ontwerp BAP-Toets	08-Sep-26	21-Sep-26	10
A4050	Definitief Ontwerp BAP-toets gereed		21-Sep-26	0
WP9.3 - Bestek		11-Aug-26	09-Nov-26	65
A1560	Bestek HGR 2 schrijven	11-Aug-26	21-Sep-26	30
A1600	Bestekstekeningen opstellen o.b.v. DO incl hoeveelheden verwerken in deel 2.2	11-Aug-26	31-Aug-26	15
A2255	Concept bestek HGR 2 gereed		21-Sep-26	0
A2260	Review bestek door IPM & specialisten (OG)	22-Sep-26	05-Oct-26	10
A2261	Opstellen NVI door BeensCC obv concept bestek (ON)	22-Sep-26	05-Oct-26	10
A2270	Verwerken feedback uit review IPM & specialisten en BeensCC (OG) (tot bestek 1.0)	06-Oct-26	19-Oct-26	10
A2280	Toets ABT op definitief bestek (OG)	20-Oct-26	02-Nov-26	10
A2290	Review verwerken en afstemming met ABT (OG)	03-Nov-26	09-Nov-26	5
A2300	Definitief bestek HGR 2 gereed		09-Nov-26	0
WP15.8 - NOK Realisatie		10-Nov-25	08-Feb-27	283
A1550	Start calculatieperiode bestek HGR 2	10-Nov-26		0
A2310	Opstellen concept aanbieding door BeensCC obv definitief bestek	10-Nov-26	30-Nov-26	15
A2320	Bespreken en beoordeling concept aanbieding BeensCC+OG	01-Dec-26	07-Dec-26	5
A2330	Opstellen definitieve aanbieding door BeensCC	08-Dec-26	11-Jan-27	15
A2340	Bespreken en beoordeling definitieve aanbieding BeensCC+OG	12-Jan-27	18-Jan-27	5
A2350	Aanvullende afstemming kostenraming definitieve aanbieding	19-Jan-27	25-Jan-27	5
A2360	Akkoord lead-buyer en AOG	26-Jan-27	08-Feb-27	10
A2370	NOK Realisatie overeengekomen		08-Feb-27	0
Werkvoorbereiding tbv overeenkomen NOK Realisatie		10-Nov-25	04-Jan-27	258
A2782	Opstellen eerste concept uitvoeringsplanning en fasering (LEAN-weekniveau)	10-Nov-25	05-Dec-25	20
A2800	Opstellen Risicodossier tbv conceptaanbieding	22-Sep-26	19-Oct-26	20
A2790	Opstellen Uitvoeringsplanning incl. materieelinzet tbv concept aanbieding	20-Oct-26	09-Nov-26	15
A2795	Aanpassen en updaten Uitvoeringsplanning tbv definitieve aanbieding	08-Dec-26	04-Jan-27	10
A2890	Aanpassen en updaten Risicodosser tbv definitieve aanbieiding	08-Dec-26	04-Jan-27	10
Bouwplaatsinrichtingstekeningen		10-Nov-25	30-Nov-26	243
A2930	Opstellen faseringstekeningen (doorsnedes)	10-Nov-25	19-Dec-25	30
A2920	Opstellen bouwplaatsinrichtingstekeningen en stappenplan	08-Dec-25	09-Jan-26	15
A2925	Aanpassen en updaten bouwpaatsinrichtingstekeningen en stappenplan	10-Nov-26	30-Nov-26	15

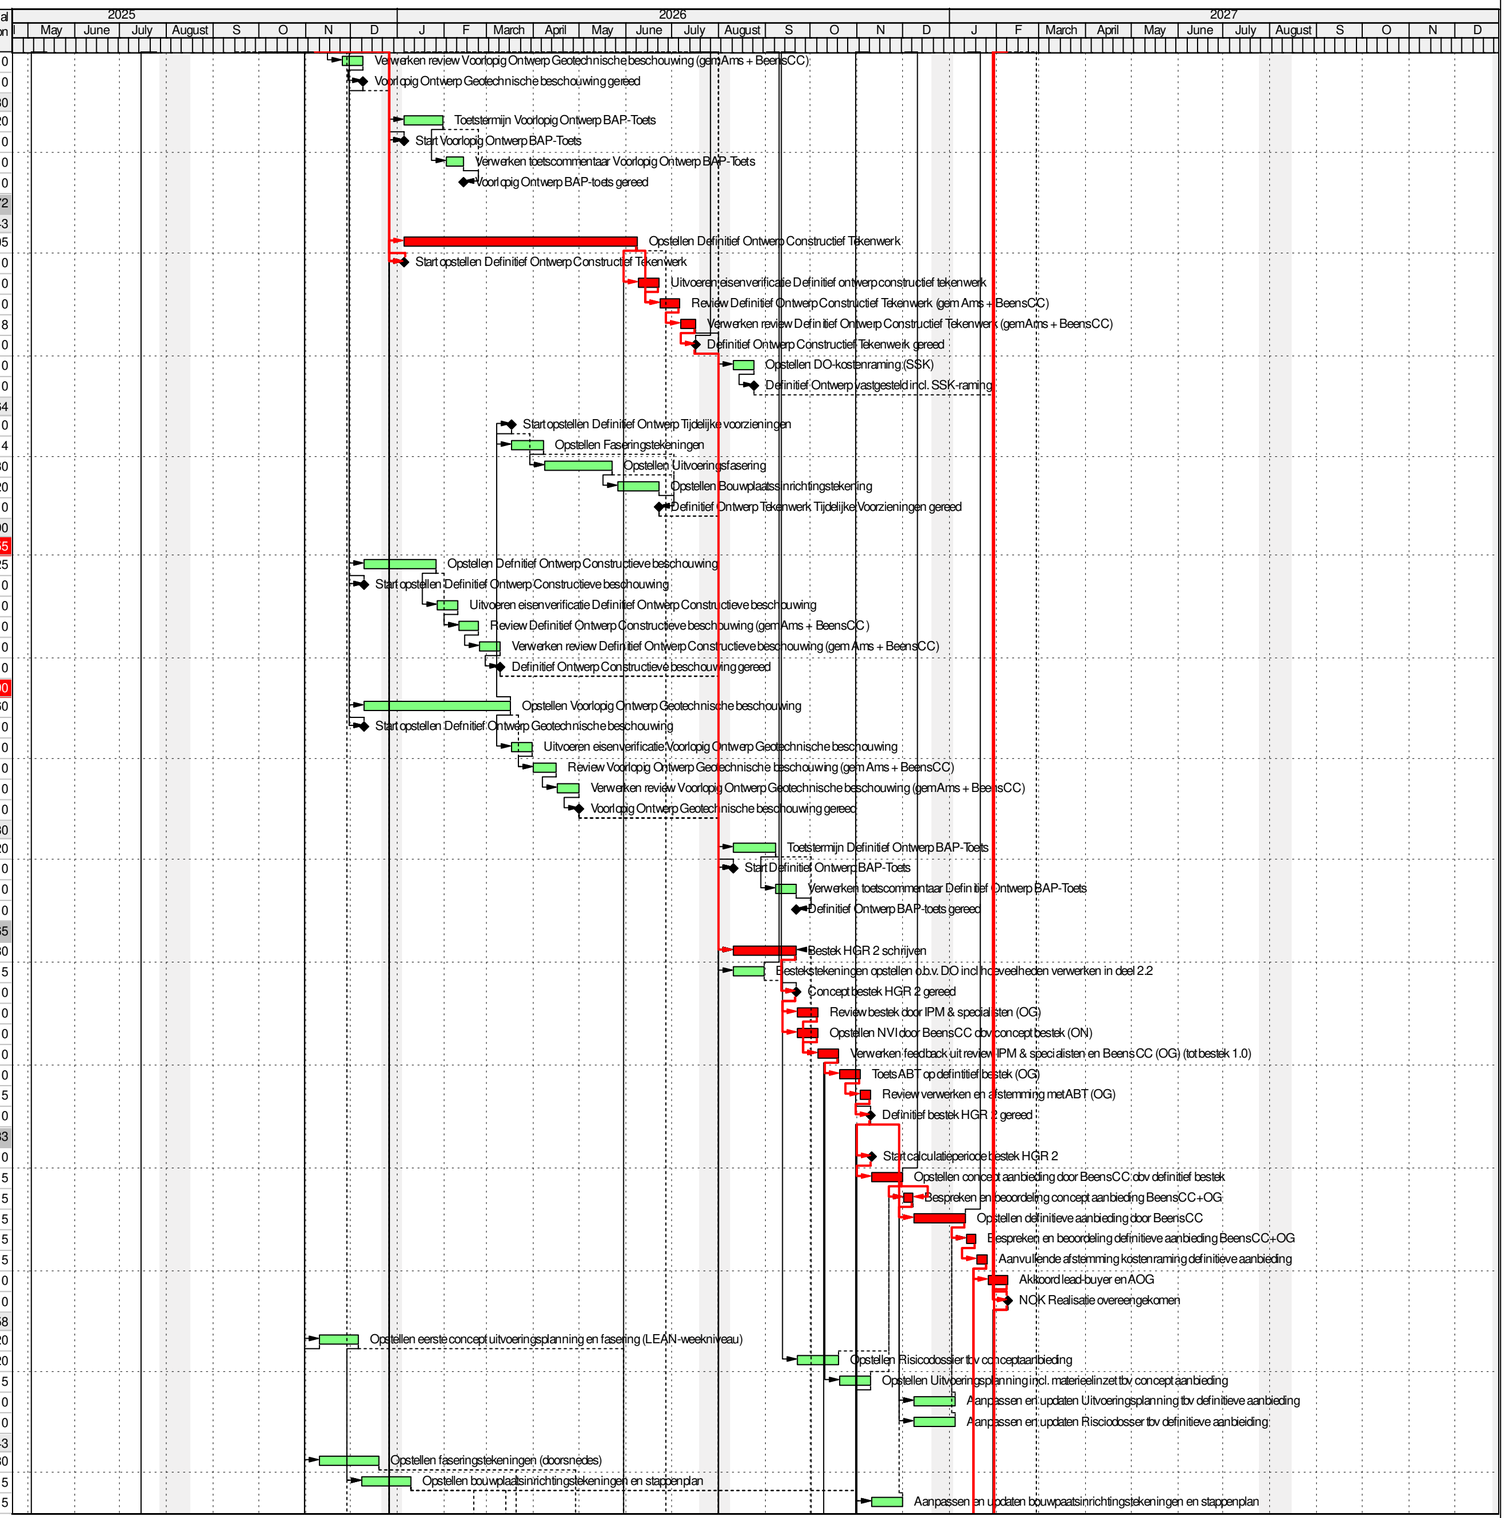

Remaining Level of Effort
Remaining Work
Actual Level of Effort
Actual Work
Critical Remaining Work
Milestone

TASK filter: All Activities

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: NOK 5.1, 2, e
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Baseline 1.0 planning tot GSU HEG0202

Printdatum: 27-6-2025

Gemeente Amsterdam · Beens Groep · Count & Cooper

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration
WP15 - Contract (NOK voorbereiding en NOK Inkoop Staal)		13-May-25	19-Oct-26	322
WP15.6 - NOK Voorbereiding		13-May-25	10-Jul-25	40
A1500	Opstellen NOK voorbereiding KVV0702	13-May-25	10-Jul-25	40
A1510	NOK Voorbereiding gereed		10-Jul-25	0
WP15.7 - NOK Inkoop staal		11-Aug-26	19-Oct-26	50
A2405	Uitvraag NOK Inkoop staal door OG	11-Aug-26*	24-Aug-26	10
A2410	Opstellen offerte NOK Inkoop staal door ON	25-Aug-26	21-Sep-26	20
A2420	Beoordeling offerte NOK Inkoop staal door OG + evt. aanpassingen	22-Sep-26	19-Oct-26	20
A2430	NOK Inkoop staal gereed		19-Oct-26	0
WP10 - Wenstracé procedure		25-Jul-25	21-Oct-27	502
A1040	Tracé Akkoord Procedure inclusief afstemmen met (K&L) nutsbeheerders	25-Jul-25	23-Oct-25	65
A1620	K&L werkvoorbereiding algemeen (overige nutsaansluitingen | huisaansluiting woonboot HGR125)	24-Oct-25	26-Mar-26	100
A4140	Doorlooptijd Liander	24-Oct-25	21-Oct-27	520
A4150	Voorbereidingstijd KPN	24-Oct-25	19-Feb-26	85
A4160	Voorbereidingstijd OVL	24-Oct-25	23-Apr-26	130
WP12 - BLVC plan		05-Jan-26	08-Feb-27	253
BLVC versie 1.0		05-Jan-26	29-Jun-26	120
A1348	Opstellen BLVC-kader (door OG)	05-Jan-26	27-Feb-26	40
A1351	Opstellen concept BLVC plan (door ON)	02-Mar-26	20-Mar-26	15
A1352	Review concept BLVC plan door OG	23-Mar-26	27-Mar-26	5
A1360	Verwerken review en definitief maken BLVC plan HGR 2	30-Mar-26	14-Apr-26	10
A1370	WIOR vooroverleg	15-Apr-26	07-May-26	15
A1380	BLVC uitvoeringsplan HGR 2 bijwerken nav WIOR vooroverleg	08-May-26	22-May-26	10
A1390	Aanleveren BLVC plan HGR 2 tbv WWU (dinsdagen)		22-May-26	0
A1400	WWU beoordeling BLVC plan HGR 2 (1 x per 2 weken, dinsdagen)		01-Jun-26	0
A4200	BLVC uitvoeringsplan HGR 2 bijwerken nav WWU beoordeling	02-Jun-26	15-Jun-26	10
A1420	BLVC uitvoeringsplan HGR 2 definitief		15-Jun-26	0
A4210	Informatieavond met de buurt tbv BLVC		29-Jun-26	0
TVM-tekeningen (tbv BLVC)		23-Mar-26	21-Apr-26	20
A3110	Opstellen TVM-tekeningen (tbv BLVC plan)	23-Mar-26	21-Apr-26	20
BLVC versie 2.0		26-Jan-27	08-Feb-27	10
A3010	Opstellen BLVC versie 2.0 nav aanbieding (wijzigingen/optimalisaties)	26-Jan-27	08-Feb-27	10
A3020	Aanleveren BLVC plan versie 2.0 HGR 2 tbv WWU (dinsdagen)		08-Feb-27	0
A3030	BLVC uitvoeringsplan versie 2.0 HGR 2 definitief tbv uitvoering		08-Feb-27	0
WP11 - Vergunningen OG		10-Nov-25	08-Mar-27	303
A2210	Vergunningen OG tbv GSU verleend (8 + 6 + 6 weken)		25-Jan-27	0
WP11.1 - Omgevingsvergunningen (sloop)		05-Jan-26	22-Feb-27	263
Omgevingsvergunning sloop (kadewerkzaamheden)		11-Aug-26	22-Feb-27	130
A1130	Indienen aanvraag omgevingsvergunning sloop	11-Aug-26	24-Aug-26	10
A1140	Procedure aanvraag omgevingsvegunning sloop (8 + 6 weken)	25-Aug-26	30-Nov-26	70
A1150	Omgevingsvergunning sloop herroepelijk		30-Nov-26	0
A1160	Bezwaartermijn omgevingsvergunning sloop (6 weken)	01-Dec-26	11-Jan-27	30
A1170	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning sloop (bij geen bezwaar)		11-Jan-27	0
A1180	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning sloop (6 weken)	12-Jan-27	22-Feb-27	30
A1190	Omgevingsvergunning sloop onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		22-Feb-27	0
Omgevingsvergunning sloop (kapvergunning bomen)		05-Jan-26	17-Jul-26	133
A3040	Indienen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen	05-Jan-26	16-Jan-26	10
A3050	Procedure aanvraag omgevingsvegunning kappen bomen (8 + 6 weken)	19-Jan-26	24-Apr-26	70
A3060	Omgevingsvergunning kappen bomen herroepelijk		24-Apr-26	0
A3070	Bezwaartermijn omgevingsvergunning kappen bomen (6 weken)	27-Apr-26	05-Jun-26	30
A3080	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning kappen bomen (bij geen bezwaar)		05-Jun-26	0
A3090	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning kappen bomen (6 weken)	08-Jun-26	17-Jul-26	30
A3100	Omgevingsvergunning kappen bomen onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		17-Jul-26	0
WP11.2 - Omgevingsvergunning (bouw)		11-Aug-26	22-Feb-27	130
A1060	Indienen aanvraag omgevingsvergunning bouw	11-Aug-26	24-Aug-26	10
A1070	Procedure aanvraag omgevingsvegunning bouw (8 + 6 weken)	25-Aug-26	30-Nov-26	70
A1080	Omgevingsvergunning bouw herroepelijk		30-Nov-26	0
A1090	Bezwaartermijn omgevingsvergunning bouw (6 weken)	01-Dec-26	11-Jan-27	30
A1100	Vergunning onherroepelijk omgevingsvergunning bouw (bij geen bezwaar)		11-Jan-27	0
A1110	Bezwaarschriftprocedure omgevingsvergunning bouw (6 weken)	12-Jan-27	22-Feb-27	30
A1120	Omgevingsvergunning bouw onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		22-Feb-27	0
WP11.3 - Watervergunning		11-Aug-26	08-Mar-27	140
A1200	Indienen aanvraag watervergunning	11-Aug-26	07-Sep-26	20
A1210	Procedure aanvraag watervergunning (8 + 6 weken)	08-Sep-26	14-Dec-26	70
A1220	Watervergunning herroepelijk		14-Dec-26	0
A1230	Bezwaartermijn watervergunning (6 weken)	15-Dec-26	25-Jan-27	30
A1240	Vergunning onherroepelijk watervergunning (bij geen bezwaar)		25-Jan-27	0
A1250	Bezwaarschriftprocedure watervergunning (6 weken)	26-Jan-27	08-Mar-27	30
A1260	Watervergunning onherroepelijk (bij afgewezen bezwaar)		08-Mar-27	0
WP11.4 - Traject welstandscommissie en CRK		05-Jan-26	27-Feb-26	40

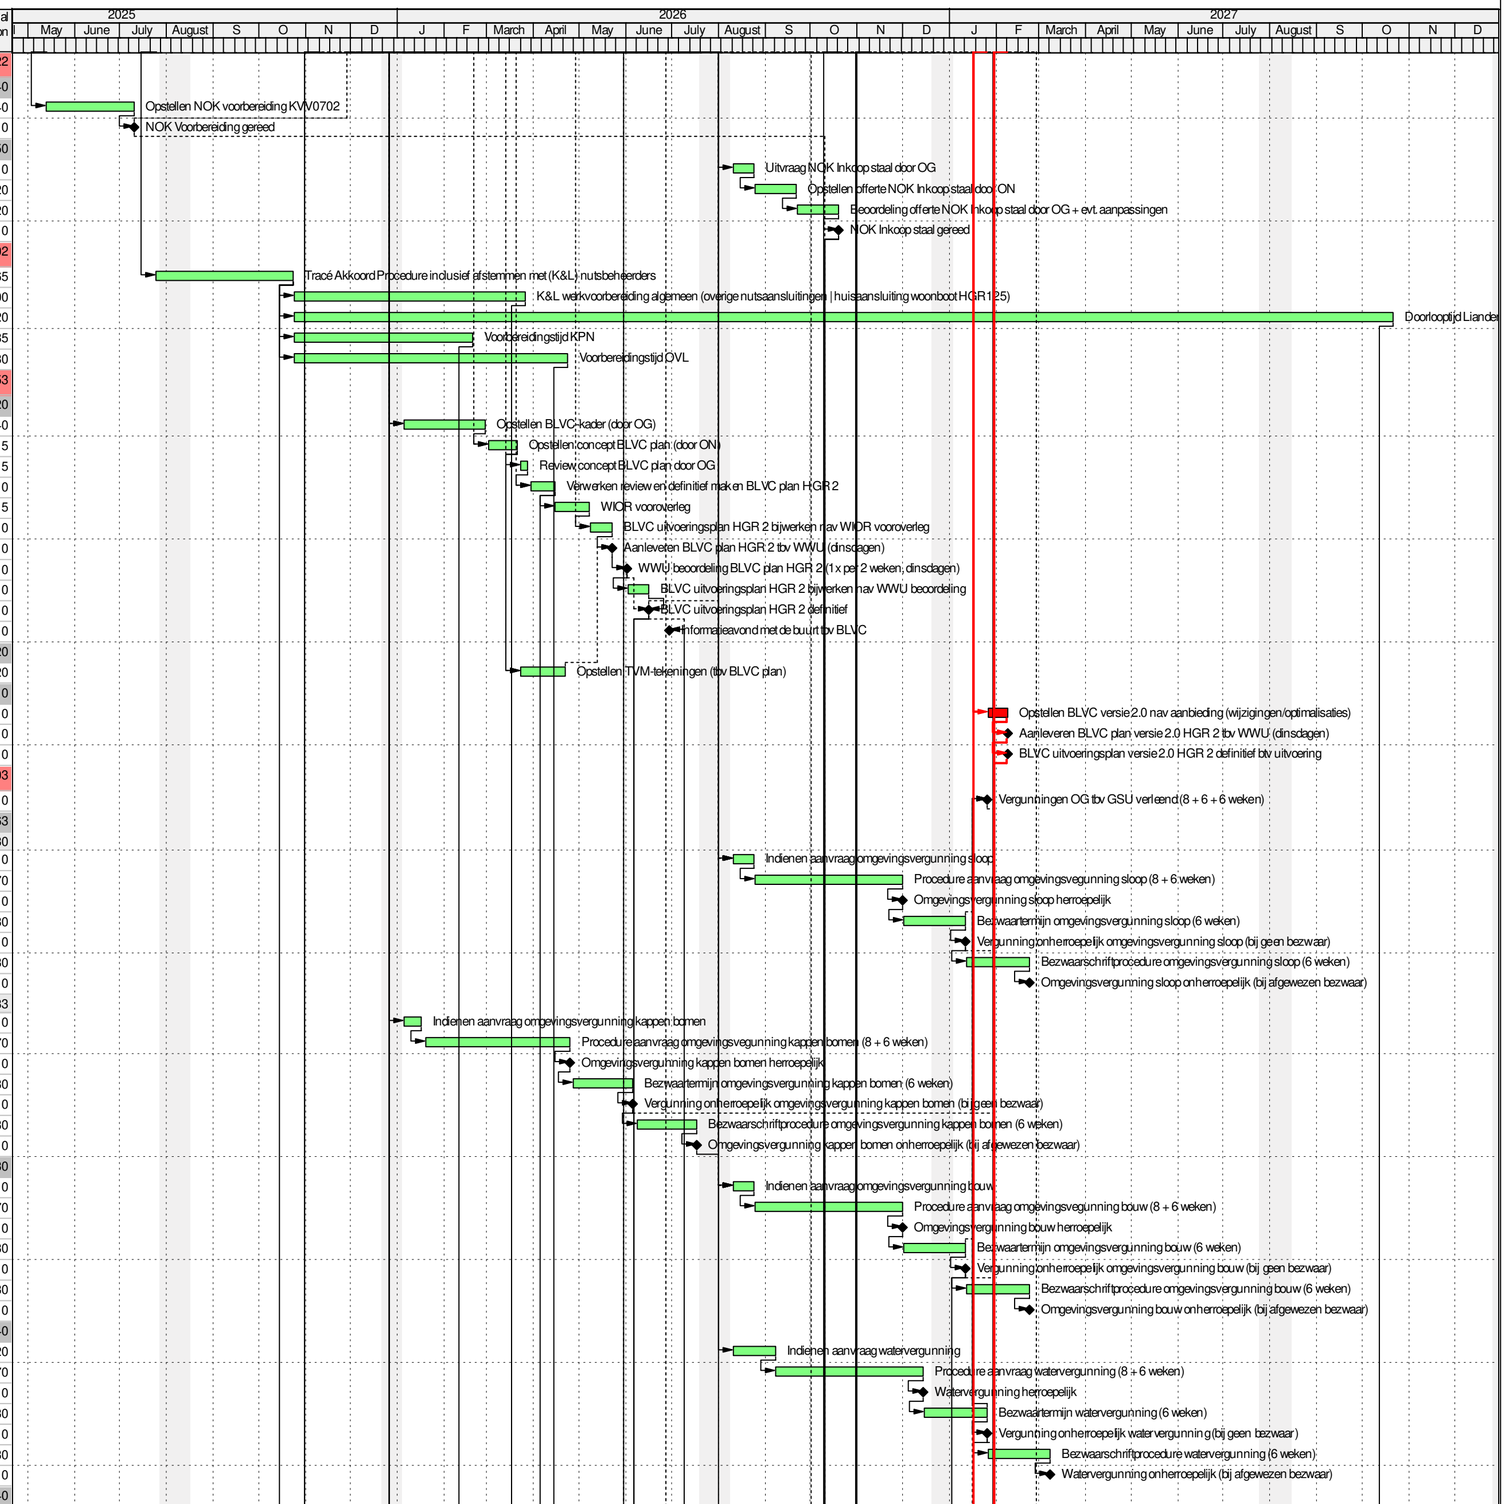

Remaining Level of Effort · Actual Work
Remaining Work · Critical Remaining Work
Actual Level of Effort · Milestone

TASK filter: All Activities

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: NOK
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Baseline 1.0 planning tot GSU HEG0202

Printdatum: 27-6-2025

Gemeente Amsterdam · Beens Groep · COUNT & COOPER

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration
A2215	Afstemmen ontwerp met welstand	05-Jan-26	27-Feb-26	40
A2220	Voorkeurssteen vastgesteld door C RK tbv inkoop metselstenen		27-Feb-26	0
WP11.5 - BUS-melding		10-Nov-26	18-Jan-27	40
A1270	Opstellen en aanvragen BUS-melding	10-Nov-26	16-Nov-26	5
A1280	Proceduretermijn BUS-melding	17-Nov-26	14-Dec-26	20
A1285	Start melding termijn BUS-melding (lang termijn)	15-Dec-26	18-Jan-27	25
A1282	Start melding termijn BUS-melding (kort termijn)	15-Dec-26	21-Dec-26	5
WP11.6 - WIOR vergunning		16-Jun-26	29-Jun-26	10
A1950	Proceduretermijn WIOR vergunning	16-Jun-26	29-Jun-26	10
A1960	WIOR vergunning verleend		29-Jun-26	0
WP11.7 - Verkeersbesluit		16-Jun-26	11-Aug-26	23
A1300	Opstellen en aanvragen Verkeersbesluit	16-Jun-26	29-Jun-26	10
A1310	Proceduretermijn Verkeersbesluit	30-Jun-26	27-Jul-26	20
A1320	Verkeersbesluit gereed		11-Aug-26	0
WP11.7 - Sloopmelding		12-Jan-27	15-Feb-27	25
A2010	Opstellen en aanvragen sloopmelding	12-Jan-27	18-Jan-27	5
A2020	Proceduretermijn sloopmelding	19-Jan-27	15-Feb-27	20
A2110	Sloopmelding verleend		15-Feb-27	0
WP11.8 - Monitoringsplan ontwerp en uitvoering		10-Nov-25	09-Sep-26	185
A1330	Opstellen Monitoringsplan (OG+ON)	07-Jul-26	26-Aug-26	20
A1340	Beoordelen Monitoringsplan (OG+ON)	27-Aug-26	09-Sep-26	10
A1350	Monitoringsplan goedgekeurd (tbv input bestek)		09-Sep-26	0
Geluids- en trillingspredicties		10-Nov-25	06-Jul-26	155
A2970	Opstellen trillingspredictie obv VO	10-Nov-25	05-Dec-25	20
A2770	Opstellen geluidspredicties obv eerste concept planning (keuze uitvoeringsmethode)	09-Jun-26	06-Jul-26	20
A2780	Startoverleg VTH tbv keuze uitvoeringsmethode	30-Jun-26	06-Jul-26	5
WP14 - Besluitvorming		10-Nov-26	04-Jan-27	30
WP14.1 - CAR verzekering		10-Nov-26	23-Nov-26	10
A1430	Opsturen stukken naar VGA tbv C AR verzekering	10-Nov-26	23-Nov-26	10
A1460	Indienen monitoringsplan bij VGA tbv CAR verzekering	10-Nov-26		0
A1470	CAR verzekering gereed tbv GSU		23-Nov-26	0
WP14.2 - BAP toets		24-Nov-26	04-Jan-27	20
A1440	Beheer Acceptatie Proces (BAP) toets	24-Nov-26	07-Dec-26	10
A1450	Faseovergangsrapport (OG)	08-Dec-26	04-Jan-27	10
A1480	Vastgesteld Uitvoeringskrediet en Uitvoeringsbesluit		04-Jan-27	0
WP16 - Voorbereiden ON		24-Oct-25	23-Sep-27	434
WP16.1 - Detail engineering		20-Oct-26	20-Oct-26	0
A1565	UO Werkzaamheden (NTB)	20-Oct-26		0
WP16.2 - Plannen en planning		10-Nov-25	08-Feb-27	283
A2610	Start opstellen operationele plannen (na bestek gereed)		09-Nov-26	0
A2660	Operationele plannen gereed voor GSU		18-Jan-27	0
WP16.2.1 - Operationele plannen		10-Nov-25	18-Jan-27	268
Opstellen Kwaliteitsplan		10-Nov-26	18-Jan-27	40
A2470	Opstellen Kwaliteitsplan	10-Nov-26	04-Jan-27	30
A2480	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen Kwaliteitsplan	05-Jan-27	18-Jan-27	10
A2490	Stoppunt: Kwaliteitsplan gereed		18-Jan-27	0
Opstellen V&G plan uitvoering		10-Nov-26	18-Jan-27	40
A2500	Opstellen V&G plan uitvoering	10-Nov-26	04-Jan-27	30
A2510	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen V&G plan uitvoering	05-Jan-27	18-Jan-27	10
A2520	Stoppunt: V&G plan uitvoering gereed		18-Jan-27	0
Opstellen Veiligheidsplan Art 8.7		05-Jan-26	13-Mar-26	50
A1640	Opstellen Veiligheidsplan Art 8.7	05-Jan-26	13-Feb-26	30
A2450	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen Veiligheidsplan Art 8.7	16-Feb-26	27-Feb-26	10
A2570	Beoordelingstermijn bevoegd gezag	16-Feb-26	13-Mar-26	20
A2460	Stoppunt: Veiligheidsplan Art 8.7 gereed		27-Feb-26	0
Opstellen Keuringsplan		10-Nov-26	15-Jan-27	39
A1650	Opstellen en goedkeuren Keuringsplan (incl. stoppunt)	10-Nov-26	15-Jan-27	39
Opstellen Stabiliteitsberekeningen		05-Jan-26	20-Mar-26	55
A2530	Opstellen Stabiliteitsberekeningen	05-Jan-26	13-Feb-26	30
A2540	Beoordelingstermijn incl. evt aanpassen Stabiliteitsberekeningen	16-Feb-26	27-Feb-26	10
A2550	Stoppunt: Stabiliteitsberekeningen gereed		27-Feb-26	0
A2590	Toetstermijn Stabiliteitsberekeningen bevoegd gezag	02-Mar-26	20-Mar-26	15
Opstellen Vaarwegmanagementplan		10-Nov-25	01-Jun-26	130
A2555	Afstemmen werkwijze en fasering met Nautisch Beheer	10-Nov-25	19-Dec-25	30
A2560	Opstellen Vaarwegmanagementplan + afstemmen vaarwegbeheerder	15-Apr-26	01-Jun-26	30
A2580	Stoppunt: Vaarwegmanagementplan gereed		01-Jun-26	0
Opstellen Ecologisch werkprotocol		10-Nov-26	15-Jan-27	39
A1800	Opstellen en goedkeuren Ecologisch werkprotocol (incl. stoppunt)	10-Nov-26	15-Jan-27	39
WP16.2.2 - Opstellen werkplannen		19-Oct-26	08-Feb-27	70
A2600	Start opstellen werkplannen (na review op bestek)		19-Oct-26	0
A2650	Werkplannen gereed tbv GSU		14-Dec-26	0
A2400	Start opstellen werkplannen (na NOK realisatie gereed)		08-Feb-27	0

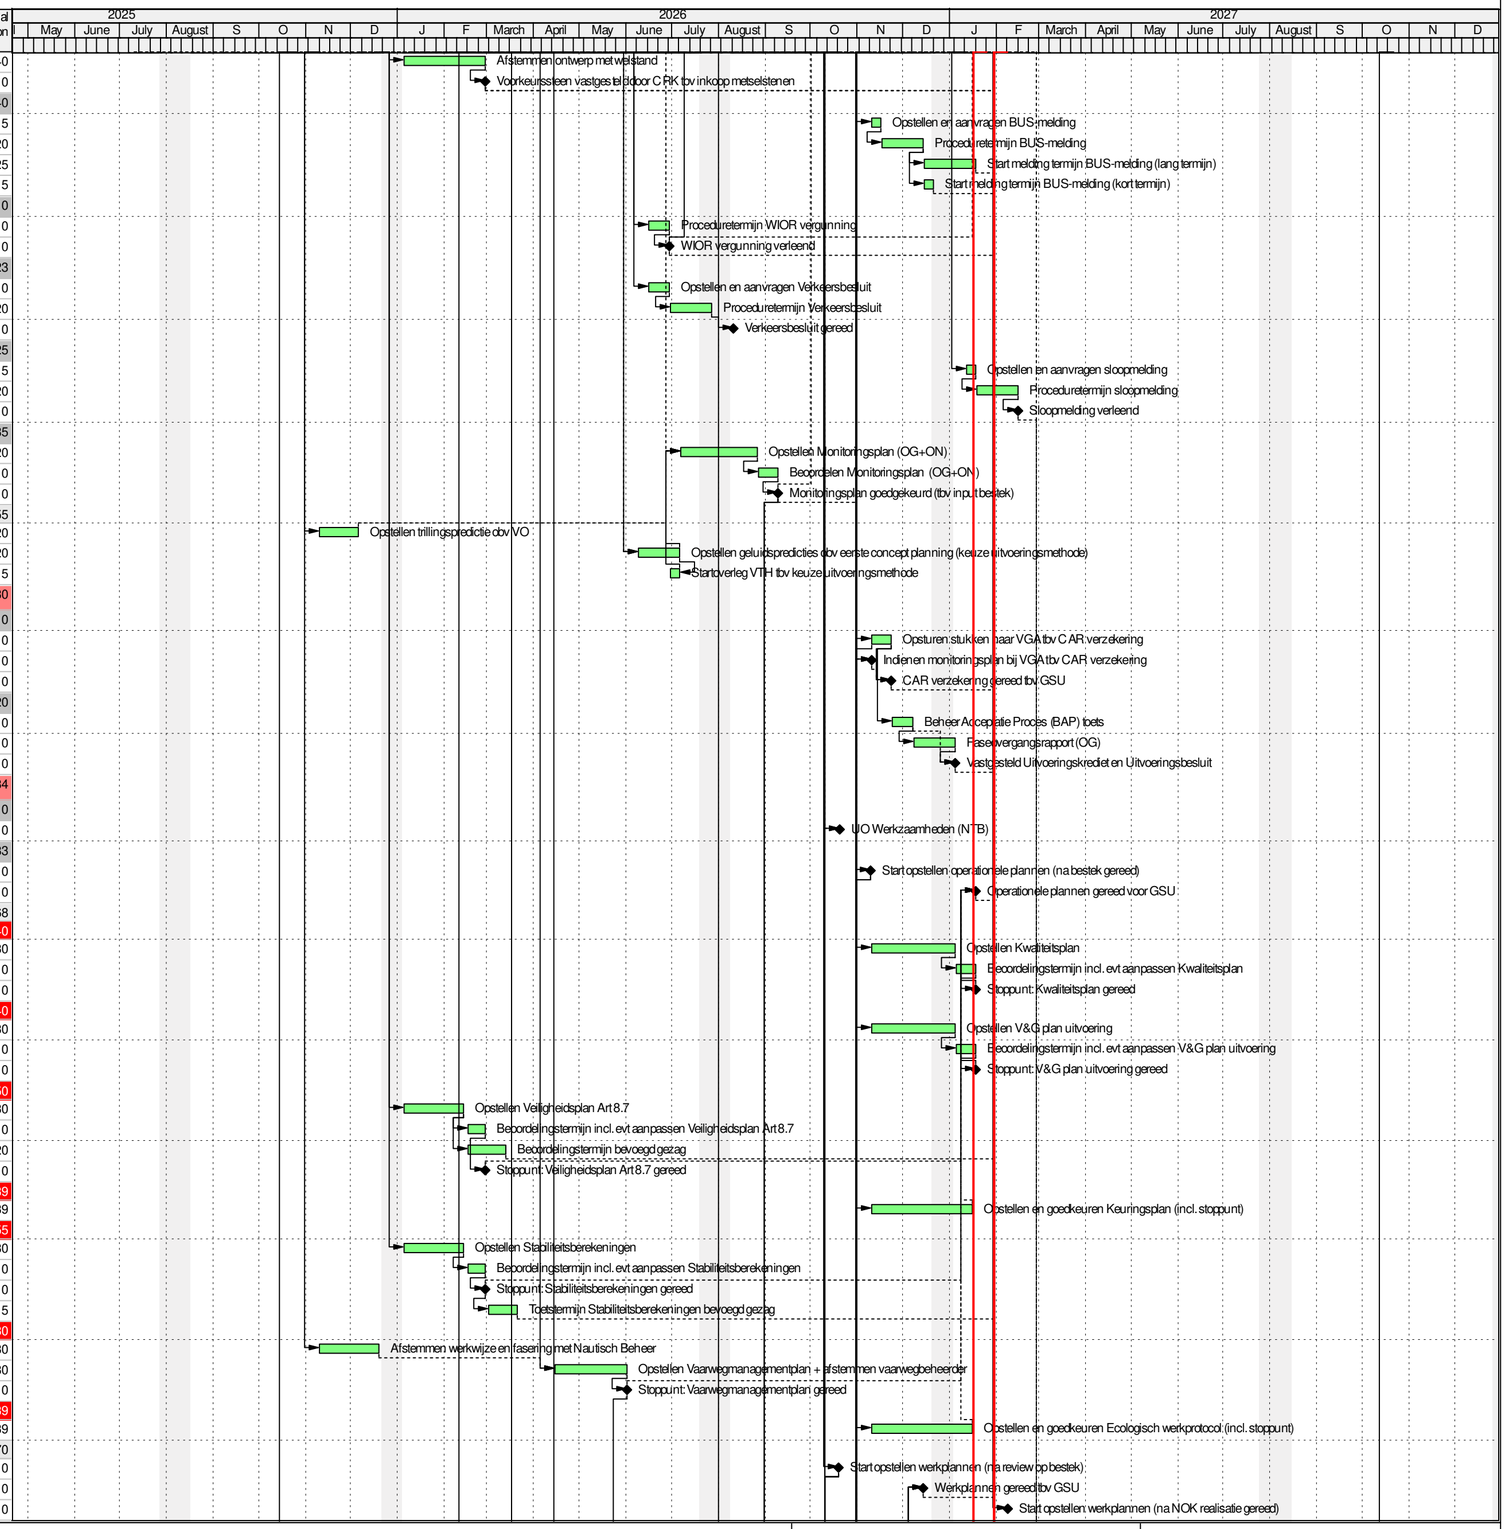

Remaining Level of Effort · Actual Work
Remaining Work · Critical Remaining Work
Actual Level of Effort · Milestone

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: NOK 5.1, 2, e
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Baseline 1.0 planning tot GSU HEG0202

Printdatum: 27-6-2025

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration
WPL01 Aanbrengen en verwijderen damwanden		20-Oct-26	14-Dec-26	40
A1700	Opstellen en goedkeuren WPL Aanbrengen en verwijderen damwanden	20-Oct-26	14-Dec-26	40
WPL07 Grondwerk		20-Oct-26	14-Dec-26	40
A1730	Opstellen en goedkeuren WPL Grondwerk	20-Oct-26	14-Dec-26	40
WPL13 Vrijkomende materialen		20-Oct-26	14-Dec-26	40
A1760	Opstellen en goedkeuren WPL Vrijkomendematerialen	20-Oct-26	14-Dec-26	40
WPL16 Omgang verontreinigd water en grond		20-Oct-26	14-Dec-26	40
A1780	Opstellen en goedkeuren WPL Omgang verontreinigd water en grond	20-Oct-26	14-Dec-26	40
WP16.3 - Inkoop		20-Oct-26	23-Sep-27	210
WP16.3.1 - Inkoop damwanden		20-Oct-26	01-Mar-27	85
A1810	Inkoopprocedure damwanden	20-Oct-26	16-Nov-26	20
A1820	Levertijd damwanden	17-Nov-26	01-Mar-27	65
WP16.3.2 - Inkoop boorpalen (incl. boorpunten)		20-Oct-26	22-Mar-27	100
A1830	Inkoopprocedure boorpalen (incl. boorpunten)	20-Oct-26	16-Nov-26	20
A1840	Levertijd boorpalen (incl. boorpunten)	17-Nov-26	22-Mar-27	80
WP16.3.3 - Inkoop wapening		09-Feb-27	25-May-27	70
A1850	Inkoopprocedure wapening	09-Feb-27	08-Mar-27	20
A1860	Levertijd wapening	09-Mar-27	25-May-27	50
WP16.3.4 - Inkoop metselstenen		09-Feb-27	06-Sep-27	127
A1870	Inkoopprocedure metselstenen	09-Feb-27	08-Mar-27	20
A1880	Levertijd metselstenen	09-Mar-27	06-Sep-27	130
WP16.3.5 - Inkoop maaiveldinrichting		09-Feb-27	06-Jul-27	100
A1890	Inkoopprocedure maaiveldinrichting	09-Feb-27	22-Mar-27	30
A1900	Levertijd maaiveldinrichting	23-Mar-27	06-Jul-27	70
WP16.3.6 - Inkoop natuurstenen dekstenen		09-Feb-27	23-Sep-27	140
A1910	Inkoopprocedure natuurstenen dekstenen	09-Feb-27	22-Feb-27	10
A1920	Levertijd natuurstenen dekstenen	23-Feb-27	23-Sep-27	130
WP16.3.7 - Inkoop bomengrond		09-Feb-27	22-Jun-27	90
A1930	Inkoopprocedure bomengrond	09-Feb-27	08-Mar-27	20
A1940	Levertijd bomengrond	09-Mar-27	22-Jun-27	70
WP16.3.8 - Inkoop betonwerk		09-Feb-27	08-Jun-27	80
A2810	Inkoopprocedure betonwerk	09-Feb-27	22-Feb-27	10
A2820	Levertijd betonwerk	23-Feb-27	08-Jun-27	70
WP16.3.9 - Inkoop dekstenen		09-Feb-27	08-Jun-27	80
A2830	Inkoopprocedure dekstenen	09-Feb-27	22-Feb-27	10
A2840	Levertijd dekstenen	23-Feb-27	08-Jun-27	70
WP16.3.10 - Inkoop onderaanneming maaiveldinrichting		09-Feb-27	10-May-27	60
A2850	Inkoopprocedure onderaanneming maaiveldinrichting	09-Feb-27	22-Mar-27	30
A2860	Overeenkomst sluiten onderaanneming maaiveldinrichting	23-Mar-27	10-May-27	30
WP16.3.11 - Inkoop onderaanneming ridering		09-Feb-27	10-May-27	60
A2870	Inkoopprocedure onderaanneming riolering	09-Feb-27	22-Mar-27	30
A2880	Overeenkomst sluiten onderaanneming riolering	23-Mar-27	10-May-27	30
WP16.3.12 - Inkoop sloopwerk		09-Feb-27	10-May-27	60
A2940	Inkoopprocedure onderaanneming sloopwerk	09-Feb-27	22-Mar-27	30
A2950	Overeenkomst sluiten onderaanneming sloopwerk	23-Mar-27	10-May-27	30
WP16.4 - Vergunningen (VOTBM) ON		24-Oct-25	08-Feb-27	294
A2229	Start aanvragen vergunningen ON		09-Nov-26	0
A2230	Vergunningen ON tbv GSU verleend		14-Dec-26	0
WP16.4.1 - Objectenvergunning		10-Nov-26	23-Nov-26	10
A2730	Opstellen en aanvragen objectenvergunning bouwplaatsinrichting	10-Nov-26	16-Nov-26	5
A2740	Proceduretermijn objectenvergunning bouwplaatsinrichting	17-Nov-26	23-Nov-26	5
A2750	Objectenvergunning bouwplaatsinrichting verleend		23-Nov-26	0
WP16.4.2 - Ontheffing geluidhinder		10-Sep-26	14-Oct-26	25
A1970	Opstellen en aanvragen ontheffing geluidhinder	10-Sep-26	16-Sep-26	5
A1980	Proceduretermijn ontheffing geluidhinder	17-Sep-26	14-Oct-26	20
A2090	Geluidsontheffing verleend		14-Oct-26	0
WP16.4.3 - Ontheffing trillen		10-Sep-26	14-Oct-26	25
A1990	Opstellen en aanvragen ontheffing trillen	10-Sep-26	16-Sep-26	5
A2000	Proceduretermijn ontheffing trillen	17-Sep-26	14-Oct-26	20
A2100	Ontheffing trillen verleend		14-Oct-26	0
WP16.4.5 - BLBI meldingen		10-Nov-26	14-Dec-26	25
A2030	Opstellen en aanvragen BLBI meldingen	10-Nov-26	16-Nov-26	5
A2040	Proceduretermijn BLBI meldingen	17-Nov-26	14-Dec-26	20
A2120	BLBI meldingen verleend		14-Dec-26	0
WP16.4.6 - Tijdelijke Verkeers Maatregelen		26-Jan-27	08-Feb-27	10
A2910	Proceduretijd aanvragen TVM's (obv mondelinge overeenkomst NOK Realisatie)	26-Jan-27	08-Feb-27	10
WP16.4.7 - Aanvragen bouwaansluiting		24-Oct-25	26-Jun-26	160
A2900	Aanvraagperiode bouwaansluiting	24-Oct-25	26-Jun-26	160
WP16.5 - Vaarweg- en wegmanagment		02-Jun-26	07-Sep-26	53
WP16.5.1 - Nautische ontheffingen		02-Jun-26	07-Sep-26	53
A2150	Proceduretermijn Nautische ontheffingen	02-Jun-26	27-Jul-26	40
A2160	Nautische ontheffingen verleend		11-Aug-26	0
A2630	Inkoop Nautische beboring en plaatsen beboring	11-Aug-26	24-Aug-26	10

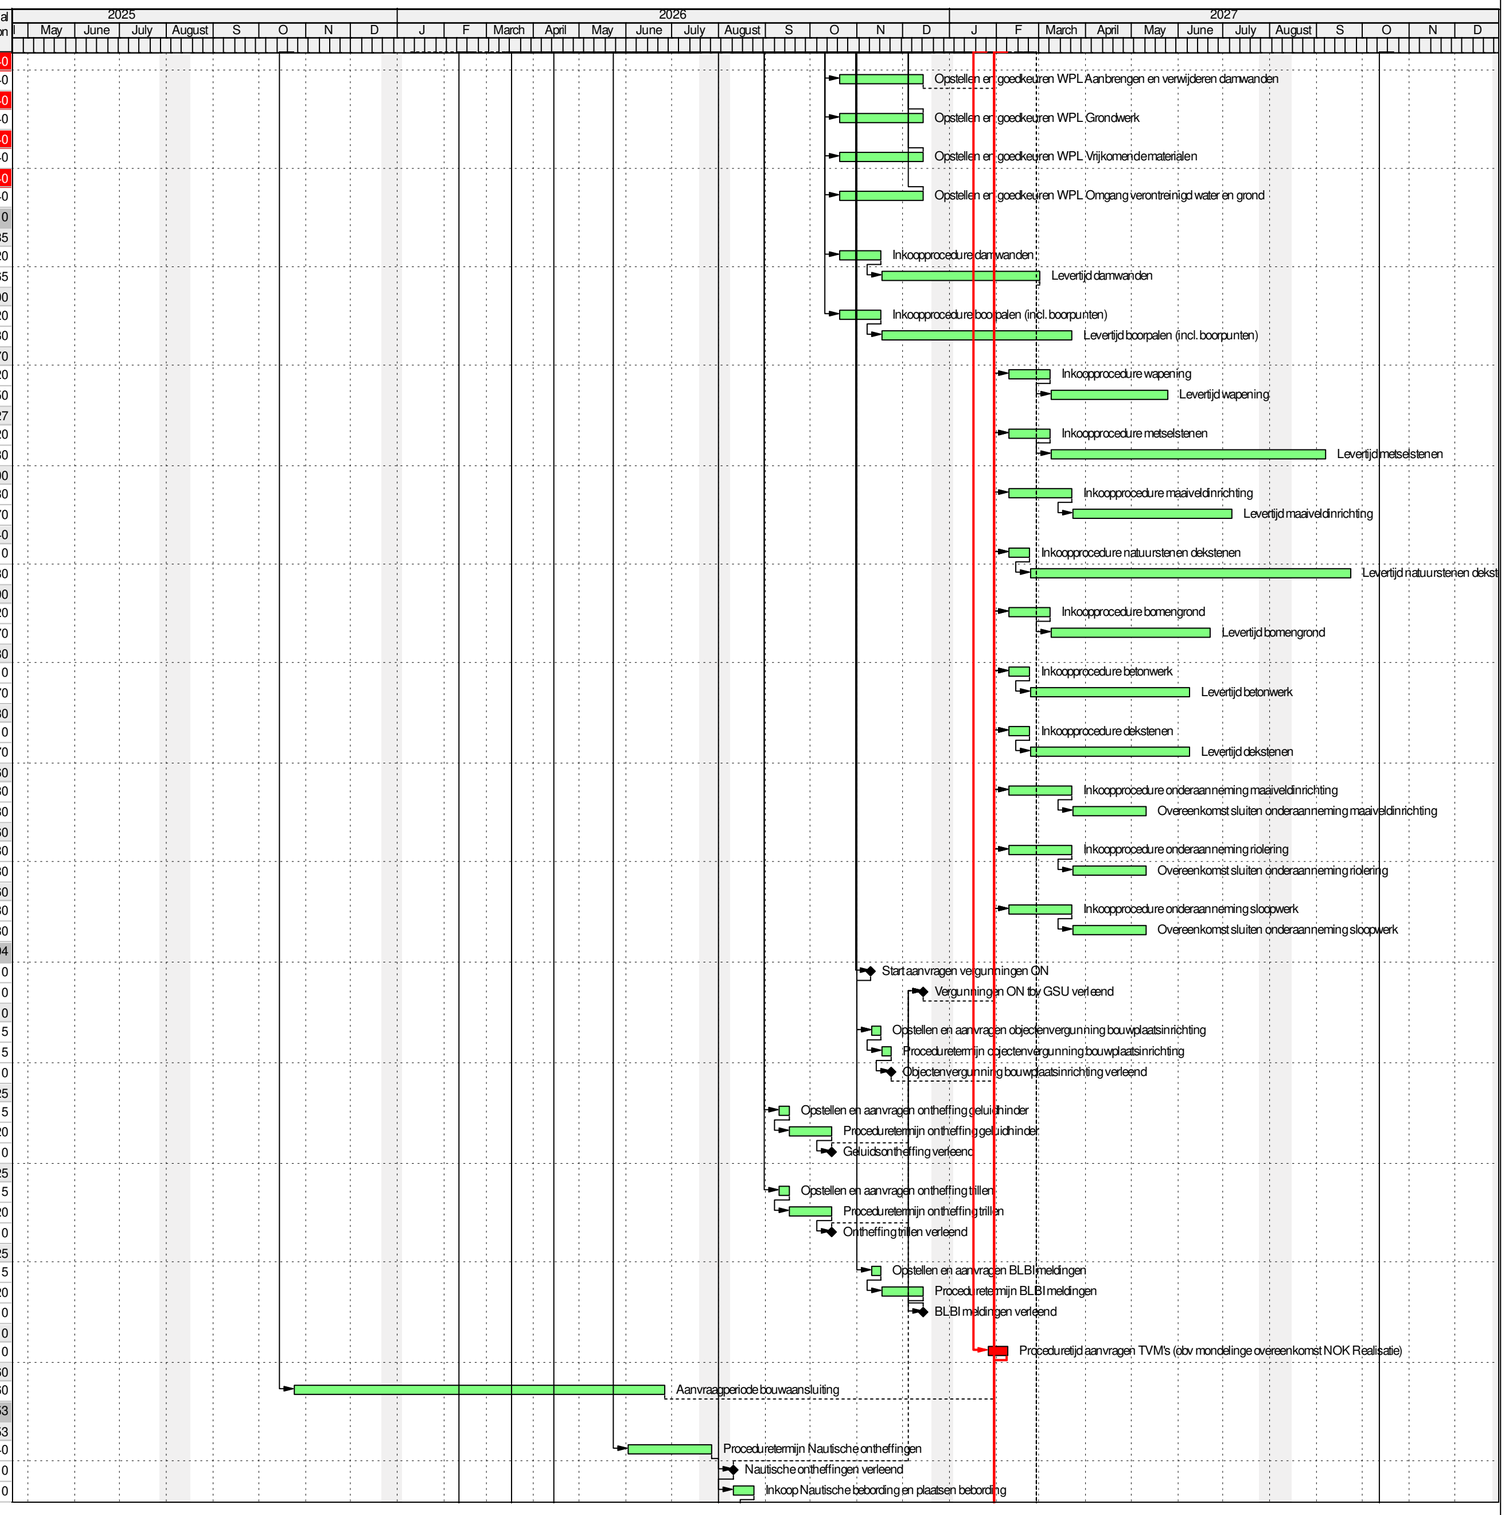

Remaining Level of Effort
Remaining Work
Actual Level of Effort
Actual Work
Critical Remaining Work
Milestone

Programma: SOK Kademakers Amsterdam
Project: NOK 5.1, 2, e
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Projectplanning - Herengracht 107-169 Planning tot GSU

Baseline 1.0 planning tot GSU HEG0202

Printdatum: 27-6-2025

Gemeente Amsterdam | Beens Groep | COUNT & COOPER

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration
A2640	Vooraankondigingstermijn Nautische beboring	25-Aug-26	07-Sep-26	10
WP17 - Uitvoering derden		20-Feb-26	18-Nov-27	399
WP17.1 - Uitvoering K&L		20-Feb-26	18-Nov-27	399
A4170	Werkzaamheden mbt KPN	20-Feb-26	18-Jun-26	85
A4190	K&L werkzaamheden algemeen (overige nutsaansluitingen | huisaansluiting woonboot HGR125)	27-Mar-26	15-Sep-26	100
A4180	Werkzaamheden mbt OVL (tijdelijk verplaatsen)	24-Apr-26	22-Oct-26	130
A2960	Werkzaamheden mbt kast Liander (werkzaamheden NTB vóór of tijdens uitvoering)	22-Oct-27	18-Nov-27	20
WP17.2 - Uitvoering bomen		11-Aug-26	19-Oct-26	50
A2165	Opdrachtverlening en voorbereiding groenaannemer	11-Aug-26	05-Oct-26	40
A2170	Kappen/verplanten bomen HGR 2 (kappen tussen 1 okt en 1 mrt)	06-Oct-26	19-Oct-26	10
WP18 - Uitvoering ON		09-Feb-27	15-May-29	543
A2180	GSU HGR 2	09-Feb-27		0
A2185	Inrichten bouwplaats	09-Feb-27	08-Mar-27	20
A2175	Voorbereidede werkzaamheden (afroepen mensen en materieel etc.) na overeenkomen NOK Realisatie voor GSU	09-Feb-27	08-Mar-27	20
A2195	Uitvoering HGR 2 (uitvoeringsduur NTB)	09-Mar-27	15-May-29	523

