
Metrostationslocatie

Tjerk Hoving
Projectmanagementbureau
t.hoving@amsterdam.nl
06-13403823

Activity ID	Activity Name	Contract	Aantal weken	Start	Finish
Overtoomse Veld Metrostationslocatie Postjesweg (nieuw)			240w	19-Feb-14 A	26-Sep-18
Financieel kader			0w	19-Feb-14 A	19-Feb-14 A
1000	GREX vastgesteld		0w		19-Feb-14 A
Bestemmingsplan			0w	23-Apr-14 A	23-Apr-14 A
1010	Bestemmingsplan vastgesteld		0w		23-Apr-14 A
Selectie ontwikkelaar			81w	03-Mar-15 A	15-Sep-16 A
Optieovereenkomst SD - ontwikkelaar			0w	03-Mar-15 A	03-Mar-15 A
1020	Optieovereenkomst gesloten		0w	03-Mar-15 A	
1030	Ontwikkelaar geselecteerd		0w	03-Mar-15 A	
Sluiten optieovereenkomst			66w	15-Jun-15 A	15-Sep-16 A
1040	Ingangsdatum		0w	15-Jun-15 A	15-Jun-15 A
1050	Optieovereenkomst beeindigd	✓	0w	15-Sep-16 A	15-Sep-16 A
Voorbereidingen nieuwbouw			32w	29-Apr-16 A	08-Dec-16
Erfpachtovereenkomst			28w	29-Apr-16 A	09-Nov-16 A
1060	Start erfpachtovereenkomst		0w	29-Apr-16 A	
1070	Opstellen erfpachtovereenkomst		11w	24-Jun-16 A	19-Aug-16 A
1080	Verzenden erfpachtovereenkomst		0w	19-Aug-16 A	
1090	Acceptatie erfpachtovereenkomst door de erfpachter	✓	7w	22-Aug-16 A	27-Sep-16 A
1100	Geaccepteerde erfpachtovereenkomst		0w		27-Sep-16 A
1110	Besluitvorming erfpachtovereenkomst	✓	3w	27-Sep-16 A	17-Oct-16 A
1120	Passeren akte door notaris		3w	21-Oct-16 A	09-Nov-16 A
1130	Erfpachtovereenkomst gereed		0w		09-Nov-16 A
Omgevingsvergunning bouwen			32w	02-May-16 A	08-Dec-16
1140	Omgevingsvergunning voorbereiden		4w	02-May-16 A	25-May-16 A
1150	Behandelen t/m verlenen omgevingsvergunning	✓	8w	24-Jun-16 A	27-Oct-16 A
1160	Start omgevingsvergunning		0w	24-Jun-16 A	
1180	Omgevingsvergunning verleend		0w		27-Oct-16 A
1170	AWB termijn	✓	6w	28-Oct-16 A	08-Dec-16
Grondhuurovereenkomst			2w	15-Nov-16	28-Nov-16
1190	Opstellen (door GZ)		2w	15-Nov-16	28-Nov-16
1200	Grondhuurovereenkomst getekend door bouwer		0w		28-Nov-16
Uitvoering nieuwbouw			87w	01-Nov-16 A	27-Jun-18
1210	Levering bouwrijpe grond		0w	01-Nov-16 A	
1220	BLVC-plan updaten (n.a.v. verandering bouwweg)		1w	15-Nov-16	21-Nov-16
1230	Start bouw		0w	01-Dec-16*	
1240	Uitvoering bouw	✓	68w	01-Dec-16	21-Mar-18
1250	Behandeling WWU		0w	07-Dec-16	07-Dec-16
1260	Oplevering	✓	14w	22-Mar-18	27-Jun-18
Woonrijp maken			126w	02-May-16 A	26-Sep-18
Ontwerp			33w	02-May-16 A	20-Dec-16
1270	Opstellen maaiveldontwerp		20w	02-May-16 A	16-Sep-16 A
1280	Vaststellen VO in projectgroep		0w	18-Oct-16 A	
1290	VO bespreken met buurt		0w	25-Oct-16 A	
1300	Opstellen DO maaiveld		4w	25-Oct-16 A	22-Nov-16
1310	Vaststellen DO in projectgroep		0w	22-Nov-16	
1320	Voorleggen DO ter besluitvorming (staf Mauer + Bobeldijk)		0w	05-Dec-16	06-Dec-16
1330	Voorleggen DO ter besluitvorming (DB)		1w	13-Dec-16	20-Dec-16
Voorbereiding			57w	15-Nov-16	18-Dec-17
1340	Toetsing adviseurs & kosten	✓	2w	15-Nov-16*	28-Nov-16
1350	Opstellen bestek	✓	16w	15-Nov-16*	06-Mar-17
1360	Wenstraceprocedure		52w	21-Dec-16	18-Dec-17
Realisatie			27w	22-Mar-18	26-Sep-18
1370	Kabels en leidingen		13w	22-Mar-18	20-Jun-18
1380	Inrichting openbare ruimte		14w	21-Jun-18	26-Sep-18
1390	Project gereed		0w		26-Sep-18

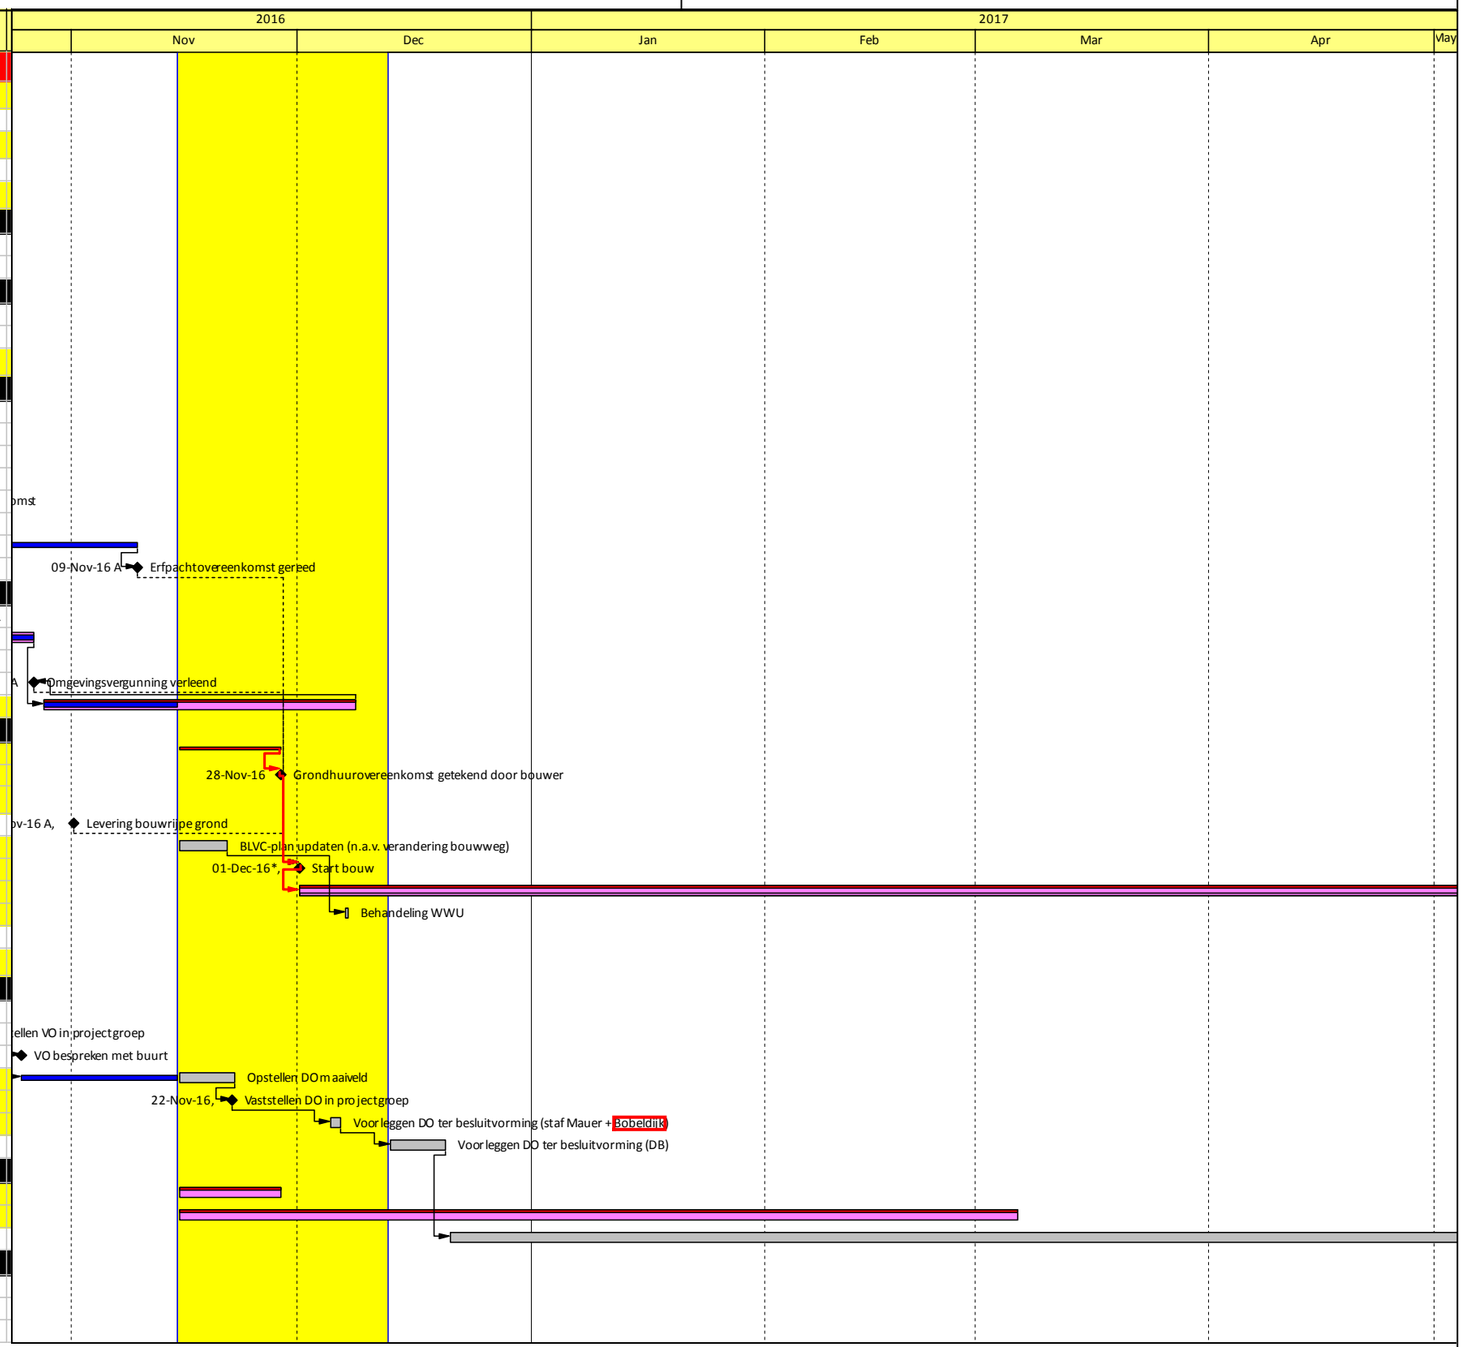

Contractplanning
Kritiek
Uitgevoerd
Nog uit te voeren
Extern
Mijlpaal

printdatum: 06-Dec-16
Page 1 of 1
standlijn: 15 november 2016
Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend
