Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: XYZ deformatiemeting

BouwRisk®

nr		Nulmeting (0) 5/10-7-2017	verschil Antea	HH meting 1 (1) 29-11-2017	verschil (1-0) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 2 (2) 20-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
101	X	82,361		82,363	2	2	82,362	1	-1	1						
	Y	101,107		101,106	-1	-1	101,104	-3	-1	-3						
	Z	0,974		0,976	2	2	0,974	0	-1	0						
102	X	83,683		83,686	3	3	83,685	2	-1	2						
	Y	99,741		99,740	-1	-1	99,737	-4	-2	-4						
	Z	0,896		0,897	1	1	0,896	0	-1	0						
103	X	100,000		100,001	1	1	100,000	0	-2	0						
	Y	100,000		99,999	-1	-1	99,997	-3	-3	-3						
	Z	0,397		0,398	1	1	0,396	0	-1	0						
104	X	113,226		113,227	1	1	113,226	0	-1	0						
	Y	99,974		99,972	-1	-1	99,971	-3	-1	-3						
	Z	0,401		0,402	1	1	0,400	-2	-2	-2						
105	X	113,723		113,726	3	3	113,725	2	-1	2						
	Y	100,211		100,207	-4	-4	100,205	-6	-2	-6						
	Z	0,416		0,417	1	1	0,416	0	-1	0						
106	X	122,609		122,611	2	2	122,611	2	0	2						
	Y	100,191		100,188	-4	-4	100,184	-7	-4	-7						
	Z	0,410		0,411	1	1	0,409	0	-1	0						
107	X	131,520		131,521	1	1	131,520	0	-1	0						
	Y	100,208		100,204	-4	-4	100,200	-8	-4	-8						
	Z	0,419		0,420	1	1	0,420	0	-1	0						
108	X	140,309		140,309	0	0	140,308	-1	-1	-1						
	Y	100,222		100,218	-4	-4	100,216	-6	-3	-6						
	Z	0,411		0,412	1	1	0,411	-1	-2	-1						
109	X	151,101		151,100	-1	-1	151,098	-3	-2	-3						
	Y	100,169		100,166	-3	-3	100,163	-6	-3	-6						
	Z	0,409		0,411	1	1	0,410	0	-1	0						
110	X	160,803		160,800	-3	-3	160,798	-5	-2	-5						
	Y	100,129		100,126	-3	-3	100,124	-5	-2	-5						
	Z	0,408		0,409	1	1	0,407	-1	-2	-1						

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: XYZ deformatiemeting

BouwRisk®

nr		Nulmeting (0) 5/10-7-2017	verschil Antea	HH meting 1 (1) 29-11-2017	verschil (1-0) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 2 (2) 20-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
111	X	171,586	-12	171,582	-4	-16	171,580	-6	-2	-18						
	Y	100,107	1	100,104	-3	-2	100,102	-5	-2	-4						
	Z	0,399	-3	0,401	2	-1	0,400	1	-1	-2						
112	X	173,319		173,317	-2	-2	173,316	-4	-2	-4						
	Y	100,143		100,140	-2	-2	100,139	-4	-1	-4						
	Z	0,391		0,392	1	1	0,391	0	-1	0						
113	X	181,358		181,355	-2	-2	181,354	-4	-1	-4						
	Y	100,243		100,242	-2	-2	100,240	-3	-2	-3						
	Z	0,394		0,395	1	1	0,395	0	0	0						
114	X	187,620		n.t.m.		0	187,618	-2		-2						
	Y	100,088		n.t.m.		0	100,085	-4		-4						
	Z	0,393		n.t.m.		0	0,393	0		0						
115	X	198,060		198,058	-2	-2	198,057	-3	-1	-3						
	Y	100,188		100,188	0	0	100,185	-3	-3	-3						
	Z	0,404		0,405	1	1	0,404	0	-1	0						
116	X	208,597		208,599	2	2	208,594	-4	-5	-4						
	Y	100,111		100,117	6	6	100,109	-2	-8	-2						
	Z	0,410		0,411	0	0	0,410	0	0	0						
117	X	221,009		221,008	-1	-1	221,006	-3	-2	-3						
	Y	100,057		100,057	0	0	100,053	-4	-3	-4						
	Z	0,412		0,413	2	2	0,412	0	-2	0						
118	X	231,554		231,554	0	0	231,551	-3	-3	-3						
	Y	100,039		100,042	3	3	100,038	-1	-5	-1						
	Z	0,413		0,413	0	0	0,412	0	0	0						
119	X	240,425		240,421	-4	-4	240,420	-4	-1	-4						
	Y	100,052		100,053	0	0	100,049	-4	-4	-4						
	Z	0,404		0,405	1	1	0,404	-1	-2	-1						
120	X	249,227		249,224	-2	-2	249,223	-3	-1	-3						
	Y	100,022		100,024	2	2	100,021	-1	-3	-1						
	Z	0,407		0,408	1	1	0,406	-1	-2	-1						

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: XYZ deformatiemeting

BouwRisk®

nr		Nulmeting (0) 5/10-7-2017	verschil Antea	HH meting 1 (1) 29-11-2017	verschil (1-0) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 2 (2) 20-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
121	X	261,560		261,559	-1	-1	261,558	-2	-1	-2						
	Y	100,000		100,000	0	0	99,997	-3	-3	-3						
	Z	0,458		0,459	1	1	0,459	0	-1	0						
122	X	270,586		270,585	-1	-1	270,582	-4	-2	-4						
	Y	100,180		100,183	2	2	100,181	0	-2	0						
	Z	0,463		0,463	0	0	0,462	-2	-1	-2						
123	X	276,145		276,143	-2	-2	276,141	-4	-2	-4						
	Y	100,084		100,086	2	2	100,085	1	-1	1						
	Z	0,510		0,509	-1	-1	0,507	-3	-1	-3						
124	X	281,667		281,664	-3	-3	281,661	-6	-3	-6						
	Y	99,192		99,196	4	4	99,195	2	-2	2						
	Z	0,634		0,635	1	1	0,634	0	-1	0						
125	X	287,787		287,786	0	0	287,784	-3	-2	-3						
	Y	96,813		96,812	-1	-1	96,810	-3	-3	-3						
	Z	0,775		0,776	0	0	0,775	-1	-1	-1						
126	X	291,918		291,918	0	0	291,916	-2	-2	-2						
	Y	94,443		94,441	-2	-2	94,440	-3	-1	-3						
	Z	0,931		0,932	1	1	0,930	-1	-2	-1						
127	X	296,951		296,951	0	0	296,950	-1	-1	-1						
	Y	90,484		90,483	-1	-1	90,481	-3	-2	-3						
	Z	1,098		1,098	0	0	1,097	-1	-1	-1						
128	X	300,560		300,557	-3	-3	300,555	-5	-2	-5						
	Y	86,536		86,535	0	0	86,535	-1	0	-1						
	Z	1,183		1,183	0	0	1,182	-1	-1	-1						
129	X	304,298		304,299	1	1	304,299	1	0	1						
	Y	80,804		80,805	1	1	80,804	0	-1	0						
	Z	1,305		1,305	0	0	1,305	0	-1	0						
130	X	306,451		306,454	3	3	306,455	4	1	4						
	Y	75,632		75,633	1	1	75,632	0	-1	0						
	Z	1,500		1,500	0	0	1,502	2	2	2						

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: XYZ deformatiemeting

BouwRisk®

nr		Nulmeting (0) 5/10-7-2017	verschil Antea	HH meting 1 (1) 29-11-2017	verschil (1-0) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 2 (2) 20-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	verschil Antea + BR	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
131	X	306,592		306,596	4	4	306,596	4	0	4						
	Y	75,011		75,010	0	0	75,010	-1	-1	-1						
	Z	1,541		1,540	-1	-1	1,543	1	2	1						
132	X	308,585		308,579	-6	-6	308,580	-5	1	-5						
	Y	68,526		68,523	-4	-4	68,521	-5	-1	-5						
	Z	1,701		1,700	-1	-1	1,702	1	2	1						
133	X	309,338		309,337	-1	-1	309,337	-1	0	-1						
	Y	64,115		64,112	-3	-3	64,111	-3	-1	-3						
	Z	1,807		1,808	1	1	1,809	2	1	2						
134	X	309,897		309,895	-3	-3	309,895	-3	0	-3						
	Y	58,041		58,039	-2	-2	58,038	-3	-1	-3						
	Z	1,972		1,973	1	1	1,975	3	2	3						
135	X	309,925		309,921	-4	-4	309,920	-4	0	-4						
	Y	57,357		57,354	-2	-2	57,354	-3	-1	-3						
	Z	1,972		1,974	2	2	1,975	3	1	3						
136	X	312,498		312,493	-5	-5	312,492	-6	-1	-6						
	Y	53,639		53,637	-3	-3	53,636	-3	-1	-3						
	Z	2,017		2,018	2	2	2,020	3	1	3						
137	X	323,255		323,258	3	3	323,260	5	2	5						
	Y	51,084		51,081	-3	-3	51,081	-4	-1	-4						
	Z	2,014		2,014	0	0	2,017	3	2	3						
138	X	327,004		327,004	0	0	327,007	3	2	3						
	Y	52,804		52,805	1	1	52,804	0	-1	0						
	Z	1,968		1,968	1	1	1,969	2	1	2						
139	X	327,717		327,718	1	1	327,721	4	3	4						
	Y	55,018		55,019	1	1	55,019	0	-1	0						
	Z	1,904		1,906	2	2	1,907	3	1	3						
140	X	328,796		328,798	2	2	328,801	5	3	5						
	Y	59,788		59,788	0	0	59,787	-1	-1	-1						
	Z	1,744		1,745	1	1	1,747	2	1	2						
141	X	329,738		329,741	2	2	329,743	4	2	4						
	Y	63,782		63,780	-2	-2	63,780	-2	0	-2						
	Z	1,610		1,611	0	0	1,612	1	1	1						

Opmerkingen herhalingsmetingen

Waar geen verschillen gegeven bij meting Antea, zijn de oude oude punten niet te meten of binnen meetnauwkeurigheid gemeten.

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: XYZ deformatiemeting

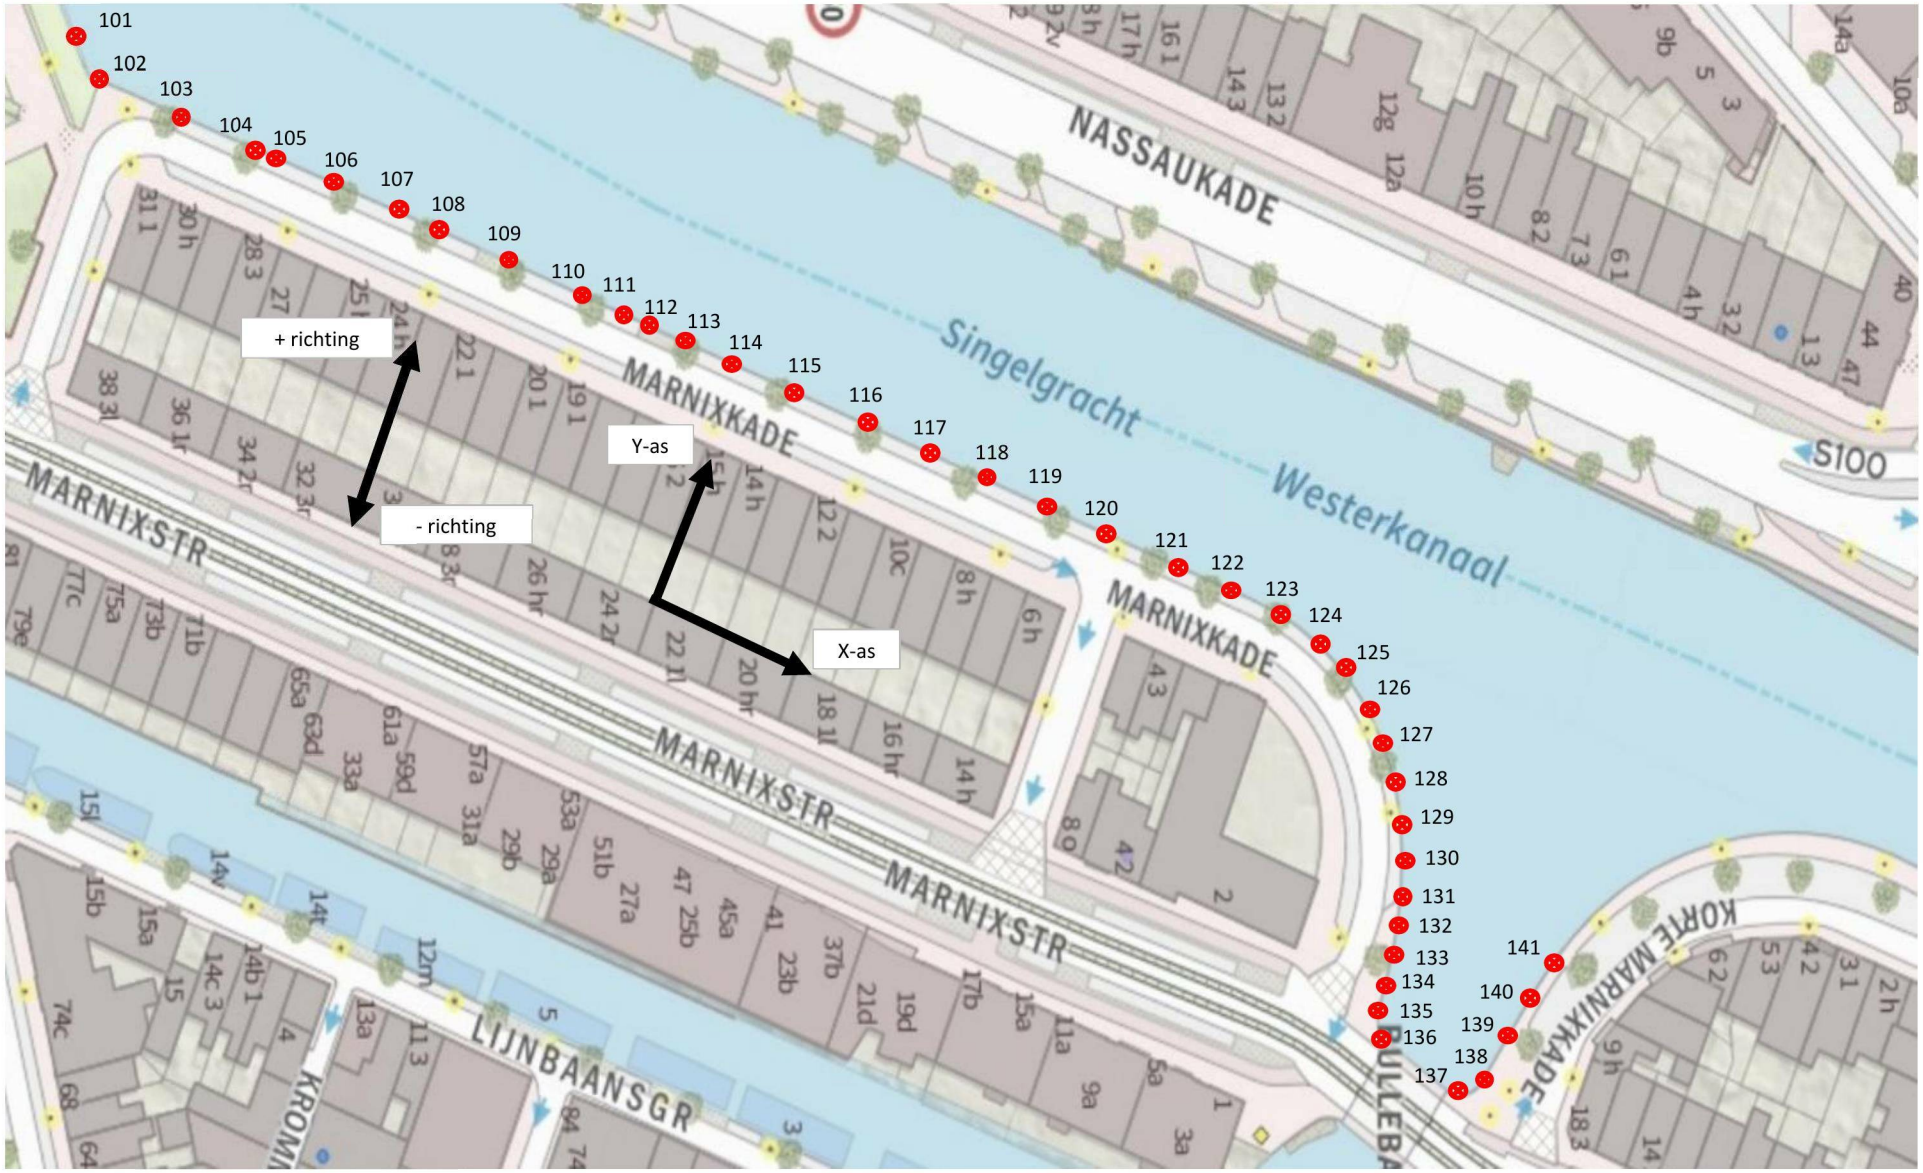

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: XYZ deformatiemeting

