Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING NHG-0201
NIEUWE HERENGRACHT LANGS DR. M. SLUYSPAD
22E HERHALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 21-02-2019

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[redacted]
adres:	Nieuwevaart 5 - 9
	1018 AA Amsterdam
opdrachtnummer:	
[redacted]	
projectnummer:	180825
projectleider:	[redacted]
landmeter:	[redacted]
datum rapportage:	25-02-2019
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	
Naam:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij NHG-0201-Nieuwe Herengracht-03-meetrapport.doc. De bijlage bevat de resultaten van de 22e herhalingsmeting in XYZ

De metingen zijn uitgevoerd op 21-02-2019.


De 1e faseberekening van de 21e herhalingsmeting van de tachymetrie is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase is aangesloten op de referentiepunten om tot een goed vergelijk te komen tot eerdere metingen.

De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerk 11380054. Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd. De berekende N.A.P. hoogten van de punten zijn allemaal gecorrigeerd met 15 mm (helft van de diameter van de oude koperen bouten) om de hoogten van alle deformatiepunten naar het midden van de deformatiepunten te brengen. De berekende hoogten zijn vervolgens gecorrigeerd met 15mm. In de tachymetrische opnamen worden de punten ook in het hart van de bout gemeten.

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand.

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting

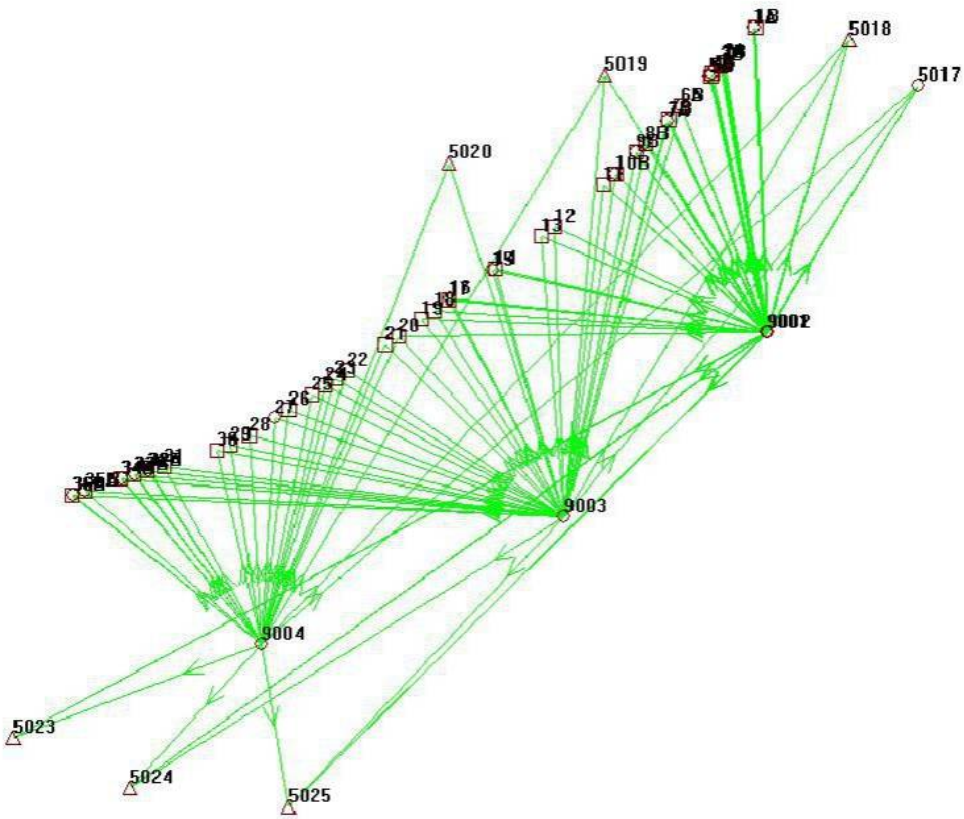

3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	
weer type	bewolkt
wind	3 Bft
lucht temp	9
constructie temp	
