SALVERDA
BOUW

Verslag 21 overleg M&A + Omgevingsdienst

Datum
22 augustus 2023

Referentie
2203-17228- v 0.21

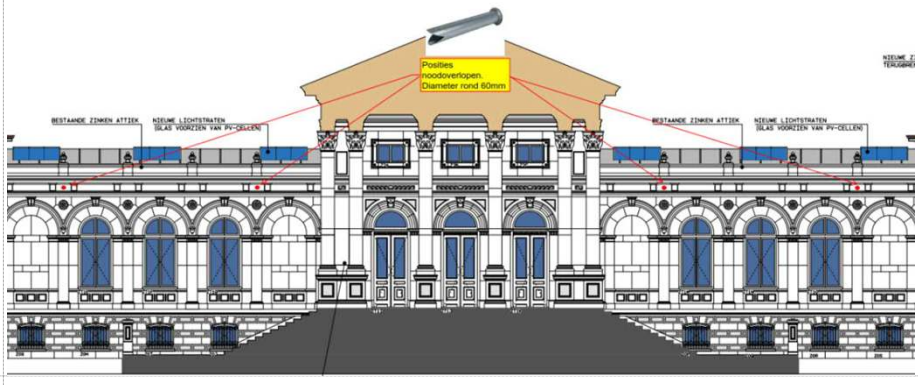
Behandeld door
5.1, 2, e

Project
S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM

Aanwezig: 11-07-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1.2e	ARTIS	
	M&A Amsterdam	5.1.2e
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
	Verlaan en Bouwstra	
	OTH	5.1.2e
5.1.2e	Salverda	
	Salverda	
	Salverda	
	BBN directievoerder	
	Venema	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
21.01	**Opening en mededelingen**	
21.01	5.1.2e heet iedereen welkom. We starten met het doornemen van het afgelopen verslag.	
21.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 11-07-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord.	
21.03	**Werkplannen**	
	Geen nieuwe meldingen.	
21.04	**Natuursteen gevel**	
	Type Natuursteen Onderzoek zandsteen, de resultaten van het TNO onderzoek zijn binnen, één type natuursteen wordt nog als monster aangeleverd, type: "*De grauw-grijze zandsteen is Cottaër zandsteen uit Saksen, afkomstig uit de groeve in Neundorf".* Tijdens de rondgang van 11 juli zijn de bemonsterde steensoorten beoordeeld, hiervan staat nog 1 actiepunt open voor de rode zandsteen: - De Eifelzandsteen komt het dichts in de buurt maar de kleur van deze steen moet meer rood zijn) Venema gaat onderzoeken of er een andere steen die meer past bij de huidige kleurstelling van de gevel, NB. voor het restauratietraject van de natuursteen gevel is dit niet in de rode draad, vanuit de opdracht wordt namelijk aan de rode steen geen inboetwerk verricht.	Cor Erik

21.04.1	-Hardsteen: het gefrijnde monster is goedgekeurd.	Vaststelling
	Reinigen Natuursteen:	
	Voortgang met de daarbij behorende kwaliteit van het eindresultaat is goed, dit wordt naar tevredenheid van alle partijen correct uitgevoerd.	
	Op één van de pilasters is een proef gedaan met de instelling op 60%. Deze is in het werk beoordeeld, resultaat lijkt goed te zijn, afgesproken is dat wanneer de werkzaamheden vorderen bij geveldeel C, een groter vlak wordt gelaserd op het percentage om te kijken of dit past bij het totale gevelbeeld	Salv/Venema
21.05	**Stucwerkgevel**	
21.05.01	Als de steiger bij het eerste deel is gedemonteerd wordt het totale gevelbeeld beoordeeld en eventueel waar nodig nog bijgekleurd.	Venema
21.06	**Daken**	
	Attiek: tekeningen en details zijn gedeeld en akkoord bevonden, productie in de werkplaats is opgestart.	Salv.
21.06.01	De goot aan de voorzijde van de jaren 90 heeft geen noodoverloop, dit geeft grote risico's op lekkage aan de binnenzijde bij eventuele verstoppingen. Voorstel is om hier 4 st. noodvoerslopen te creëren (2st. aan beide zijden van het Timpaan) e.e.a. is in het werk bekeken, en een positie is bepaald. Zie hiervoor bijgaande schets. (uitvoering ronde buis, zink, 60mm) 	Vaststelling?
21.07	**Binnenafbouw**	
16.07.1	De vier schoren t.b.v. het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. Detail nog aanleveren.	Salverda
19.07.1	Stukwerk: het stukwerk is conform gedeelde tekening verwijderd (uitvoering is hiervan gereed) de rapportage 'onderzoek bestaande stukwerk' door 5.1.2e is volledig en wordt bij oplevering van het aquarium project gedeeld gelijktijdig met alle andere onderzoeken en bevindingen.	
21.08	**Glas/Kozijnen**	
21.09	**Overige bespreekpunten**	
	Rotonda: op 9 augustus 2023 is er een overleg geweest over de rotonda met 5.1.2e (ARTIS), 5.1.2e (M&A), 5.1.2e (RCE) en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (OTH). Het overleg ging vooral over de knooppunten waar ARTIS qua	

	ontwerp en uitvoering in de bouw tegen aan lopen. Het voorstel is gedaan om de Ouendagtrap te verlagen naar het nivo van de omloop rotonda (3260+), te weten 8 optreden. Hierdoor ontstaat er weer een logische routing in dit deel van het aquariumgebouw en worden alle ruimten op een goede wijze met elkaar verbonden. Het voorstel is positief door M&A en de RCE ontvangen. Vervolgstappen: notulen van het overleg en de bijbehorende tekeningen worden door ARTIS gedeeld. 5.1.2e zal nagaan of de wijzigingen binnen de vergunning uitgevoerd kan worden of dat er nog aanvullende zaken ingediend moeten worden.	ARTIS 5.1.2e
21.10	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. Anders dan bovenstaand in het verslag besproken.	
21.11	**Volgende vergadering**	
	Volgens overleg staat gepland op: dinsdag 12 September, tijdstip 13:00uur.	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3
