From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: Uitgangspunten project Herengracht 109-169**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @beensgroep.nl>
Date August 28, 2025, 4:54:49 PM CEST

Ter info


Van: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 28 augustus 2025 13:50
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitgangspunten project Herengracht 109-169

Ha 5.1, 2, e

Sorry ik was van mening dat het om het eerdere rak ging.

Eisen zijn minimaal 25m3 per boom groeiplaats, gebruikelijk is om de gehele strook langs de kademuur als groeiplaats in te richten. Ik stuur even een goed voorbeeld mee van een technische tekening zoals wij die graag zien. Zie bijlage van deze mail.

Hieronder heb ik een dwarsdoorsnede van een groeiplaats en de bodemopbouw uit het Handboek Groen meegestuurd. Alsjeblieft hou er rekening mee met het opstellen van het bestek dat het aanleggen van de groeiplaatsen en het planten van bomen niet naar de civiele aannemer gaat maar dat wij daar een speciaal contract voor hebben -> ROK inkoop bomen

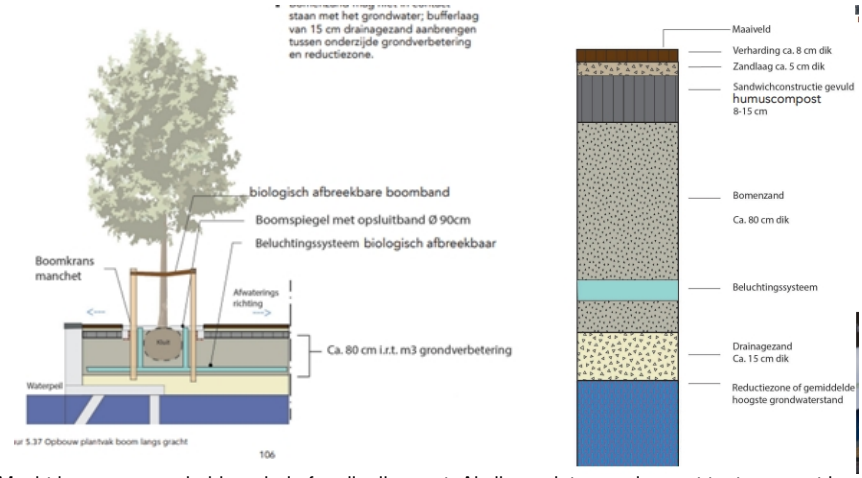

Mocht je nog vragen hebben, bel of mail mij gerust. Als ik nog iets voor je moet toetsen weet je mij te vinden!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Ingenieursbureau Amsterdam

5.1, 2, e

'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar'

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2025 16:40
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Uitgangspunten project Herengracht 109-169

Hey 5.1, 2, e

Voor project Herengracht 109-169 heb je eerder meegekeken naar het ontwerp.
Nu ben ik opzoek naar eisen om mee te nemen in het ontwerpproces
Kun je ons eisen geven waar we ons aan moeten houden?

Groet,
5.1, 2, e
5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.
