Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

SIN0401
Verkort Besluit Veiligheidsmaatregelen

Aan	5.1,2,e
Van	5.1,2,e
Opgesteld door	5.1,2,e
Kopie aan	Advies Veiligheid, Monitoring, Omgevingsmanagement, Mobiliteitsregie, Vernieuwing, Interventie & Preventie, Programmering, Stedelijk Beheer, Stadswerken, Communicatie, Programmering Vernieuwing, TCVK, Nautisch Beheer
Datum	1 oktober 2021
Ons kenmerk	Verkort BVM-SIN0401-01102021-D
Bijlage(n)	Geen

Opsteller	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	01-10-2021

Kernboodschap
De kade van het Singel tussen Blauwburgwal - Oude Leliestraat (SIN0401) verkeert blijkens een recente (duik)inspectie in slechte staat. Er zijn signalen voor een groot risico voor onaangekondigd bezwijken. Op korte termijn wordt een lastbeperking ingesteld, waarbij alle parkeervakken worden afgezet. Aangezien het een groot aantal parkeervakken betreft, en dit zeer onwenselijk is vanuit omgevingsperspectief, en vernieuwing tot dusver staat geprogrammeerd tussen 2025-2033, wordt ook besloten om een veiligheidsconstructie te ontwerpen. Indien ter zijner tijd een veiligheidsconstructie geplaatst wordt, kunnen de parkeervakken weer in gebruik worden genomen tot aan vernieuwing. In een vervolg BVM wordt tot aanvullende maatregelen besloten.

Middels ondertekening accordeert de programmadirectie de volgende maatregelen:

Actor	Asset	Maatregel	Deadline
P&I	SIN0401	Afzetten parkeervakken van huisnummer 110 t/m 158, circa 25 vakken.	4 weken
P&I	SIN0401	Voorbereiden veiligheidsconstructie	30-12-2021
Regietafel	SIN0401	Voordragen voor vernieuwing	2025-2033

Locatie

De kade van het Singel bevindt zich tussen Blauwburg wal - Oude Leliestraat. In het overzicht van Figuur 1 wordt de locatie weergegeven in detail en ten opzichte van de stad.

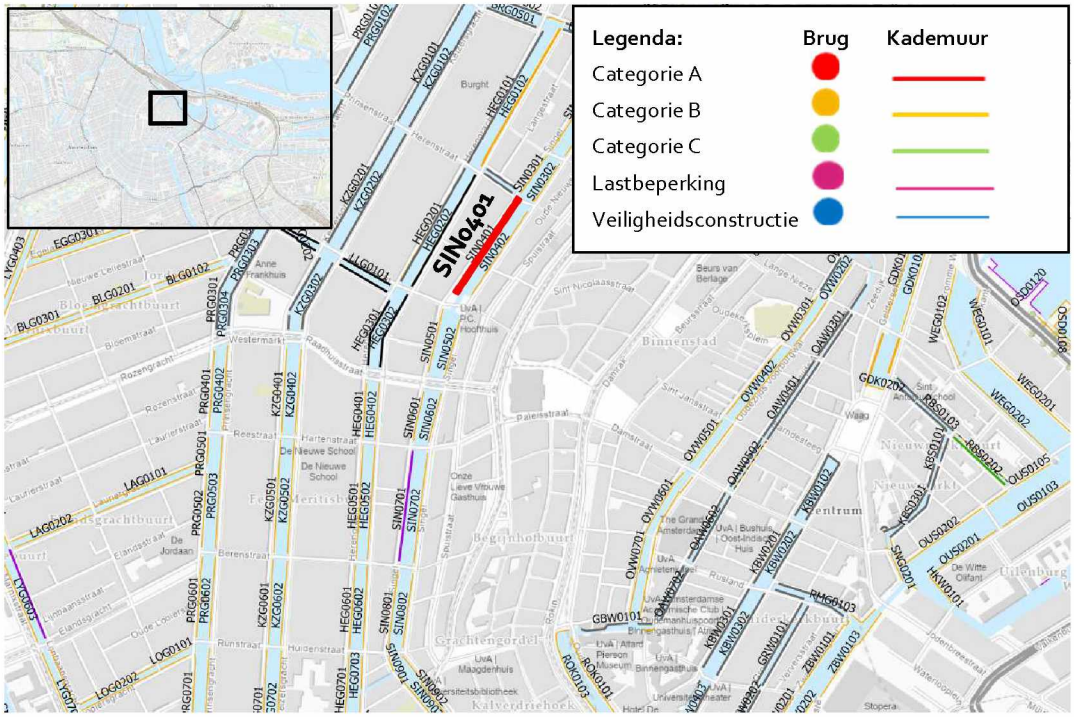

Figuur 1: locatie rak SIN0401

Besluit beheersmaatregelen

De Programmadirecteur besluit tot het treffen van de volgende beheersmaatregelen:

Beperken:
Het afzetten van circa 25 parkeervakken ter hoogte van huisnummer 110 t/m 158, tot aan het plaatsen van de veiligheidsconstructie. Uit te laten voeren door team P&I.

Versterken:
Voorbereiden van een veiligheidsconstructie van huisnummer 110 t/m 158. Uit te laten voeren door team P&I.

Bewaken:
Monitoren, uit te laten voeren door team Monitoring:

- Monitoren op deformatie van de kade door team Monitoring conform Meetstrategie kaden d.d. 20 mei 2020, versie 2 en de classificatie van team Advies Veiligheid:
    - Categorie A (12 x per jaar)

Vernieuwen:
Voordragen voor vernieuwing in 2025-2033. Opnemen van de kademuur in de vernieuwingsprogrammering met als advies uitvoering binnen 4 a 12 jaar door de Regietafel.
