Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	26 augustus 2022	2203-17228- v 0.8
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig:	Namens:	Afwezig:
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1, 2, e	ARTIS	
	M&A Amsterdam	5.1, 2, e
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1, 2, e	Verlaan en Bouwstra	
	OTH	5.1, 2, e
	Salverda	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	BBN directievoerder	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.



Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	5.1, 2, e verlaat per oktober ARTIS – 5.1, 2, e is de vervanger vanuit ARTIS	
	5.1, 2, e wordt de nieuwe hoofdconstructeur	
	Voorwaarden vanuit vergunning worden vastgelegd in planning met mijlpalen tbv borging in uitvoering	Salverda
	Vraag of er al naar de constructieve stukken van 11-7 zijn gekeken – 5.1, 2, e vraagt dit na	5.1, 2, e
	5.1, 2, e is met vakantie van 2 september t/m 2 oktober. Tijdens afwezigheid contact opnemen met: 5.1, 2, e @odnzkg.nl	
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 22-3-2022 – geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 12-4-2022 – opmerkingen per mail zijn verwerkt	
	Verslag 24-05-2022 – rondgang door Aquarium	
	Verslag 14-06-2022 – geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 05-07-2022 – geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 23-08-2022 -> samengevoegd met verslag van 13-09-2022	
1.03	**Werkplannen**	
	-- Stukje gevel als bestaand houden referentie locatie afstemmen met 5.1, 2, e en concreet voorstel doen. Wens / visie voor het vervolg stucwerk: gekeken wordt of het dekkend verfsysteem veranderd kan worden waarbij het oorspronkelijke bedoelde beeld dat natuursteen en stucwerk familiaar aan elkaar zijn. Verlaan en	5.1, 2, e Bouwstra

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @salverda.nl
www.salverda.nl

5.1, 2, f
BIC ABNANL2A
KvK 5.1, 2, f
BTW 5.1, 2, f

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

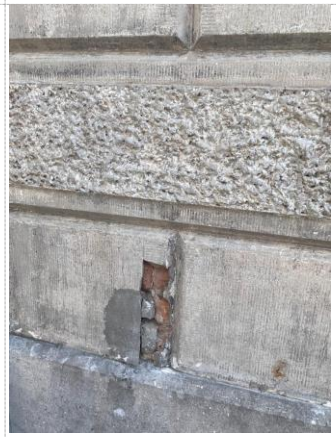
	Bouwstra is lead in dit proces. Er staan afspraken gepland voor 27-9 en 4-10 met de betrokken partijen/personen.	
	-- Werkplan stucwerkherstel opstellen na verwijderen verf – volgt is lopende actie (zie bijlagen van dit verslag)	5.1, 2, e
	Werkplannen gegevensbehoefteschema voorzien van beoordeling- en acceptatietermijnen – regelmatige update n.a.v. stand van werk – volgt is lopende actie	5.1, 2, e
	Werkplan natuursteenherstel en metselwerk herstel zijn in voorbereiding	
	Heropname rapport delen met M&A en OD -> als bijlage toegevoegd	5.1, 2, e
1.04	**Natuursteen gevel**	
	Ankers/doken detecteren verder uitwerken – voorstel en uitwerking volgt.	5.1, 2, e
	Mock-up natuursteen wordt gerealiseerd met als doel juiste steen, behandeling en opzet voor werkplan te maken locatie As J-26. Wordt opgenomen met Venema en uitwerking staat in de bijlage	5.1, 2, e
1.05	**Stucwerkgevel**	
	-- Stucwerk herstel opnemen na verwijderen verf een en ander volgens uitvoeringsplanning. Vervolg zie bijlage rapportage.	
	Verzoek M&A. verwijderen verf tot gootlijst hoek Bouwdeel A -> wordt bouwdeel C.	5.1, 2, e
1.06	**Daken**	
	In relatie tot huidige ontwikkelingen rondom prijzen en beschikbaarheid zou mogelijk een andere aanpak nodig zijn voor de daken. Ontwikkelingen worden gedeeld zodra dit nodig is.	
1.06	**Binnenafbouw**	
	Stucwerk pakketten op gevels en wanden, in ruimte 1.02 is een onbekende afwerking te zien. Onderzoek door 5.1, 2, e inplannen	5.1, 2, e
	Voorstel voor wandafwerking en detaillering volgt, aan de hand hiervan de definitieve werkzaamheden plannen.	5.1, 2, e
	Nooduitgangsbordjes zijn een belangrijk aandachtspunt voorstel komt via OTH (voorbeeld locatie in Amsterdam beschikbaar?) Gaat om esthetisch passende / verantwoorde oplossing	5.1, 2, e
1.07	**Overige bespreekpunten**	
	--	
1.08	**Rondgang bouw**	
	   Onderzoek of grind zichtbaar is vanaf oorspronkelijke bouw.	Cor



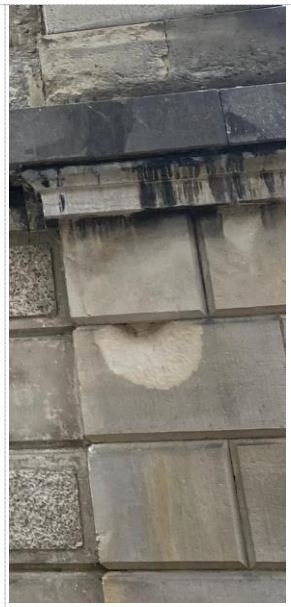
Terughoudendheid in herstel is gewenst, kritisch kijken of herstel een verbetering is. Voorbeeld hoeft niet per definitie hersteld te worden.



Bij schade aan natuursteen gaat het met name om technisch herstel. Bijvoorbeeld schade op de foto, leidt dit niet tot afbreuk dan wellicht niet herstellen.



In herstelplan goed aandacht besteden aan type schades ook met name op inwateringen en daarmee gevolgschades.

	 Dokenschade valt onder technisch herstel dit uitvoeren.	
	Bijlagen bij dit verslag: • Bloknummering natuursteen overzicht elementen_tickets • Opname staat natuursteen_bloknummering • Rapportage heropname ARTIS Aquarium • Opname rapport restauratie mockup gevelrestauratie	
