From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @vandenbiggelaar.nl>
Subject **Voortgang Cascobouw Ketelhuis -- Arie Biemondstraat Amsterdam**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @devrieswerkendam.nl>
Date September 10, 2025 at 10:56:06 AM CEST

Goedemorgen 5.1, 2, e

Hierbij een update wat betreft de voortgang van de bouwwerkzaamheden van het Ketelhuis aan de Arie Biemondstraat te Amsterdam:

- Op dit moment zijn wij op de betonvloer bezig met het aanbrengen van prefab holle wanden welke we op vrijdag a.s. voornemens zijn om deels vol te storten.
- Met deze stort zullen ook de opstorten op de betonvloer en de kolommen worden meegenomen.
- Bij deze willen wij u in de gelegenheid stellen om vandaag of morgen nog het e.e.a. te komen bekijken voorafgaand aan de stort.

Wij horen graag of u van deze gelegenheid gebruik wilt maken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Sr. Projectbegeleider

5.1,5.1. 2. e **Grond- en waterbouw**
Oude 5.1, 2, e 5.1, 2, e Velddriel
Postbus 18 5.1, 2, e Kerkdriel
T: 5.1, 2, e | M: 5.1, 2, e
5.1, 2, e @vandenbiggelaar.nl
www.vandenbiggelaar.nl

Van den Biggelaar
Grond- en waterbouw

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw is onderdeel van de Biggelaar Groep

---

Van: 5.1, 2,5.1, 2, e 5.1, 2, e @devrieswerkendam.nl>
Verzonden: vrijdag 22 augustus 2025 16:25
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e@vandenbiggelaar.nl>
Onderwerp: FW: Cascobouw Ketelhuis

Goedemiddag 5.1, 2, e

Gisteren hebben we elkaar gesproken hierbij nog een korte terugkoppeling en wat aanvullende informatie;

- Komende maandag en donderdag ben je op locatie om de voortgang (wapening) te beoordelen
- Het storten van de betonvloer is nu gepland op maandag 1 september, in verband met het monolithisch afwerken van de vloer na het storten lopen de werkzaamheden door tot ca. 00:00 uur die zelfde avond. Mijn collega 5.1, 2, e is al geruime tijd bezig met de ontheffing APV hiervoor
- In de afgelopen periode hebben we na overleg met de vlechter een aantal optimalisaties / wijzingen door gevoerd in de wapening na overleg met de constructeur (zie onder) echter zijn de laatste punten nog niet op tekening verwerkt

1) De beugels van de randbalken zijn opgedeeld in een beugel met een losse haarspeld in plaats van een gesloten beugel dit ivm het kunnen plaatsen van de wandstekken;

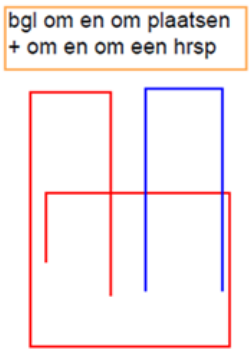

2) In verband met het conflict tussen de (wand)stekken uit de vloer en de wapening van de holle wanden zijn de stekken anders ge-maatvoerd zie tekening “ DVA-CIV-TEK-UO-501-502-503 controle stekken met wanden “

3) De wapening vloer /kolom is gewijzigd van een haarspeld naar lossen stekken

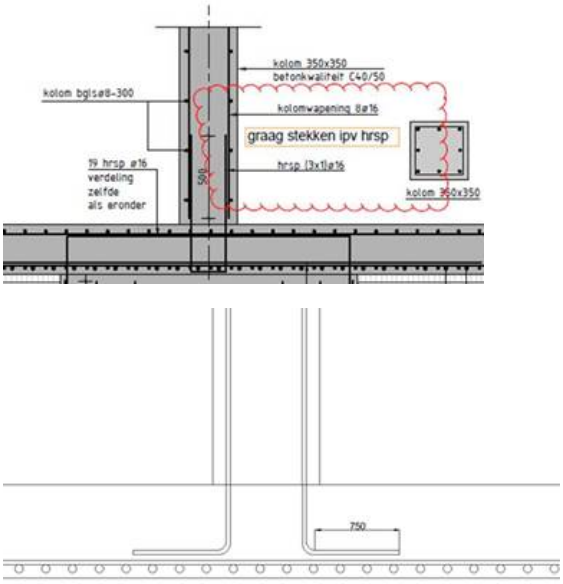

Mochten er wellicht nog meer onduidelijkheden zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag

Met vriendelijke groet,

G.J. (Gerard) 5.1, 2, e
Projectleider

DE VRIES
WERKENDAM BV

5.1, 2, e 5.1, 2, e Werkendam I M: 5.1, 2, e I E 5.1, 2, e devrieswerkendam.nl I www.devrieswerkendam.nl

---

Van: 5.1, 2,5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 20 augustus 2025 11:15
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e@vandenbiggelaar.nl>
Onderwerp: Cascobouw Ketelhuis

Goedemorgen 5.1, 2, e

Voor onze vakantie hebben we elkaar gesproken over het betonwerk van de kelder, afgelopen maandag zijn we gestart met het aanbrengen van de wapening (zie bijgevoegde foto) op basis van bijgevoegde tekeningen.

Het voornemen is 3 september de vloer te storten, hierbij dan ook de uitnodiging om voor die tijd één en ander te beoordelen, we horen graag.

Met vriendelijke groet,

G.J. (Gerard) 5.1, 2, e
Projectleider

DE VRIES
WERKENDAM BV

5.1, 2, e 5.1, 2, e Werkendam I M: 5.1, 2, e I E 5.1, 2, e devrieswerkendam.nl I www.devrieswerkendam.nl
