Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING BRUG 0063
ROZENGRACHT-WESTERMARKT
9E HERHALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 1-5-2019

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[redacted]
adres:	[redacted]
opdrachtnummer:	
GeoCensus advies- en ingenieursbureau bv	
projectnummer:	190168
projectleider:	[redacted]
landmeter:	[redacted]
datum rapportage:	8-5-2019
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij ´0063-Rozengracht-Westermarkt-04-meetrapport´. De bijlage bevat de resultaten van de 10e herhalingsmeting in XYZ.

De meting is uitgevoerd op 1-5-2019 .

De 1e faseberekening van de tiende herhalingsmeting is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase vereffening van de 6e leidde tot onacceptabele sluitfouten op de oorspronkelijke referentiepunten met als gevolg een ongewenste vervorming van het model.


In overleg met de Gemeente Amsterdam is gekozen voor een relatieve 2e fase vereffening. In de relatieve berekening zijn de punten 3002 en 8001 vastgezet ten opzichte van de vijfde herhalingsmeting en is het model schaalvast doorgerekend. Bij deze berekening zijn de referentiepunten opnieuw vastgesteld. De verschillen in het moederbestand zijn dientengevolge ten opzichte van de 5e herhalingsmeting.

De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerken 104800046 en 10480011.
Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd.

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand .

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting

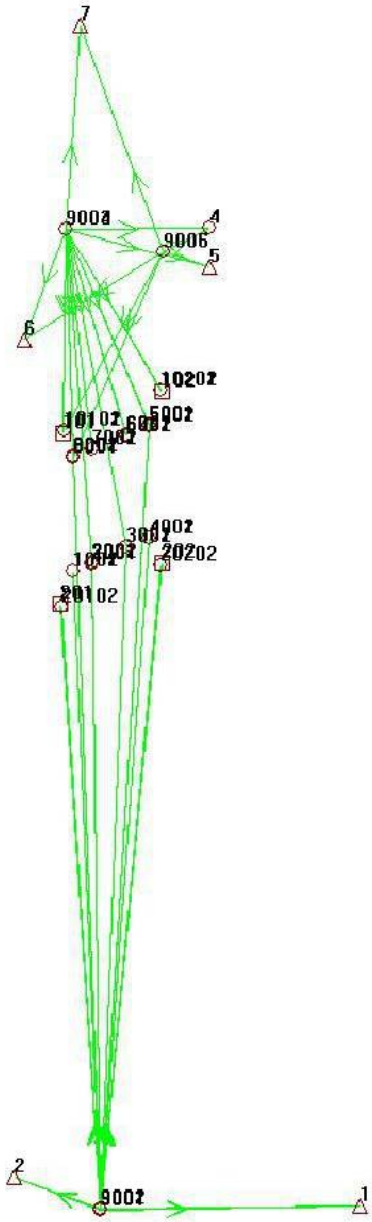

3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	1-5-2019
weer type	bewolkt
wind	2 Bft
lucht temp	14
constructie temp	
