Oevers inspectie

SIG0201

Functionele inspectie



	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld	[redacted]	3-sep-2003	
gecontroleerd			

	naam:	datum:	handtekening:
gezien	[redacted]	14-2-05	


Ligging water	Singelgracht
Ligging straat	Marnixkade
Tussen objecten	150 - 149
Tussen nummers	
Lengte	357

- Lengte 357
  Constructie walmuur-metselwerk
  Bouwjaar
  Van - Tot

niet opgedragen in 2007

wachten op meetresultaten Geo.
en resultaten inspectie 2007

9/1-2007
H. Pick

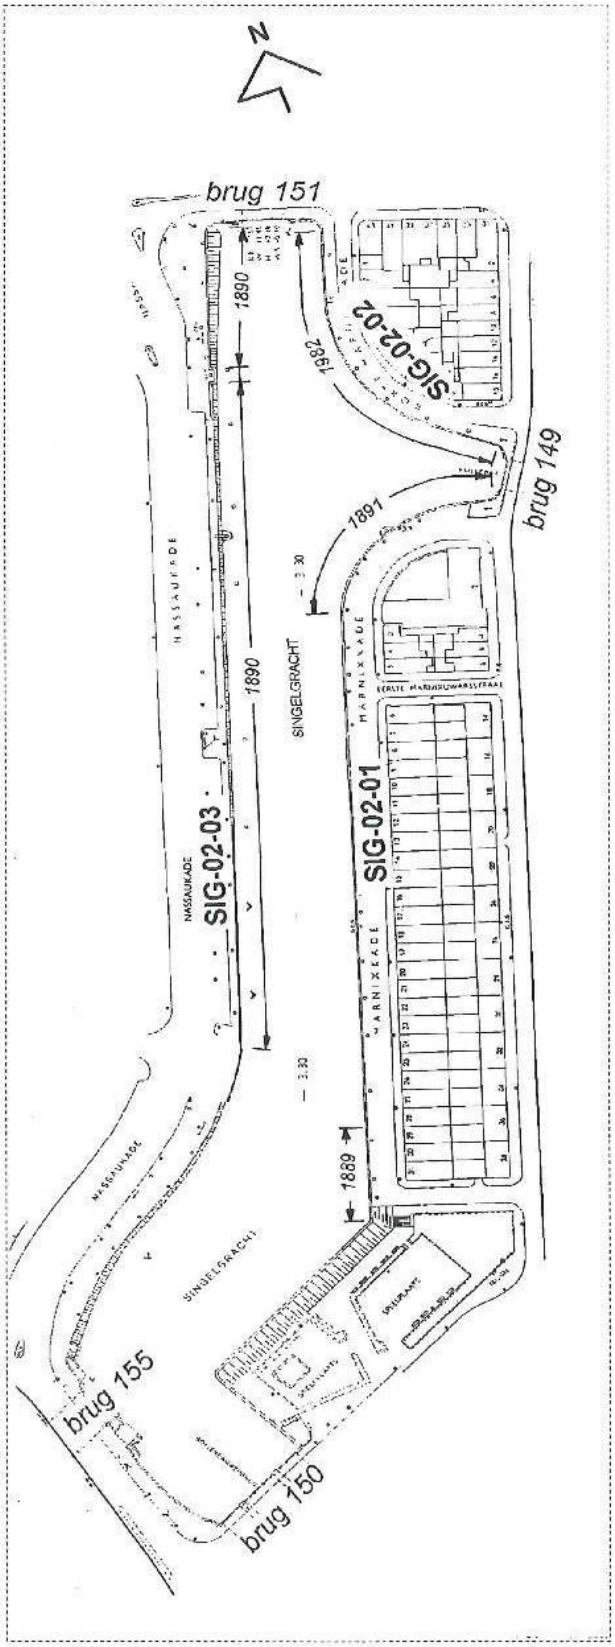

SIG0201


Inspecteurs : [redacted]
Inspectiedatum : 3-sep-2003

Nr.	Gebrek		Indicatie Kosten	Urg	Uitv. in groep
1	metselwerk, zetting	€	0,00	5	
2	metselwerk, zetting	€	0,00	4	A
3	beton, verschoven	€	4.000,00	3	B
4	beton, schadevaring	€	4.000,00	3	
5	metselwerk, schadevaring	€	1.300,00	3	
6	.., incorrect	€	1.000,00	3	
7	metselwerk, scheur, verticaal	€	0,00	5	
8	metselwerk, haarscheur	€	0,00	5	
9	metselwerk, scheur, horizontaal	€	0,00	4	A
10	specie, slecht	€	6.800,00	2	B
11	specie, matig	€	4.500,00	3	
12	metselwerk, scheur, verticaal	€	0,00	4	A
13	metselwerk, scheur, verticaal	€	0,00	4	A
14	metselwerk, scheef	€	0,00	5	
15	metselwerk, scheur	€	0,00	4	A
16	staal, schadevaring	€	0,00	4	
17	metselwerk, gat	€	1.800,00	3	
18	specie, aangetast op de waterlijn	€	18.000,00	3	
19	metselwerk, beschadigd	€	0,00	4	A
20	natuursteen, verschoven	€	1.500,00	3	B
21	metselwerk, zetting	€	0,00	4	
22	metselwerk, klinkt hol	€	8.500,00	3	
23	metselwerk, scheur, verticaal	€	0,00	5	
24	metselwerk, mosgroei	€	600,00	3	
25	natuursteen, verschoven	€	0,00	5	
26	metselwerk, zetting	€	0,00	4	A
27	.., ..	€	0,00	5	
	Hoogste urgentie	€	0,00	1	
	Onderhoud noodzakelijk	€	6.800,00	2	
	Onderhoud gewenst	€	45.200,00	3	
	Lage urgentie	€	0,00	5	
	Totaal*	€	52.000,00		
	Nader onderzoek gewenst		9,00 stuks	4	
	In vernieuwingsprogramma		Planvorming		
	Vervanginsgswaarde ±	€	2.592.000,00		

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Volgnummer : 1
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 5

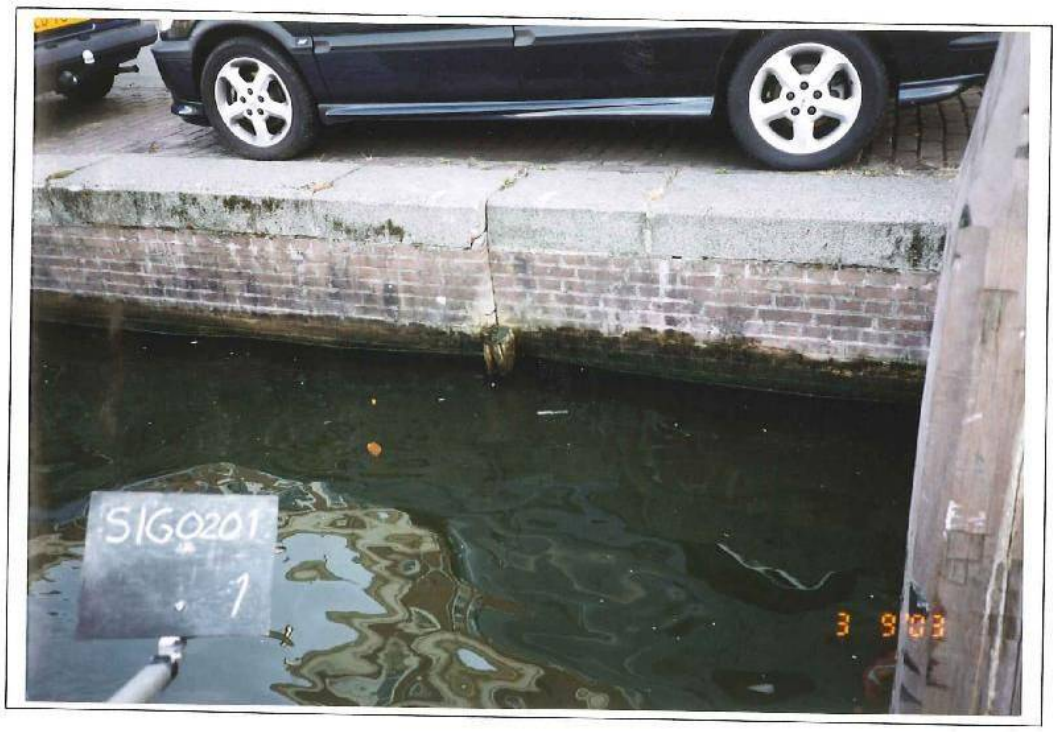

Plaats	: walmuur	
Onderdeel	: ..	
Detail	: ..	
Materiaal	: metselwerk	
Gebrek	: zetting	
Specificatie	: Vanaf knik 1e dilatatievoeg: circa 95 mm en circa 10 mm gezakt.	± 1,00 stuks
Herstel	: Monitoren.	± € [redacted]

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 2
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : zetting

Specificatie : Walmuur slingert over de gehele lengte langs de Marnixkade. ± 1,00 stuks


Herstel : Inmeten en herhalingsmeting uitvoeren. ± €

Uitvoerings-groep : A

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 3
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie


urgentie 3

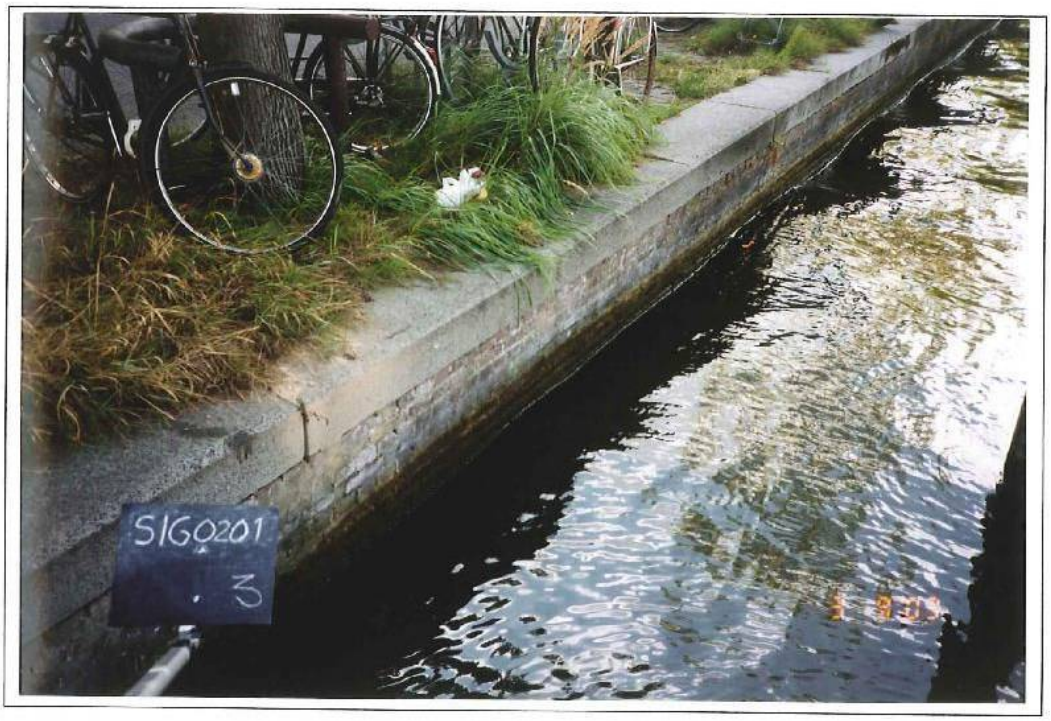

Plaats	:	walmuur	
Onderdeel	:	dekzerk	
Detail	:	..	
Materiaal	:	beton	
Gebrek	:	verschoven	
Specificatie	:	T.h.v. nr 29: 2 st. ca.1cm, t.h.v. nr. 16: 15 st. tot ca. 20mm, nr. 7: 5 st. ca. 10mm.	± 22,00 stuks
Herstel	:	Herleggen.	± € [redacted]
Uitvoerings-groep	:	B	
Vakdiscipline	:	Metselwerk	

Volgnummer : 4
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

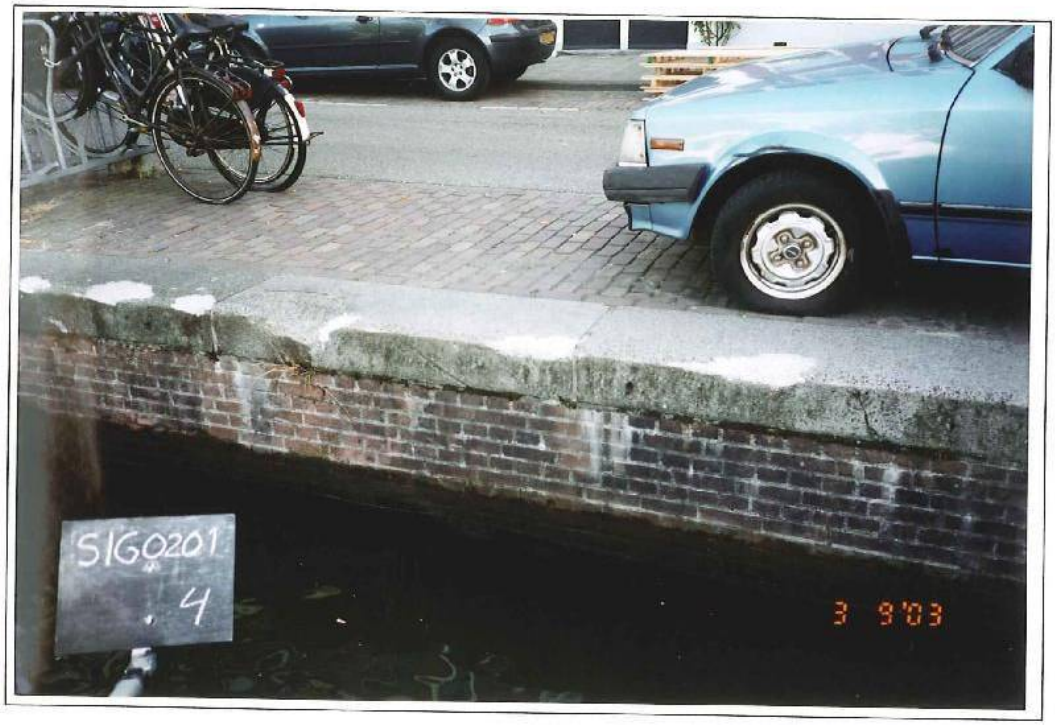

Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : beton
Gebrek : schadevaring


Specificatie : T.h.v. nr. 3: 1 st., t.h.v. nr. 17: 1 st., t.h.v. nr. 24: 2 st. en t.h.v. nr. 27: 3 st. ± 7,00 stuks

Herstel : Vervangen. ± €[redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 5
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

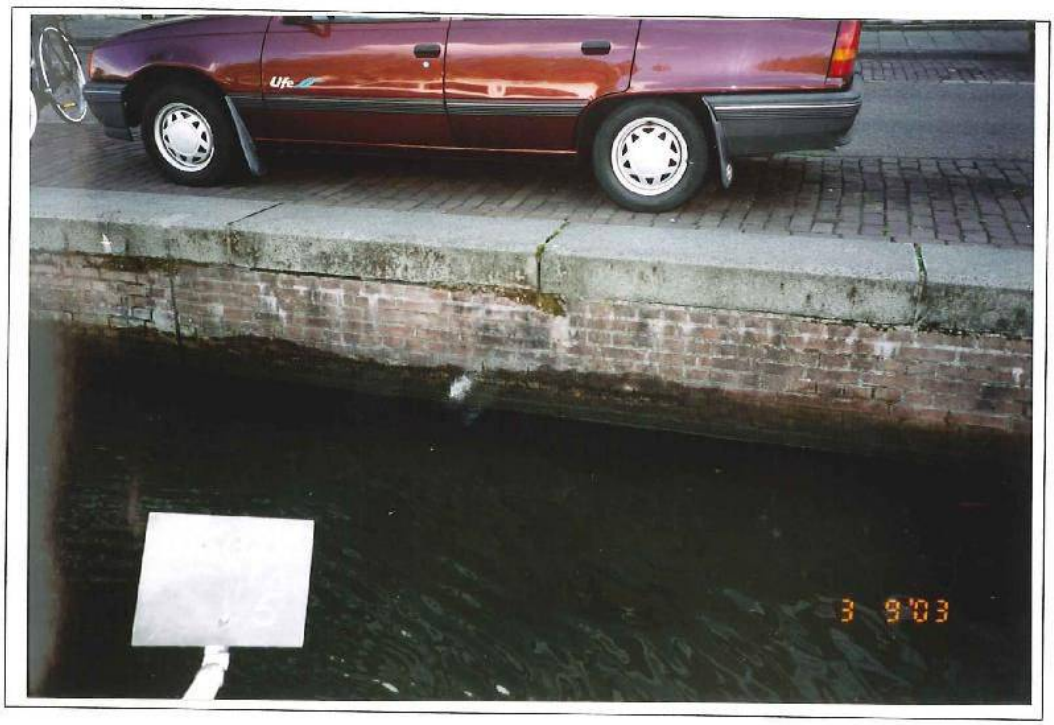

Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : schadevaring


Specificatie : T.o. nr. 25: 1e laag onder dekzerk, dekzerk los. ± 1,00 mtr

Herstel : Metselwerk uittanden en dekzerk herleggen. ± €[redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 6
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

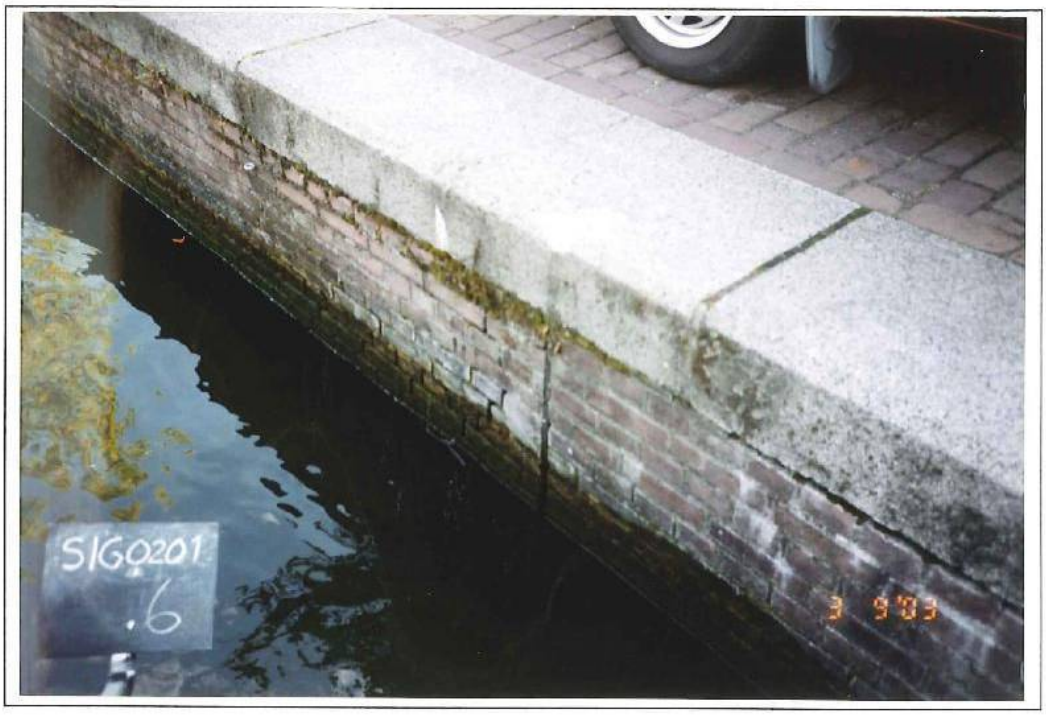

Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : dilatatievoeg
Materiaal : ..
Gebrek : incorrect

Specificatie : T.h.v. nr. 25. De dilatatievoeg loopt niet door in dekzerk. ± 1,00 stuks

Herstel : Dekzerk vervangen en dilatatie formeren. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 7
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : T.h.v. nr. 16: 1st. ca. 0,6 mtr. ± 0,60 mtr

Herstel : Monitoren. ± €

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 8
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : haarscheur


Specificatie : T.o.16/17: 2 st. ca. 0.60 mtr. ± 1,20 mtr

Herstel : ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 9
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4

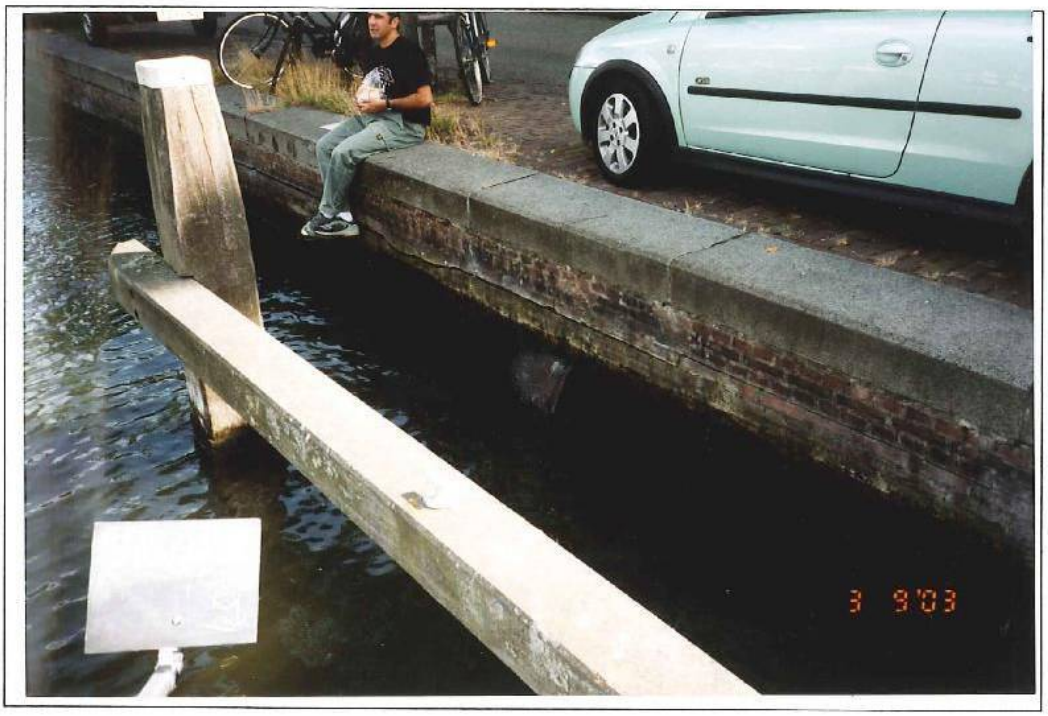

Plaats	:	walmuur	
Onderdeel	:	..	
Detail	:	..	
Materiaal	:	metselwerk	
Gebrek	:	scheur, horizontaal	
Specificatie	:	T.h.v. nr. 15: 9 m1 tot ca. 25 mm open (was 10mm in 2000), t.h.v. nr. 13: 4.5 m1 tot 10 mm.	± 25,00 mm
Herstel	:	Inmeten en herhalingsmeting uitvoeren.	± € [redacted]
Uitvoerings-groep	:	A	
Vakdiscipline	:	Overige werksoorten	

Volgnummer : 10
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 2



Plaats	:	walmuur
Onderdeel	:	dekzerk
Detail	:	voeg
Materiaal	:	specie
Gebrek	:	slecht
Specificatie	:	Over de gehele lengte, lint- en stootvoegen begroeid, zacht of verdwenen. ± 400,00 mtr
Herstel	:	Schoonmaken, uitslijpen en opnieuw voegen. ± € [redacted]
Uitvoerings-groep	:	B
Vakdiscipline	:	Metselwerk

Volgnummer : 11
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats	:	walmuur	
Onderdeel	:	..	
Detail	:	voegwerk	
Materiaal	:	specie	
Gebrek	:	matig	
Specificatie	:	Diverse plaatsen, ca. 10% uitgespoeld of verdwenen.	± 25,00 m2
Herstel	:	Uitslijpen en voegen. (25 m2).	± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 12
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : T.h.v. nr. 16: 1 st 0,6 mtr. Circa 5 mm verschoven. ± 1,00 stuks

Herstel : Inmeten, herhalingsmeting uitvoeren. ± €

Uitvoerings-
groep : A

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 13
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal

Specificatie : T.h.v. nr. 3: ca. 5 mm verschoven en ca. 5 mm open. ± 1,00 stuks


Herstel : Inmeten en herhalingsmeting ± €[redacted]

Uitvoerings-
groep : A

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 14
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 5

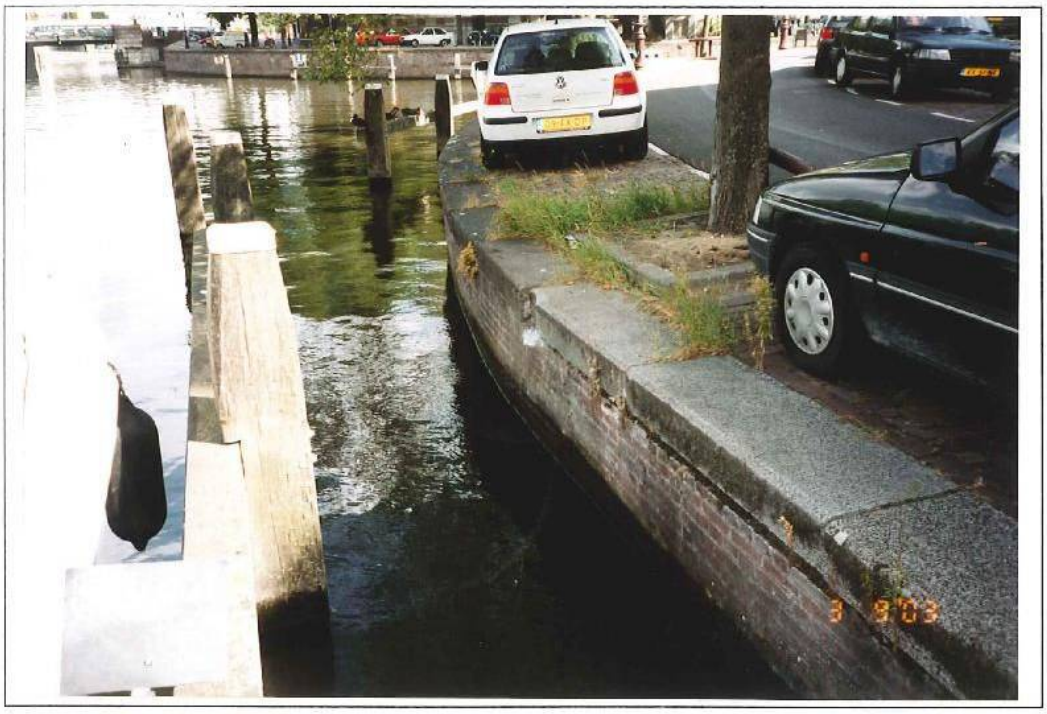

Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheef

Specificatie : In bocht: Ca 5%. ± 15,00 mtr

Herstel : ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 15
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4



Plaats	:	walmuur	
Onderdeel	:	..	
Detail	:	..	
Materiaal	:	metselwerk	
Gebrek	:	scheur	
Specificatie	:	In de bocht 1st. 10 mm open en 6 mm verschoven, 2 st. ca. 5 mm verschoven, 1 st. ca. 10 mm verschoven en ca. 5 mm open.	± 4,00 stuks
Herstel	:	Inmeten, herhalingsmeting	± € [redacted]
Uitvoerings-groep	:	A	
Vakdiscipline	:	Overige werksoorten	

Volgnummer : 16
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4



Plaats : aansluitend
Onderdeel : aanvaarvoorziening
Detail : ..
Materiaal : staal
Gebrek : schadevaring

Specificatie : T.o. Marnixschool (no. 2) ± 1,00 stuks

Herstel : Melden bij betrokken beheerder (GEB) ± €

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 17
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : gat


Specificatie : Bij aansluiting GEB: 4 st gaten. ± 2,00 m2

Herstel : Uittanden en inmetselen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 18
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

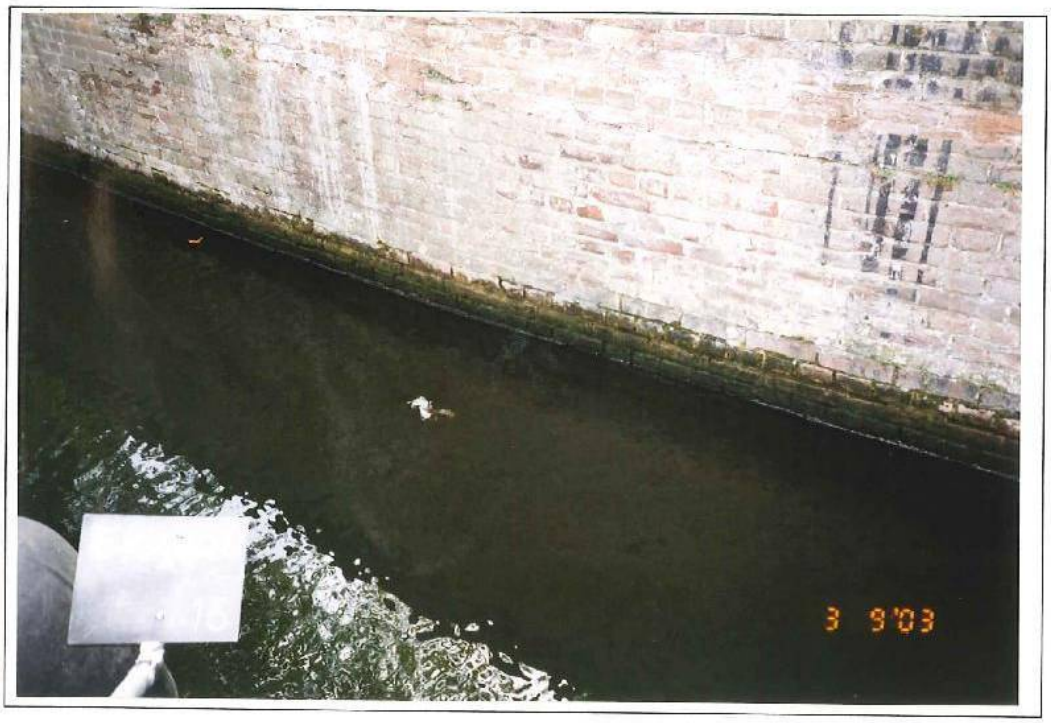

Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : voeg
Materiaal : specie
Gebrek : aangetast op de waterlijn


Specificatie : Over het gehele rak ca. 25%. ± 90,00 mtr

Herstel : Kuipen, schoonmaken en voegen, waar nodig stenen vervangen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 19
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie


urgentie 4

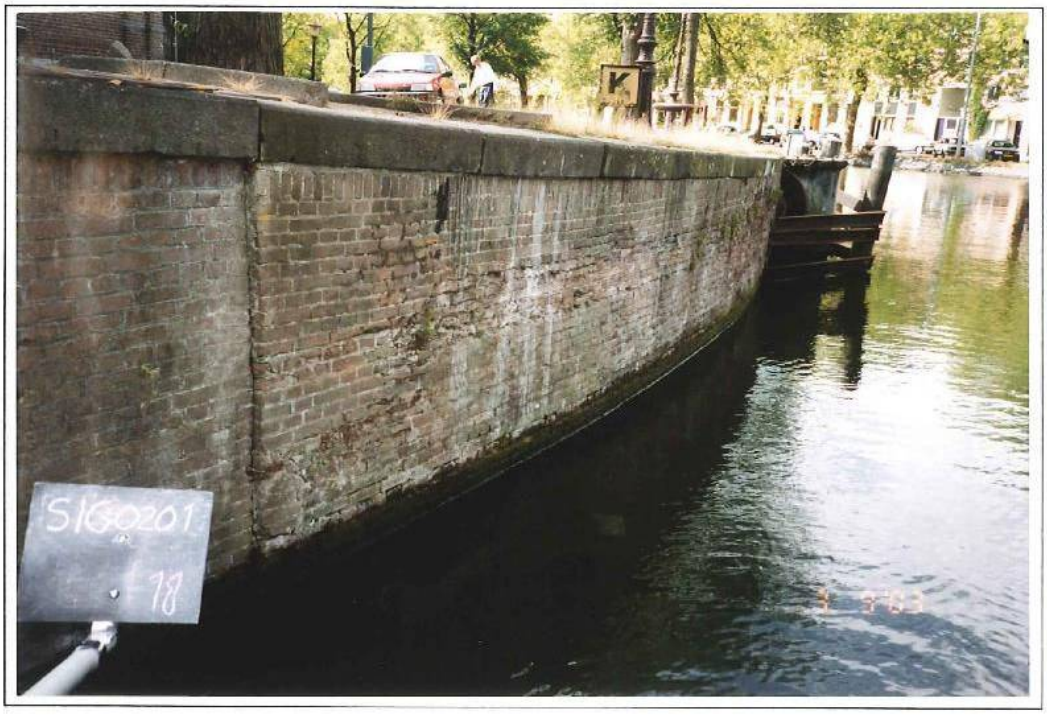

Plaats	:	walmuur	
Onderdeel	:	..	
Detail	:	..	
Materiaal	:	metselwerk	
Gebrek	:	beschadigd	
Specificatie	:	In bocht, bovenzijde metselwerk schuift vermoedelijk af, stenen verbrijzelen t.p.v. afschuiving en klinkt hol.	± 10,00 mtr
Herstel	:	Inmeten en herhalingsmeting uitvoeren. Daarna hersteladvies bepalen.	± € [redacted]
Uitvoerings-groep	:	A	
Vakdiscipline	:	Overige werksoorten	

Volgnummer : 20
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

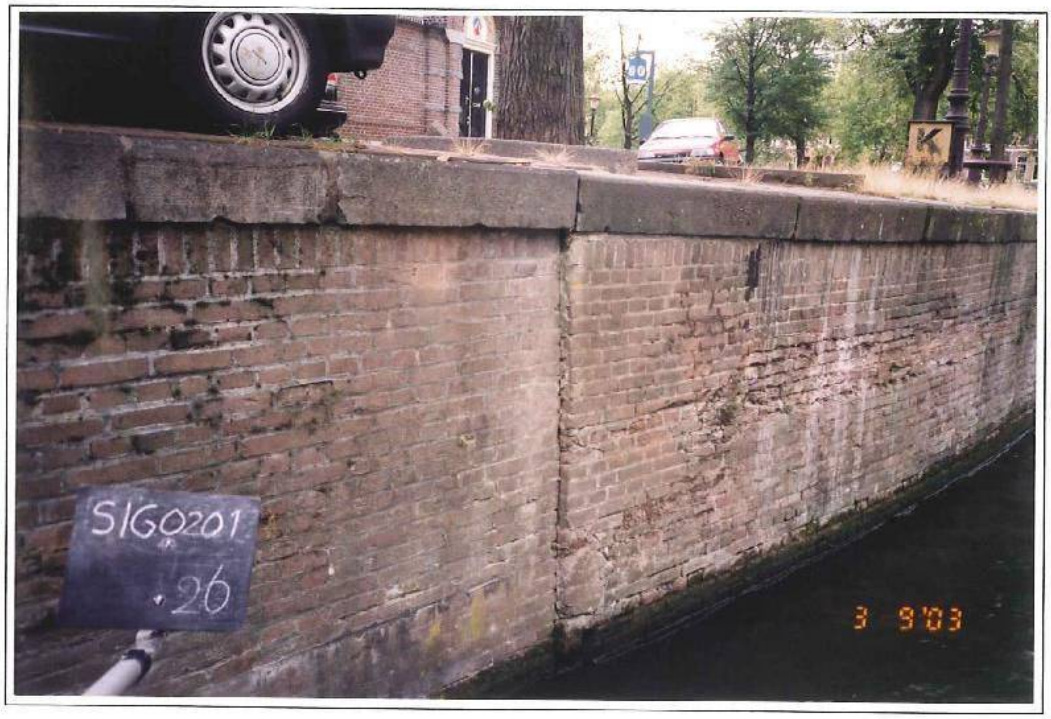

Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : natuursteen
Gebrek : verschoven

Specificatie : Vanaf brug 149 na de 1e dilatatievoeg tot ca. 20 mm. ± 6,00 stuks

Herstel : Herleggen. ± €

Uitvoerings-
groep : B

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 21
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : zetting


Specificatie : Vanaf brug 149 de 2e dilatatievoeg, ca. 40 mm. ± 1,00 stuks

Herstel : Inmeten, herhalingsmeting. ± €

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 22
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

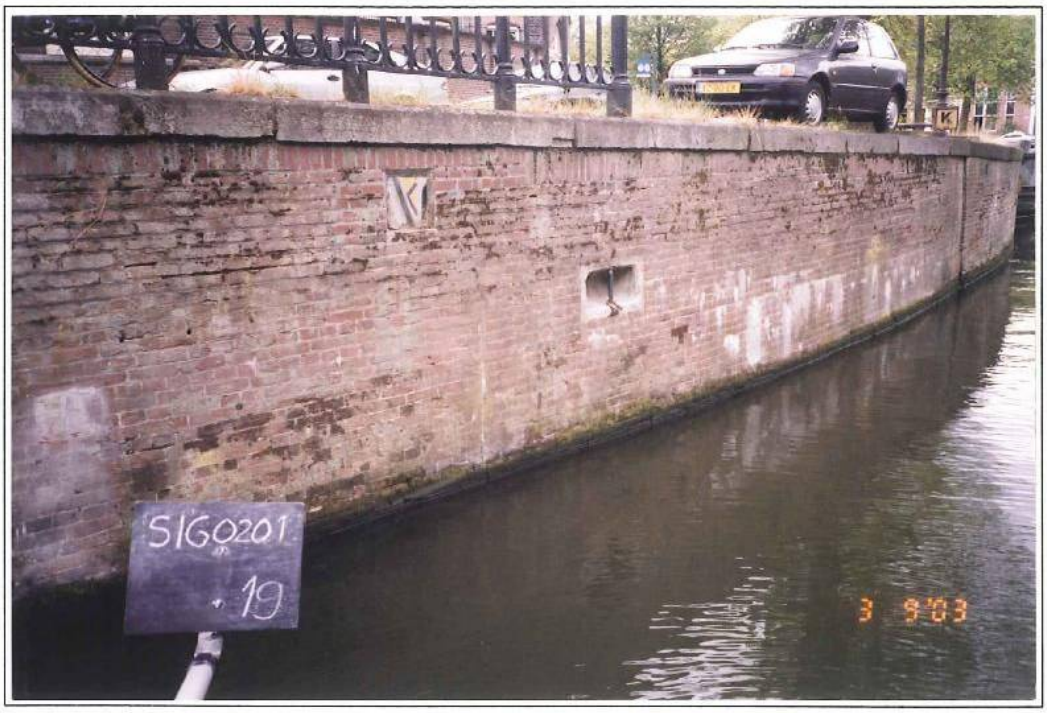

Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : klinkt hol


Specificatie : Nabij brug 149: 10 m2, voegen onthecht. ± 10,00 m2

Herstel : Uittanden en inmetselen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 23
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 5

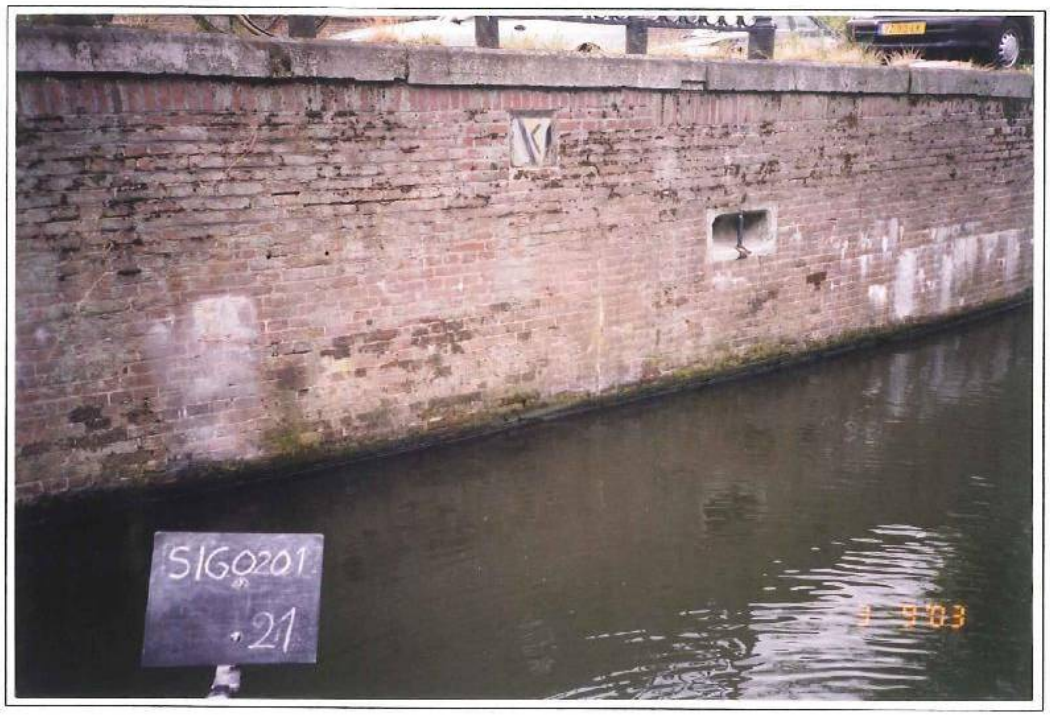

Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : scheur, verticaal


Specificatie : In bocht nabij brug 149, onder leuning. ± 1,00 mtr

Herstel : Monitoren. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 24
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

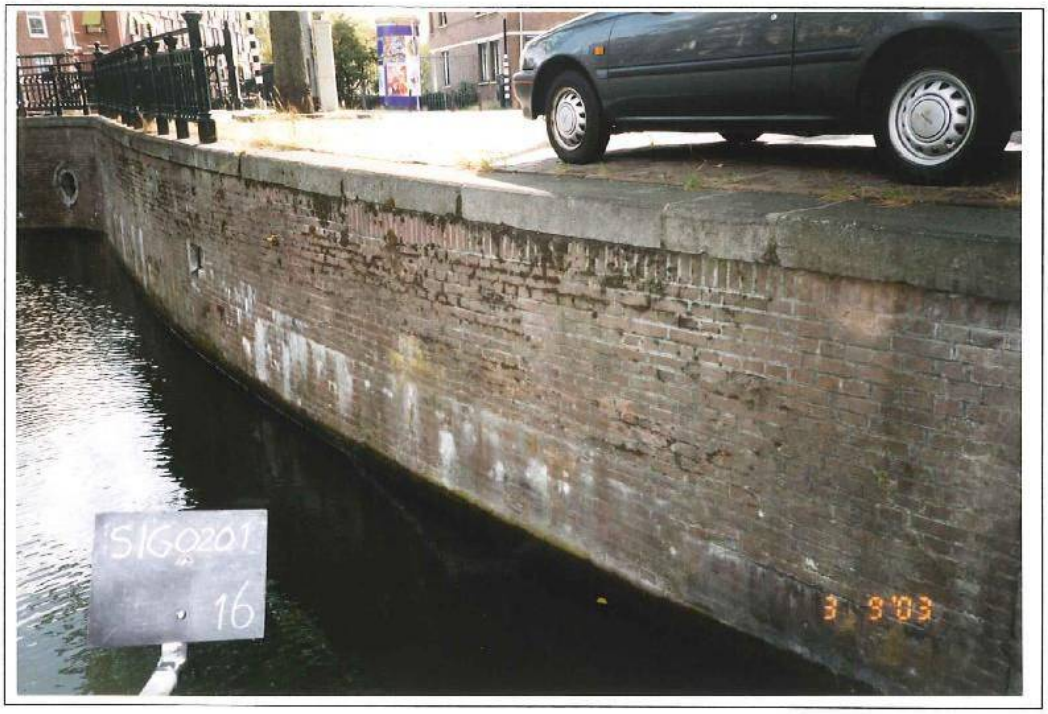

Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : mosgroei

Specificatie : Nabij brug 149. ± 10,00 m2

Herstel : Verwijderen. ± €

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 25
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : natuursteen
Gebrek : verschoven

Specificatie : Tussen brug 149 en 1e dilatatievoeg tot ca. 20 mm. ± 0,00 stuks

Herstel : Herleggen. ± €

Vakdiscipline : Combinatie werksoorten

Volgnummer : 26
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 4



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : zetting

Specificatie : Aansluitend op brug 149: ca. 60 mm. ± 1,00 stuks


Herstel : Inmeten, herhalingsmeting. ± €[redacted]

Uitvoerings-
groep : A

Vakdiscipline : Overige werksoorten

Volgnummer : 27
Code : SIG0201
Type : Oevers inspectie

urgentie 5

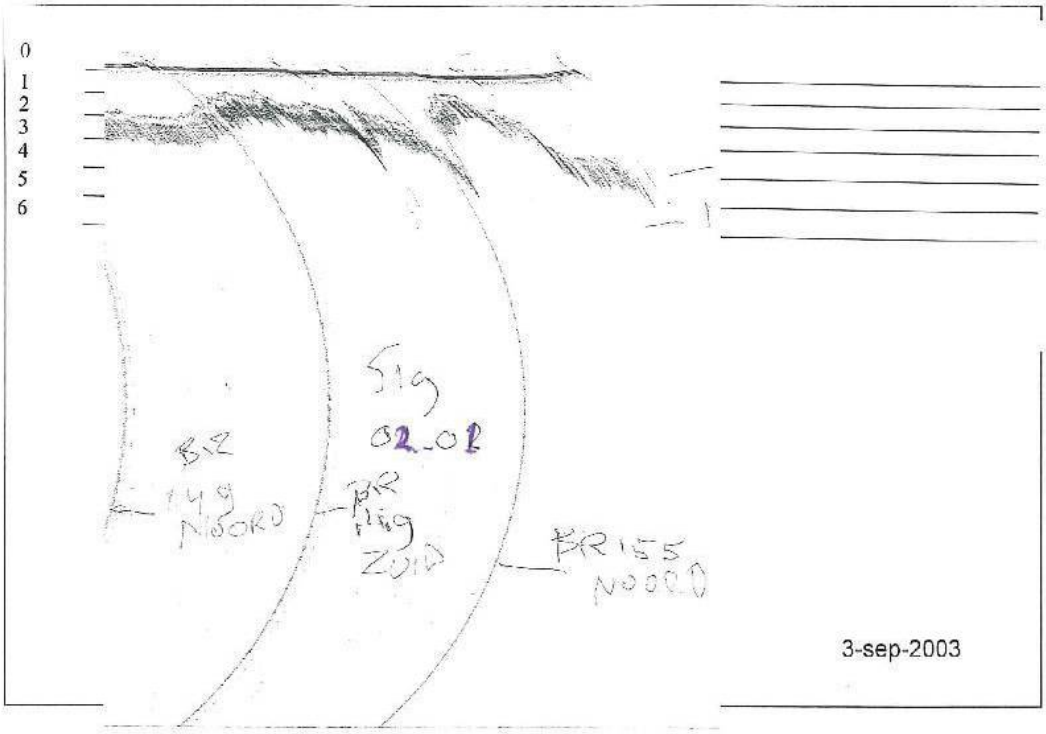

Plaats : walmuur
Onderdeel : peiling
Detail : ..
Materiaal : ..
Gebrek : ..

Specificatie : Waterpeil 0.40 - NAP. ± 0,00 mtr

Herstel : ± €

Vakdiscipline : ..

Inlezen optie file: options.dbf

+ Optie file gelezen
Datum : 3-9-2003
Inspecteurs : [redacted]
Type object : Oevers
Specialisme : Oevers
Functionele inspectie

Inlezen inspectie gegevens: inspect.dbf

Verwerken inspectie
Code : SIG0201
Datum : 3-9-2003

+ Nieuwe inspectie aangemaakt.
Gebreken toevoegen..
SIG0201:001 (001) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:002 (002) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:003 (003) Gewijzigd gebrek
SIG0201:004 (004) Gewijzigd gebrek
SIG0201:005 (005) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:006 (006) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:007 (007) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:008 (008) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:009 (009) Gewijzigd gebrek
SIG0201:010 (010) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:011 (011) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:012 (012) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:013 (013) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:014 (014) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:015 (015) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:016 (016) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:017 (017) Gewijzigd gebrek
SIG0201:018 (018) Gewijzigd gebrek
SIG0201:019 (019) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:020 (020) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:021 (021) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:022 (022) Gebrek is hetzelfde gebleven
SIG0201:023 (000) Nieuw gebrek
! Dubbel fotonummer in gebrek 23

SIG0201:024 (000) Nieuw gebrek
SIG0201:025 (000) Nieuw gebrek
SIG0201:026 (000) Nieuw gebrek
SIG0201:027 (000) Nieuw gebrek

+ Inspectie ingelezen
+ ---> 27 gebreken overgespeeld

Gebreknummers	
Van	Naar
23	12
24	13
12	14
17	15
13	16
14	17
15	18
18	19
25	20
27	21
19	22
21	23
16	24
26	25
20	26
22	27
