Rapport Amsterdam Open Air 2023
03 & 04 juni 2023
Gaasperpark



Inspecteurs : 5.1.2.e

Opgemaakt : 07 juni 2023

Zaakdossier PB : Z2023-ZO000654

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam

Postbus 12491
1100 AL Amsterdam
Telefoon 14 020

Schouwformulier evenement

Gegevens evenement

Naam evenement	Amsterdam Open Air 2023
Datum schouw	Vrijdag 2 juni 2023 van 14:00 uur
Locatie evenement	Het omheinde evenemententerrein, aan de noordelijke oeverzijde van de Gaasperplas in het Gaasperpark
Contactpersoon	5.1.2.e M/~~V~~
Telefoonnummer(s)	5.1.2.e
E-mailadres	5.1.2.e

Toezicht (bouw en gebruik) SDZO

Naam	5.1.2.e
Opmerkingen	Op diverse plaatsen op het terrein vloer ongelijk
Handtekening voor gezien	5.1.2.e

Toezicht (geluid) SDZO

Naam	
Opmerkingen	

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost

Handtekening voor gezien

Handhaving SDZO

Naam afwezig

Opmerkingen

Handtekening voor gezien

Stadswerken SDZO

Naam afwezig

Opmerkingen

Handtekening voor gezien

Brandweer

Naam 5.1.2.e

Opmerkingen Geoefend heid medewerkers met voldoende.

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost

Handtekening voor gezien [redacted]

Politie

Naam

Opmerkingen Dropbox beter aanduiden
Nooduitgangen beter zichtbaar ordenen

Handtekening voor gezien [redacted]

Organisator

Naam [redacted]

Opmerkingen

[redacted]

Handtekening voor akkoord

Door ondertekening van dit formulier verklaart de organisator dat alle aanwijzingen die op dit formulier vermeld staan zullen worden opgevolgd en alle opdrachten zullen worden uitgevoerd.

Gemeente Amsterdam

Schouwformulier

Naam evenement	**Amsterdam Open Air Festival 2023**
Locatie	Gaarsperpark
Datum	03 & 04 juni 2023
Tijd (van - tot)	11:00 – 23:00 uur
Aantal bezoekers	15000
Gecontroleerd door	5.1.2.e & 5.1.2.e
Decos nummer	Z/23/2129657-3968236

Veiligheidsschouw (voorafgaand aan evenement)

Datum : 02 - 06 - 2023 Tijd : 13:30 uur

Gecontroleerd door : 5.1.2.e & 5.1.2.e

Zijn er vanuit de politie / brandweer of GHOR nog opmerkingen gemaakt, zo ja welke:

- Medewerkers getoetst op geschiktheid: negatief resultaat
- vlonder AZÉA q
- DROPBOX AANDuiding kleine
- nooduitgang.
- brandblusser CO2 ipv schuimblusser voor Apparatuur (ADVIES)

Eventuele zaken die belangrijk zijn:

Buitenmeetpunten

berekende geluidniveaus in dB(C)

Omschrijving	dB(C)
Liendenhof [redacted]	**85**
Provincialeweg [redacted]	**85**
Wamelstraat [redacted]	**85**

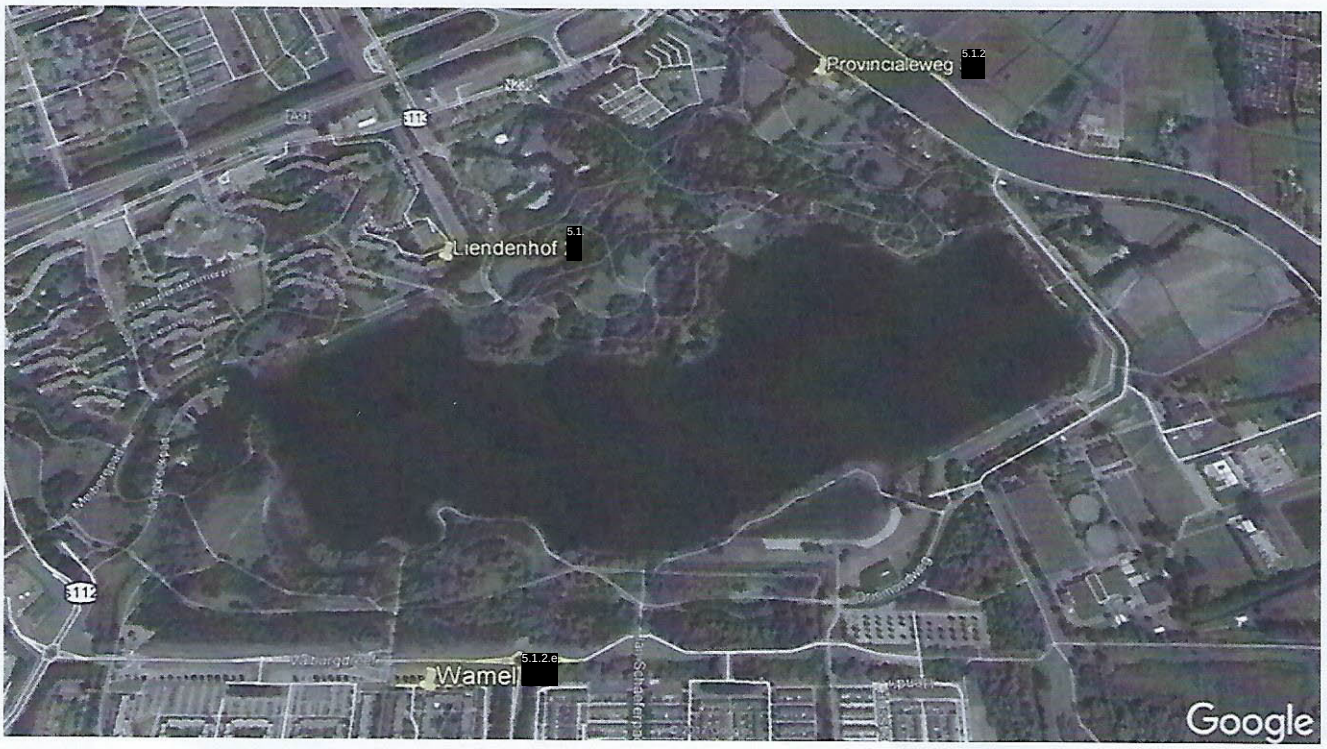

Veiligheidsschouw (dag voorafgaand aan evenement)

Gecontroleerd door : Stievries Daal & Patrick Kohinor

	JA	Nee	Oplossing/ afspraak/ wie gesproken
Organisatie zelf aanwezig	✓		
Contactpersoon Duurzaamheid aanwezig			
Tekening evenemententerrein aanwezig (conform vergunning)	✓		
Huisregels zichtbaar bij ingang	✓		
Dropbox reeds opgehangen voor ingang evenemententerrein?	✓		Duidelijk opschrift !!

Op het terrein" Veiligheid"			
Nooduitgangen zichtbaar en vrij van obstakels. (Banners geplaatst)	✓		
Verlichtingunits bij nooduitgangen	✓		
Kabels welke over het terrein lopen zijn afgedekt of liggen in kabelgoten	✓		
Toiletgroepen zijn gescheiden en voorzien van handenwasgelegenheid	✓		
GRATIS drinkwatervoorziening duidelijk aangegeven voor bezoekers	✓		
Aanrijdroutes Nood/ Hulpdiensten vrij van obstakels	✓		
Duidelijke verwijzing Nooduitgangen (looprichting)			2
Rijplaten steken niet omhoog (valgevaar)	✓		
Houtenvlonders in tenten veilig geplaatst	✓		AREA 9 TRIBE
Spanbanden tenten zijn gezekerd (Ti-wrap)	✓		
Tentharingen (kop) voorzien van afdekhoes of met bloklint duidelijk aangegeven	✓		
Bouwmaterialen opgeruimd of af gehekt			
Toiletten volgens tekening	✓		
Duidelijke zichtbare banner Toiletten	✓		
Handenwasgelegenheid bij toiletten	✓		
Drinkwater bij toilet groep aanwezig	✓		
Duidelijke signings "**DRINKWATER**"	✓		
Drinkwater aangesloten op vast watertappunt	✓		
Verlichting/versiering welke over een weg is aangebracht op juiste hoogte (**min 4 mtr**)	✓		

Niet meer gasflessen achter kraam dan noodzakelijk (reserve en legen gasflessen in gasopslag)	✓		
Gasopslag duidelijk aangegeven (indien bak & Braad op gas)	✓		
Brandblusser geplaatst	✓		CO2 !
Juiste brandblussers bij frituur (A-B-F)	✓		
Bouwmaterialen opgeruimd of af gehekt			
Alle hekken "Nooduitgang" voorzien van wielen			
Geen losse materialen van opbouw buiten evenemententerrein aanwezig.			

Geluid

	Ja	Nee	Oplossing/ afspraak/ wie gesproken
Is de geluidsverantwoordelijke die is aangegeven in de vergunning aanwezig bij de schouw?			
Is de speelrichting van de podia in overeenstemming met de vergunning?	✓		
Zijn alle overige aangegeven BBT- (Best Beschikbare Technieken) maatregelen in de vergunning correct uitgevoerd?			
Zijn er afspraken gemaakt over wijzigingen tov de vergunde situatie?	✓		
Is het aantal en de positionering van de meetstations in de omgeving in overeenstemming met de vergunning?	✓		
Zijn alle correcties en drempelwaarden correct ingevoerd?			
Werkt het waarschuwingssysteem bij overschrijding van de geluidsnorm?	✓		
Zijn de real time gecorreleerde meetwaarden inzichtelijk voor de gemeente en de organisator?	✓		
Staan de meetpunten FOH (front of house) op de correcte afstand? Zo nee, wat is de correctiefactor? (vul getal in dB's 2 decimalen)	✓		
Zijn voldoende gehoorbeschermingsmiddelen op een laagdrempelige wijze verkrijgbaar?	✓		
Worden bezoekers geïnformeerd over het belang van het dragen van gehoorbescherming?	✓		
Zijn de Best Beschikbare Technieken voor geluid toegepast?	✓		

Duurzaamheid

	Ja	Nee	Oplossing/ afspraak/ wie gesproken
Afval			
Worden de maatregelen om afval te verminderen (op basis van de refuse, reduce, reuse, recycle principes) zoals beschreven in het duurzaamheidsplan worden uitgevoerd? ***De doelstelling is om in totaal minimaal 10 maatregelen door te voeren***	✓		
Is de afvalinfrastructuur conform de fracties en aantallen bakken zoals vermeld in het duurzaamheidsplan?	✓		
Wordt er invulling gegeven aan een circulair drinkbeker systeem in combinatie met statiegeld (drinkbekers en flesjes) conform het duurzaamheidsplan? ***De doelstelling voor hergebruik van hardcups is minimaal 90%. Voor het recyclen van single use bekers is dit minimaal 75%.***	✓		
Worden er composteerbare materialen gebruikt voor het eetgerei conform het duurzaamheidsplan? (Bijvoorbeeld papier, bamboe, hout of PLA)	✓		
Energie			
Zijn de energiebesparende maatregelen conform het duurzaamheidsplan uitgevoerd?	✓		
Is de stroom infrastructuur conform de vergunning aanvraag?			
Zijn de diesel aggregaten (indien ingezet) afgevuld met HVO?	✓		
Zijn de diesel aggregaten (indien ingezet) gecombineerd met een batterij en wordt minimaal 10% van de totale stroombehoefte voorzien door batterij energie?		✓	
Mobiliteit			
Worden de duurzame vervoersmaatregelen getroffen zoals beschreven in het duurzaamheidsplan?			
Organisatie			
Wordt de communicatie met de bezoekers uitgevoerd conform het duurzaamheidsplan?			
Water			
Wordt er gratis leidingwater aangeboden aan de bezoekers op de plaatsen zoals beschreven in het duurzaamheidsplan? ***Richtlijn is 1 tappunt per 150 bezoekers***	✓		
Worden de schoonmaakmiddelen zoals beschreven in het duurzaamheidsplan gebruikt?			

BBT-Checklist (2022) per FoH-systeem

BBT-Maatregel	Opgenomen in vergunning		Uitgevoerd in praktijk		Opmerkingen
	Ja	Nee	Ja	Nee	
Optimale podiumrichting	✓		✓		
Hoogte gevlogen speakers	✓		✓		
Richtwerking speakers	✓		✓		
Geen gevlogen subwoofers	✓		✓		
Frequentie cross-over	✓		✓		
Cardioïde subwoofers in line array opstelling	✓		✓		
DJ monitoring	✓		✓		
Effect gemeten op 25 mtr achter speakers	✓		✓		
Geen subwoofers groter dan 21"	✓		✓		
Verval onder de 40 Hz	✓		✓		
Afscherming toegepast	✓		✓		
Geluidniveau op 25m FoH	✓		✓		

Voor de aanwezige Area's zie volgend blad.

Nacontrole nav veiligheidsschouw (Dag van het evenement)

Datum : 03 juni 2023 Tijd : 10 : 30 uur

Gecontroleerd door : John kamp & Patrick Kohinor

Zijn er wijzigingen ten aanzien van de schouw?	Nee
Zijn de opmerkingen welke tijdens de veiligheidsschouw zijn gemaakt nu wel in orde?	Ja S.
Is de geluidsverantwoordelijke die is aangegeven in de vergunning aanwezig? *Vermeld de gegevens*	Ja S Hester vekl
Zijn voldoende gehoorbeschermingsmiddelen op een laagdrempelige wijze verkrijgbaar?	Ja direct by ingang
Worden bezoekers geïnformeerd over het belang van het dragen van gehoorbescherming?	Ja S
Is er een continu geluidsmeetsysteem aanwezig dat volledig functioneert en inzichtelijk is voor de gemeente en de organisator?	Ja Metrao S
Eventuele opmerkingen	Geen bijzonderheden die alsnog aangepast moeten worden

Indien alles akkoord graag met naam en paraaf ondertekenen;

5.1.2.e

Organisatie

5.1.2.e

Gemeentelijk toezichthouder

Meteo overzicht

◀ za 3 jun. 2023 ▶

Temperatuur

Maximum	21,9 °C (norm.: 20,3 °C) 15-16u
Minimum	9,7 °C (norm.: 10,6 °C) 4-5u
Gemiddeld	16,6 °C (norm.: 15,5 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	6,7 °C 6-7u

Wind

Overheersende richting	Noord-Oost (47°)
Gemiddelde snelheid	3,9 m/s (14,0 km/u)
Hoogste uurgemiddelde snelheid	5,0 m/s (18,0 km/u) 10-11u
Hoogste stoot	12,0 m/s (43,2 km/u) 15-16u

Zon

Duur	15,2 uur
Perc. van langst mogelijk	92%
Zon op	05:20
Zon onder	21:53

Neerslag

Etmaalsom	0,0 mm
Duur	0,0 uur
Hoogste uursom	0,0 mm 1-2u

Luchtvochtigheid

Maximale relatieve vochtigheid	86% 2-3u
Minimale relatieve vochtigheid	25% 14-15u
Gemiddelde relatieve vochtigheid	49%

Overig

Gemiddelde luchtdruk	1.022,1 hPa
Minimum opgetreden zicht	20 - 21km
Bedekkingsgraad van de bovenlucht	1 octa's (Vrijwel onbewolkt)

◀ zo 4 jun. 2023 ▶

Temperatuur

Maximum	21,8 °C (norm.: 20,0 °C) 14-15u
Minimum	9,9 °C (norm.: 10,0 °C) 4-5u
Gemiddeld	15,9 °C (norm.: 15,2 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	8,1 °C 6-7u

Wind

Overheersende richting	Noord-Noord-Oost (24°)
Gemiddelde snelheid	3,9 m/s (14,0 km/u)
Hoogste uurgemiddelde snelheid	5,0 m/s (18,0 km/u) 14-15u
Hoogste stoot	10,0 m/s (36,0 km/u) 17-18u

Zon

Duur	15,2 uur
Perc. van langst mogelijk	92%
Zon op	05:20
Zon onder	21:54

Neerslag

Etmaalsom	0,0 mm
Duur	0,0 uur
Hoogste uursom	0,0 mm 1-2u

Luchtvochtigheid

Maximale relatieve vochtigheid	83% 24-25u
Minimale relatieve vochtigheid	39% 11-12u
Gemiddelde relatieve vochtigheid	60%

Overig

Gemiddelde luchtdruk	1.022,9 hPa
Minimum opgetreden zicht	20 - 21km
Bedekkingsgraad van de bovenlucht	1 octa's (Vrijwel onbewolkt)

Bron : https://weerstatistieken.nl/schiphol/2023/juni



MeTrao meetpunten omgeving



Wamelstraat



Provinciale weg



Liendenhof

MeTrao buitenstations

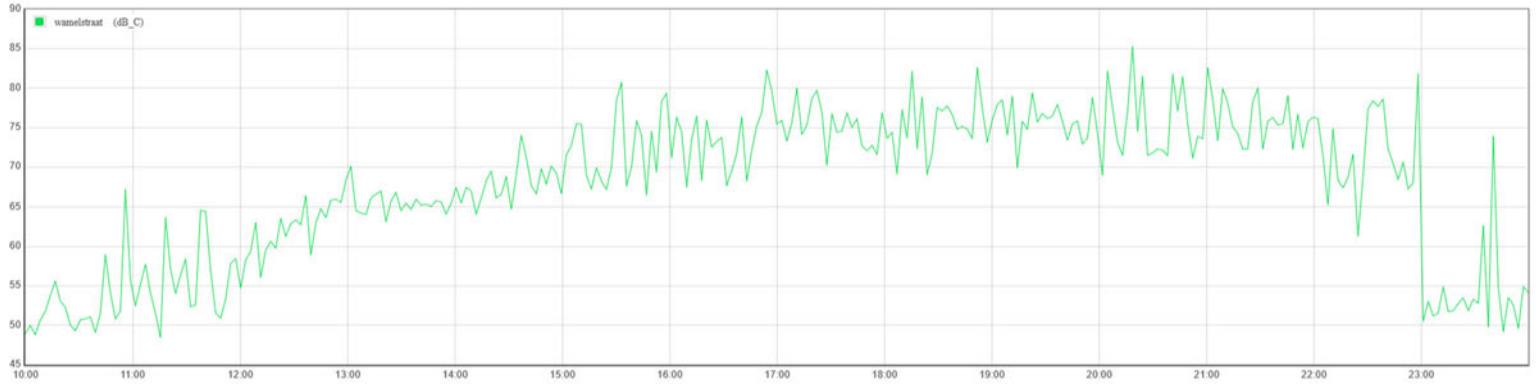

Overzicht zaterdag 03 juni 2023 Wamelstraat max 85 dB(C)

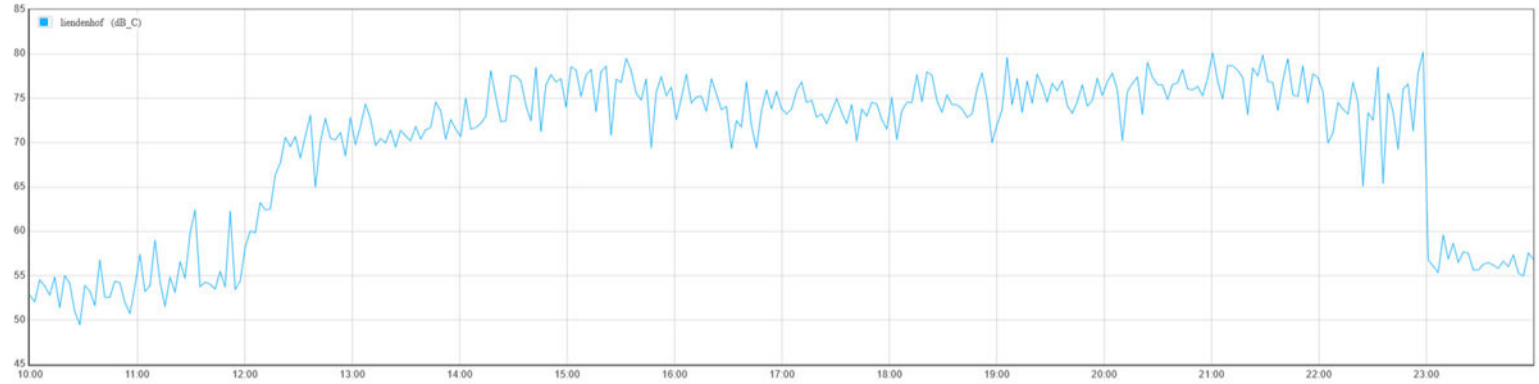

Overzicht zaterdag 03 juni 2023 Liendenhof max 85 dB(C)

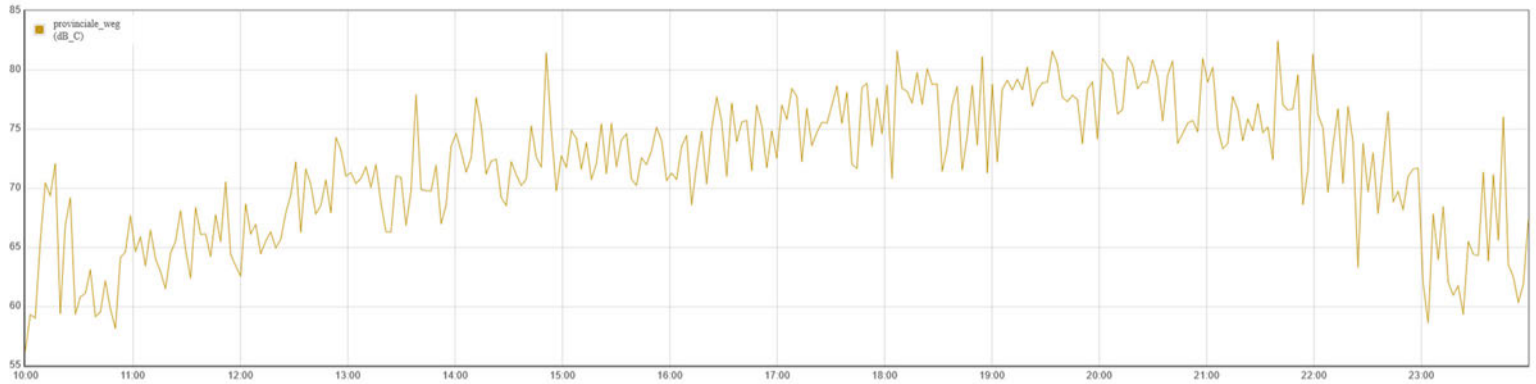

Overzicht zaterdag 03 juni 2023 Provinciale weg max 85 dB(C)

MeTrao buitenstations



Overzicht zondag 04 juni 2023 Wamelstraat max 85 dB(C)

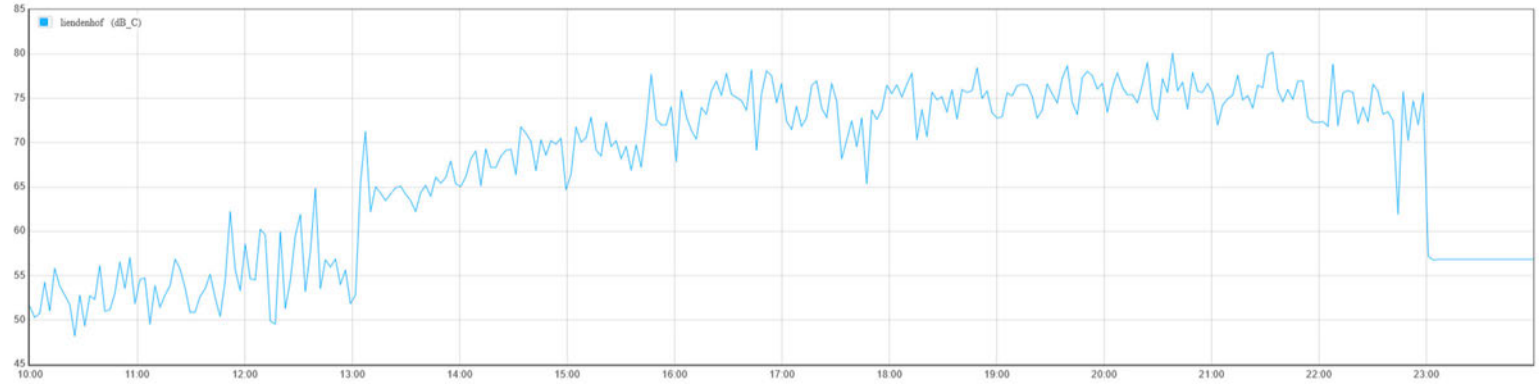

Overzicht zondag 04 juni 2023 Liendenhof max 85 dB(C)

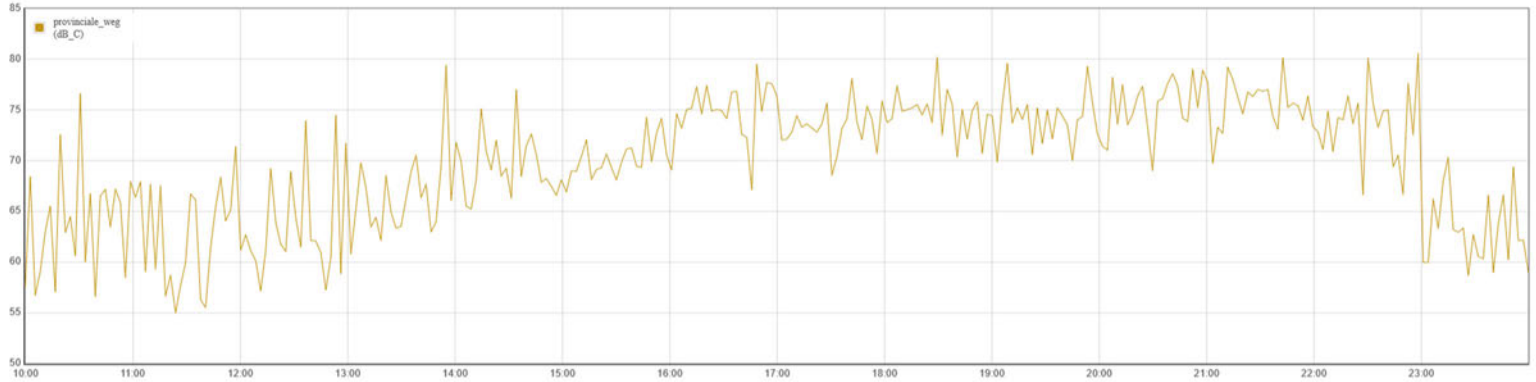

Overzicht zondag 04 juni 2023 Provinciale weg max 85 dB(C)

RESULT	liendenhof
Project	Amsterdam Open Air
start	2023-06-03 11:00:59
stop	2023-06-03 23:59:59

LAeq	LCeq	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1k25	1k6	2k	2k5	3k15	4k	5k	6k3	8k	10k	recordcount
55,1	74,5	53,8	55,9	67,8	72,4	69,2	63,9	59,5	55,9	56,5	57,2	54,4	51,1	47,6	46,9	44,9	43	40,8	39,1	37,5	36,8	37,2	37,2	36,2	34,5	31,4	27,9	23,2	46741

RESULT	wamelstraat
Project	Amsterdam Open Air
start	2023-06-03 11:00:59
stop	2023-06-03 23:59:59

LAeq	LCeq	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1k25	1k6	2k	2k5	3k15	4k	5k	6k3	8k	10k	recordcount
57,3	74,2	50,7	56,6	67,1	72,3	66	61,8	60,7	62,5	63,1	60,1	56,1	52,7	50,4	49,4	46,7	45,5	43,9	41,4	38,1	35,9	33,2	32,5	31,5	29	25,9	23,9	20,7	46741

RESULT	provinciale_weg
Project	Amsterdam Open Air
start	2023-06-03 11:00:59
stop	2023-06-03 23:59:59

LAeq	LCeq	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1k25	1k6	2k	2k5	3k15	4k	5k	6k3	8k	10k	recordcount
57,3	**75,2**	63,6	62,6	69,4	71,6	69,8	64,8	56,4	51,7	50,3	51,2	52,2	52,4	49,5	47,6	47	47,2	47,4	46,4	46	44,7	43,5	43,2	41,7	39,5	36,8	33	29,5	46741

RESULT	liendenhof
Project	Amsterdam Open Air
start	2023-06-04 11:59:59
stop	2023-06-04 23:59:59

LAeq	LCeq	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1k25	1k6	2k	2k5	3k15	4k	5k	6k3	8k	10k	recordcount
54,1	**73,8**	54,8	55,8	67,6	70,8	69,9	63,8	57,7	54,1	54,3	54,7	52,2	50,1	47	45,6	44,1	42,6	40,4	38,6	36,9	37	37,5	37,3	36,7	35,6	33,2	29,6	24,9	40048

RESULT	wamelstraat
Project	Amsterdam Open Air
start	2023-06-04 11:59:59
stop	2023-06-04 23:59:59

LAeq	LCeq	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1k25	1k6	2k	2k5	3k15	4k	5k	6k3	8k	10k	recordcount
56,6	**73,7**	49,6	54,5	67,5	71,6	66,1	59,8	60,1	61,6	62,6	59,4	55,5	52,3	49,7	48,2	46,2	44,7	42,9	40,2	37,2	33,5	30,7	30,9	29,4	26,2	23,4	21	17	43201

RESULT	provinciale_weg
Project	Amsterdam Open Air
start	2023-06-04 11:59:59
stop	2023-06-04 23:59:59

LAeq	LCeq	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1k25	1k6	2k	2k5	3k15	4k	5k	6k3	8k	10k	recordcount
57,2	**73,5**	61,9	61,1	68,3	70	67,5	62,3	55,4	52,6	50,5	50,8	52,8	52,8	49,4	47,7	47,3	46,9	47,3	46,3	45,7	44,2	43,6	43,4	42	39,6	37	33,2	29,6	43201

Overzicht van het equivalente continue geluidsdrukniveau gemeten op de buitenmeetstations

MeTrao overzicht

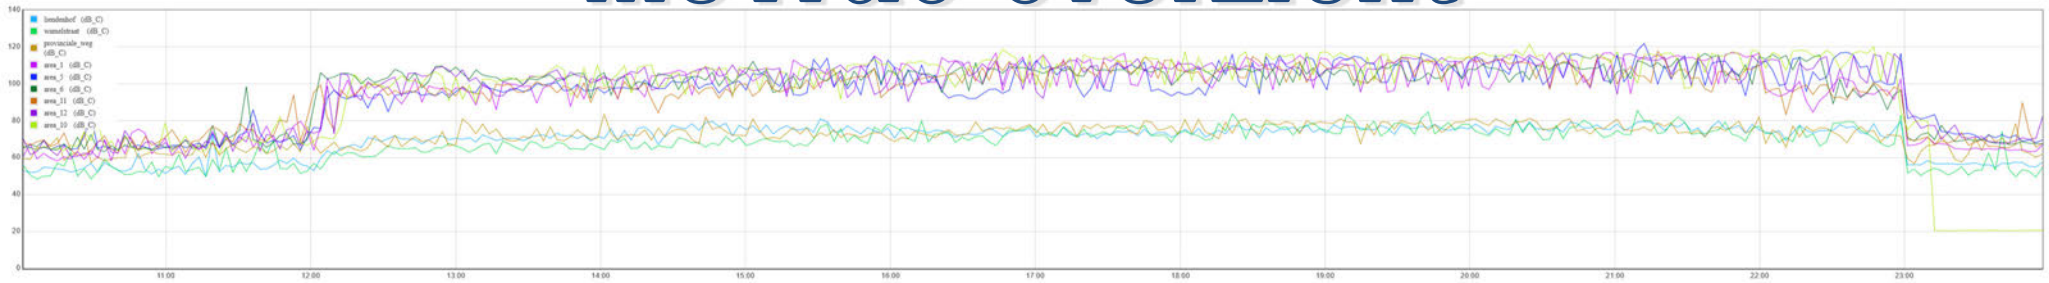

Overzicht zaterdag 03 juni 2023 dB(A) op FOH max 100 dB(A)

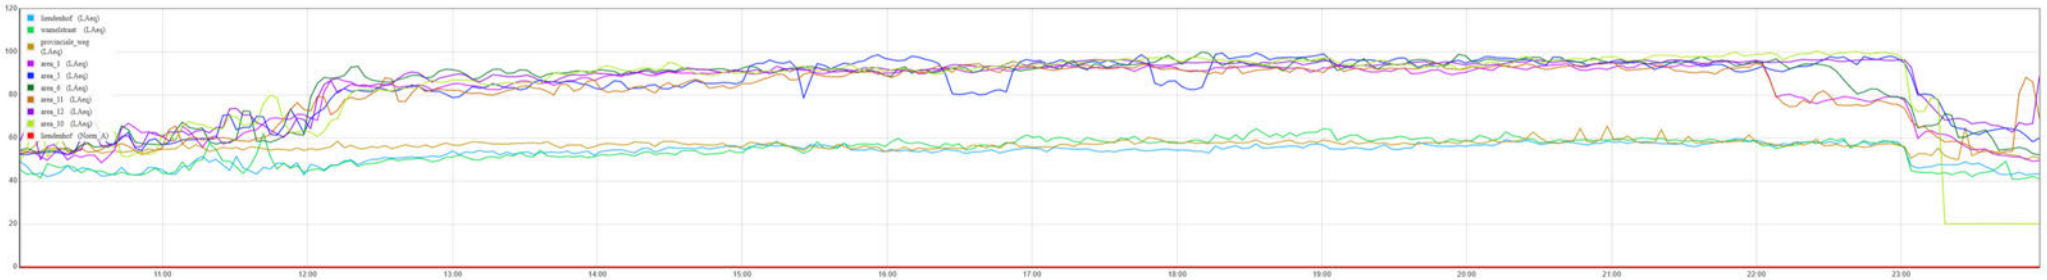

Overzicht zaterdag 03 juni 2023 dB(C) op FOH max 115 dB(C)

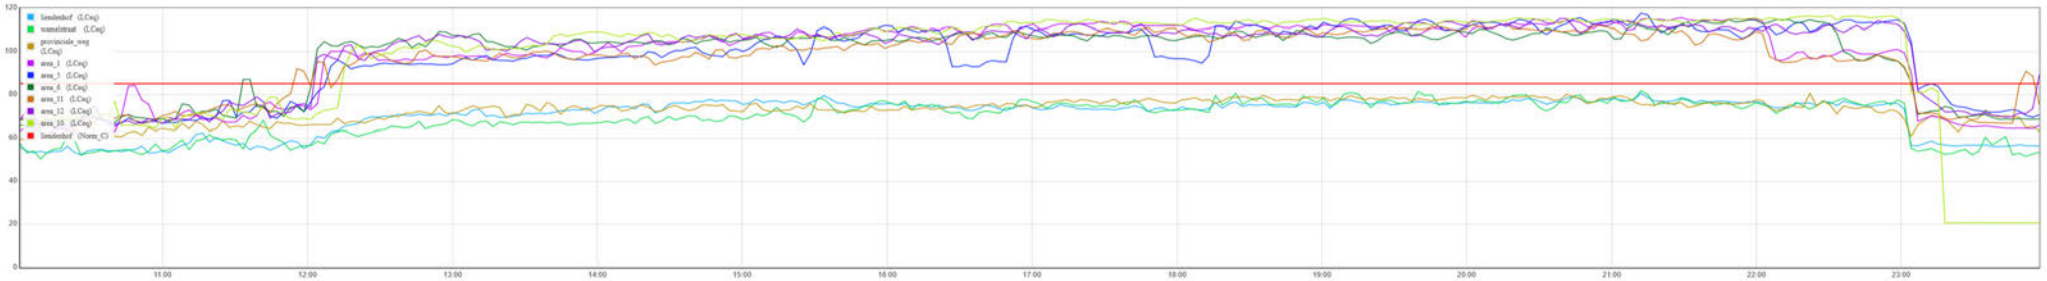

Overzicht zaterdag 03 juni 2023 LAeq

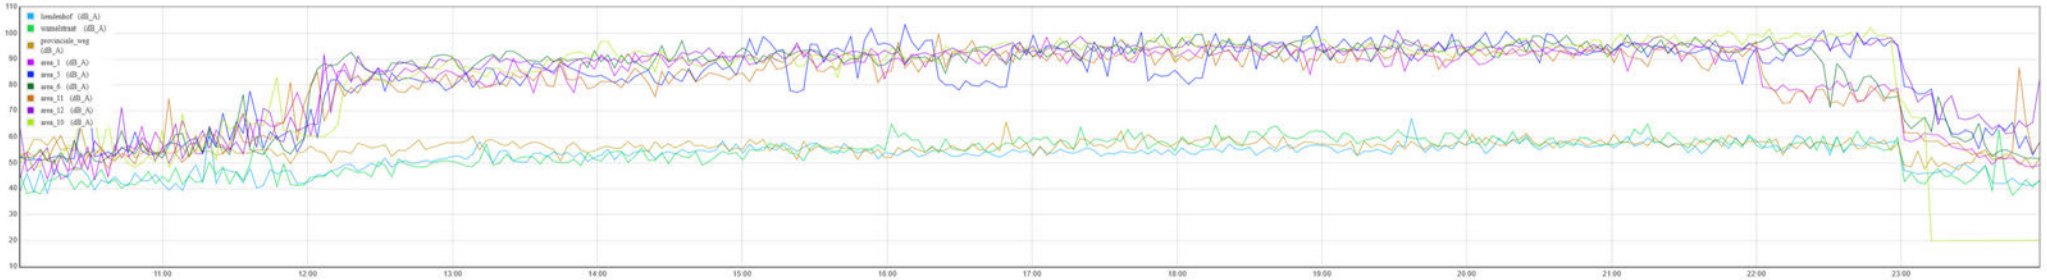

Overzicht zaterdag 03 juni 2023 LCeq

MeTrao overzicht



Overzicht zondag 04 juni 2023 dB(A) op FOH max 100 dB(A)

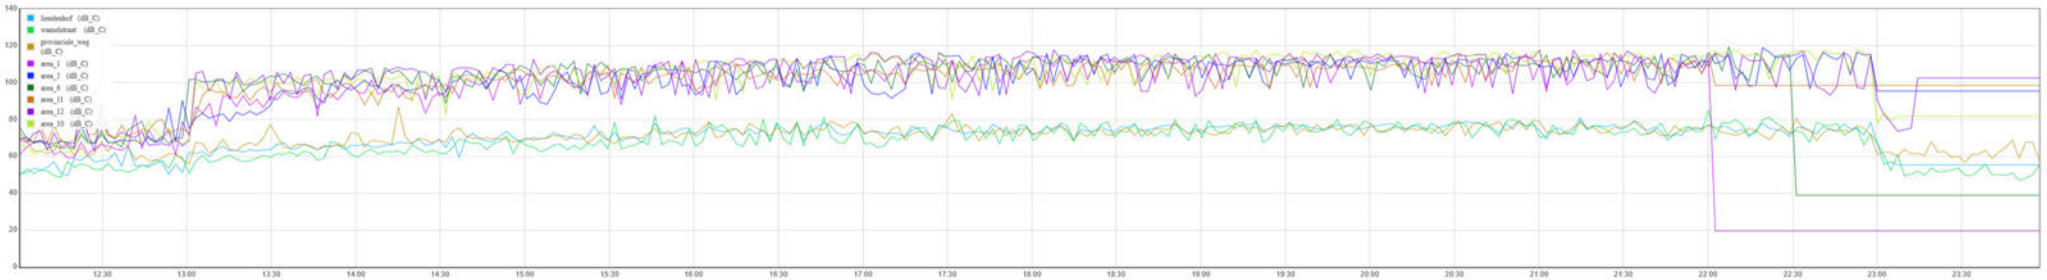

Overzicht zondag 04 juni 2023 dB(C) op FOH max 115 dB(C)

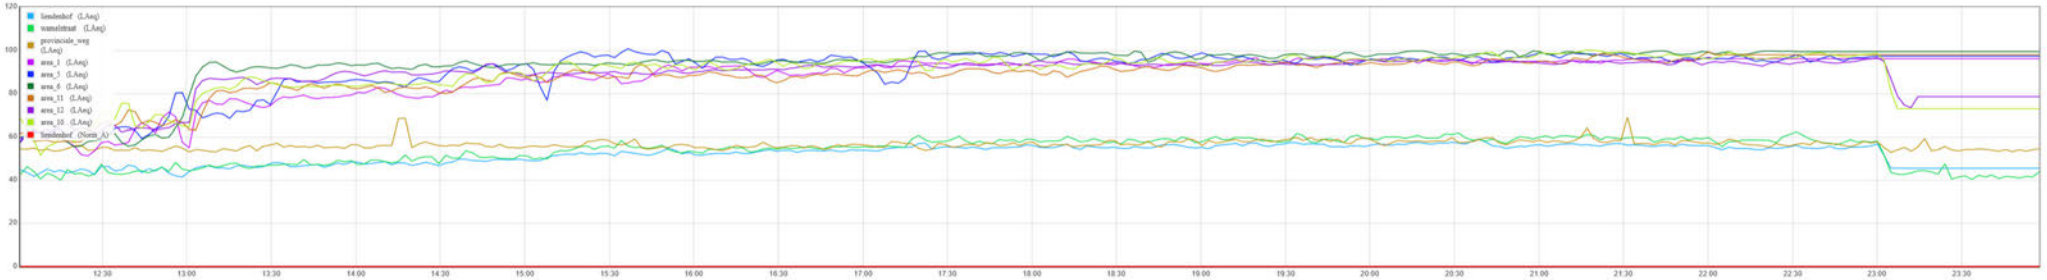

Overzicht zondag 04 juni 2023 LAeq

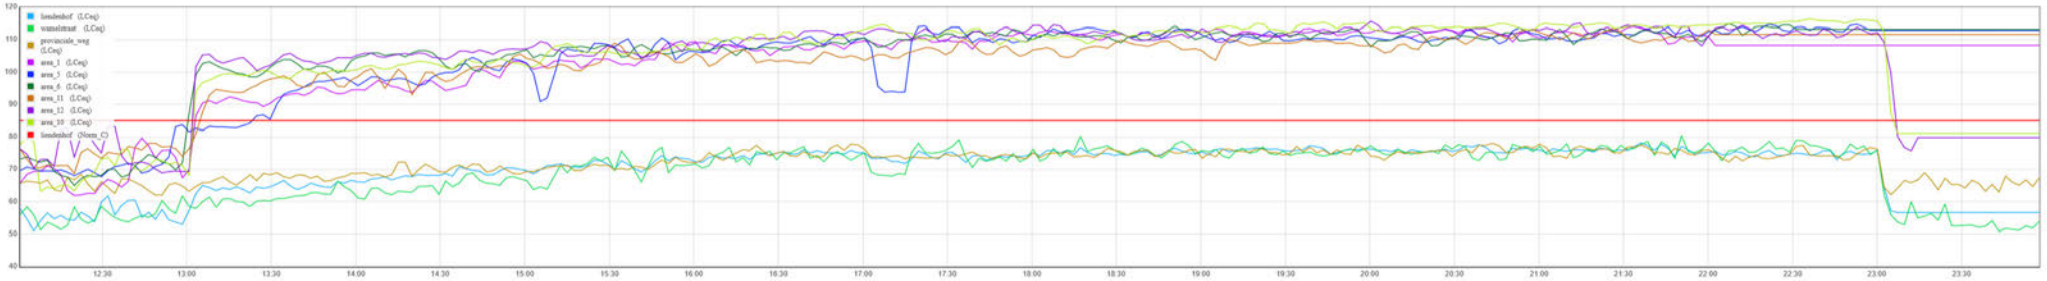

Overzicht zondag 04 juni 2023 LCeq

Gemeente Amsterdam

Geluidmetingen

Naam evenement	**Amsterdam Open Air festival 2023**
Locatie	Noordoever Gaasperpark
Datum	3 & 4 juni 2023
Tijd (van - tot)	12:00 – 23:00 uur
Aantal bezoekers	15000
Gecontroleerd door	5.1.2.e & 5.1.2.e
Decos nummer	Z/23/2129657-3968236

Niet vergeten !! **Serienummer**

Geluidsmeter : **SV 971A (Svantek)** **NO 124711**
(neem extra batterijen mee) **Rion NL-52** **NO 00542887**

Kalibrator : **Svantek IEC 60942:2017** **NO 134566**

Rion NC-74 **NO 34904920**

Meet resultaten	*Datum : 03-06-2023*	*Podium : 1*	*Area naam : Perfect Sky*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
13:35			85.9		
15:20			96.2		
18:00			91.9		
21:00	25 mtr vanaf podium	100	93.8		

Meet resultaten	*Datum : 03-06-2023*	*Podium : 5*	*Area naam : Container Stage (Samsung)*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
13:45			87.1		
15:30			95.3		
18:15			96		
21:09	25 mtr vanaf podium	100	96		

Meet resultaten	*Datum : 03-06-2023*	*Podium : 6*	*Area naam : Lipton Club*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
13:58			89.2		
15:46			95.9		
18:26			92		
21:22	25 mtr vanaf podium	100	95		

Meet resultaten	Datum : 03-06-2023	Podium : 10	Area naam : Intercell

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
14:11			89.8		
15:58			92		
18:48			99.1		
21:35	25 mtr vanaf podium	100	96.9		

Meet resultaten	*Datum : 03-06-2023*	*Podium : 11*	*Area naam : Live*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
14:22			84.6		
16:13			89.2		
19:00			91.8		
21:48	25 mtr vanaf podium	100	91.3		

Meet resultaten	*Datum : 03-06-2023*	*Podium : 12*	*Area naam : Casa Bacardi*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
14:31			89.7		
16:26			94		
19:14			92.8		
22:00	25 mtr vanaf podium	100	93.4		

Meet resultaten	*Datum : 04-06-2023*	*Podium : 1*	*Area naam : Perfect Sky*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
14:30			79		
17:35			99		
	25 mtr vanaf podium	100			

Meet resultaten	*Datum : 04-06-2023*	*Podium : 5*	*Area naam : Mainstage*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
14:43			94		
18:02			97.1		
	25 mtr vanaf podium	100			

Meet resultaten	*Datum : 04-06-2023*	*Podium : 6*	*Area naam : Lipton Club*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
15:01			95.8		
18:28			96.1		
	25 mtr vanaf podium	100			

Meet resultaten	*Datum : 04-06-2023*	*Podium : 10 0*	*Area naam : Intercell*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
15:14			95.4		
19:05			96.4		
	25 mtr vanaf podium	100			

Meet resultaten	*Datum : 04-06-2023*	*Podium : 111*	*Area naam : Live*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
15:35			88.6		
19:22			89.1		
	25 mtr vanaf podium	100			

Meet resultaten	*Datum : 04-06-2023*	*Podium : 122*	*Area naam : Casa Bacardi*

Meetgegevens

Tijd	Meetpunt FOH	Toegestaan dB(A)	Gemeten dB(A)		Actie
15:54			89		
19:44			90.9		
	25 mtr vanaf podium	100			

Meet resultaten		*Buiten meetpunten*

Meetgegevens

Tijd	Meetlocatie	Toegestaan dB(C)	Gemeten dB(C)	Actie
		85		
	Provinciale weg (Hemelrijk)	85	73.4	
		85		
	Liendenhof	85	78.9	
		85		
	Wamelstraat	85	82.2	
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		
		85		

Datum : 03-06-2023 + 04-06-2023	*SIG meldingen TIJDENS het evenement*

Tijd	SIG nummer	Adres	Langs geweest ?	Actie (bij geluid gemeten zie Buurtmeting)
12:36	1721035	Polsbroekstraat		
17:46	1721277	Anoniem		
18:23	1721315	Liendenhof		
18:32	1721318	Vleutenstraat		
18:46	1721329	Sleewijkstraat		
19:45	1721356	Anoniem		
19:55	1721363	Voorthuizenstraat		
19:56	1721364	Remmerdenplein		
20:09	1721375	Polsbroekstraat		
20:17	1721379	Scherpenzeelstraat		
20:42	1721399	Veldhuizenstraat		
21:15	1721423	Wamelstraat		
21:17	1721427	Veldhuizenstraat		
22:13	1721460	Leerdamhof		
22:24	172467	Anoniem		
22:32	1721476	Anoniem		
22:36	1721479	Dotter, Abcoude		
22:44	1721485	Wisseloord		
22:52	1721490	???		
23:17	1721510	Anoniem		
Zondag 04 juni 2023				
18:13	1722043	Maldenhof		
18:22	1722049	Remmerdenplein		
18:32	1722057	Liendenhof		
18:55	1722071	Ochtenhof		
20:40	1722145	wisseloord		
21:12	1722172	Snelleveldstraat		
21:17	1722173	Mijehof		

Tijd	SIGnummer	Adres	Langs geweest ?	Actie (bij geluid gemeten zie Buurtmeting)
21:52	1722201	Leerdamhof [redacted]		
22:07	1722217	Torenlaan, Abcoude		
22:21	1722227	Mijndenhof [redacted]		
22:23	1722229	Twellostraat		
22:27	1722230	Zelfde melding als 1722049		
22:27	1722231	Sinderenstraat [redacted]		
22:35	1722235	Snelleveldplein [redacted]		
22:37	1722237	Varikstraat [redacted]		
22:46	1722243	Terletstraat [redacted] (Anoniem)		
22:52	1722246	Anoniem		
23:12	1722251	Liendenhof [redacted]		

Datum : 05-06-2023	*SIG meldingen NA het evenement*

Tijd	Sia nummer	Adres	Soort klacht	Gebeld / Gemaild?
10:20	1722676	Snelleveldstraat [redacted]	Geluidsoverlast	Mail
13:11	1723040	Kromwijkdreef [redacted]	Geluidsoverlast	Mail
15:49	1723391	Gaasperdammerpad [redacted]	Geluidsoverlast	Mail
Klacht op 06 juni 2023				
16:01	1724974	Nellestein	Geluidsoverlast	Mail

Eind Conclusie evenement

Vermeld samenwerking tussen organisatie/ mensen van het geluid:

Tijdens het gehele evenement is de samenwerking tussen de firma Westerveld uitstekend geweest. Gezamenlijk metingen gedaan zowel op als rond het terrein.
Door WhatsApp altijd snel kunnen schakelen indien nodig.
De wind is zowel op de zaterdag als zondag een langdurige spelbreker geweest, vooral op zaterdag hebben we een hoger meting op de buitenstations gezien als op de zondag. Duidelijk was te zien dat de wind een behoorlijke invloed kon uitoefenen.

Vermeld problemen waar je tegen aan gelopen bent gedurende het evenement:

Door uitval NS op 4-6-23 hebben wij geen buiten & terrein metingen meer gedaan na 20.00 uur, we hebben met alle ketenpartners diverse malen crisis overleg gehad.
Echter door het tijdig met alle partijen rond de tafel te gaan zitten heeft de organisatie de bezoekers via pushberichten op de hoogte gehouden waardoor er geen echte excessen hebben plaats gevonden.

Vermeld overige op- of aanmerkingen welke betrekking hebben op het evenement:

Ook dit jaar kunnen we spreken van een geslaagd evenement, waarbij op de zondag door het afschalen van de bezoekers aantallen het duidelijk rustiger was op het terrein dan bij een volle bezetting. Samenwerking met de diverse diensten was ook dit jaar weer prima te noemen, mede doordat ook alle disciplines bij de dienst overleggen aanwezig waren.

Aantal binnen gekomen meldingen **tijdens** het evenement : **38** meldingen. (Waarvan 7 anoniem)

Aantal binnen gekomen meldingen **na** het evenement : **4** meldingen.

De geluidsmetingen gedurende het evenement zijn op het terrein verricht door;

5.1.2.e en 5.1.2.e

De geluidsmetingen gedurende het evenement zijn in de omgeving en naar aanleiding van klachten verricht door;

5.1.2.e en 5.1.2.e

Deze rapportage is opgemaakt door 5.1.2.e

***** Rapport uitprinten en ondertekenen, Meteo overzicht bijvoegen, scannen en opslaan zoals beschreven *****

Handtekening inspecteur 

Afdeling VTH Bouw & Gebruik
