Oevers inspectie

KVV0602

Functionele inspectie



	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld	[redacted]	22-dec-2004	[redacted]
gecontroleerd	[redacted]	23-12-'04	

	naam:	datum:	handtekening:
gezien	[redacted]	13-1-05	[redacted]

Ligging water	Kostverlorenvaart
Ligging straat	2e Kostverlorenkade
Tussen objecten	266 - 173
Tussen nummers	
Lengte	397

- Lengte 397
  Constructie walmuur-metselwerk
  Bouwjaar
  Van - Tot

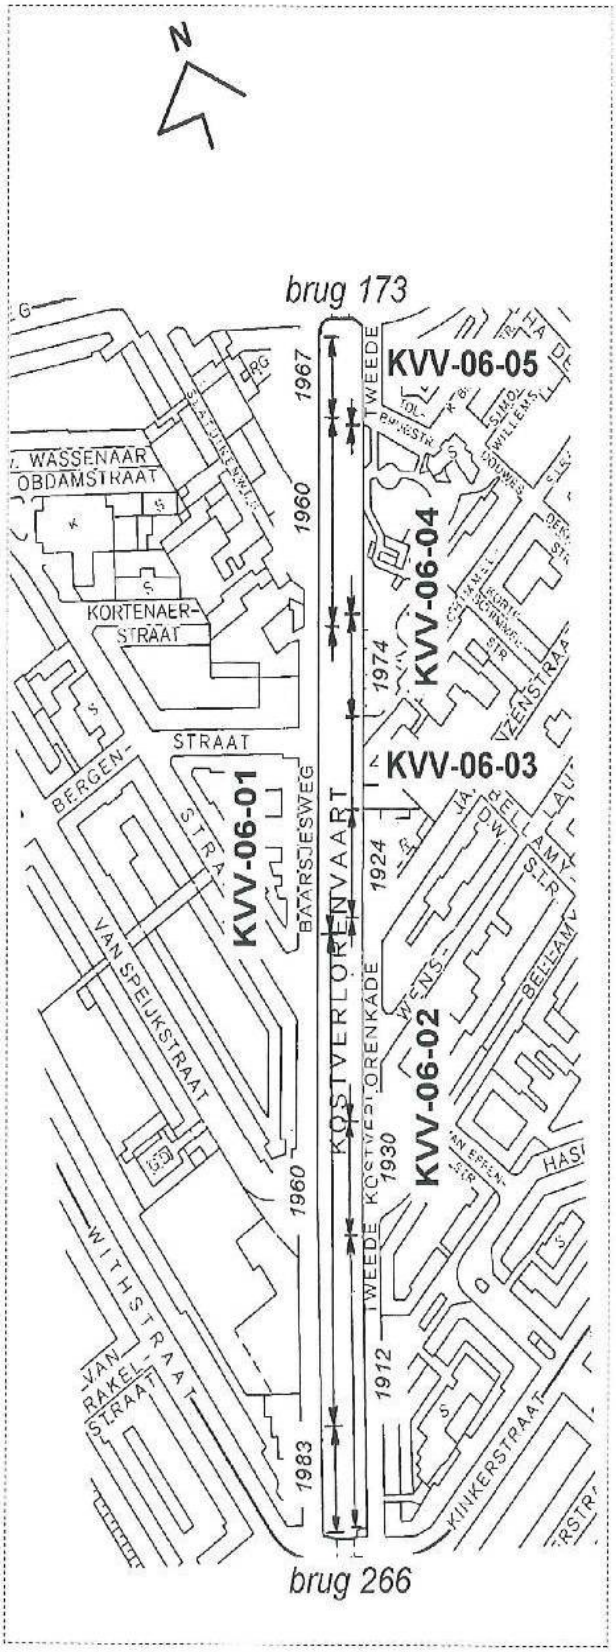

KVV0602

Inspecteurs : [redacted]
Inspectiedatum : 22-dec-2004

Nr.	Gebrek	Indicatie Kosten	Urg	Uitv. in groep
1	metselwerk, haarscheur	€ [redacted]	5	
2	metselwerk, aangetast op de waterlijn	€	5	
3	specie, los	€	3	
4	specie, scheur, horizontaal	€	3	
5	kit, onthecht	€	3	
6	natuursteen, incorrect	€	3	
7	specie, slecht	€	3	
8	natuursteen, beschadigd	€	5	
9	specie, scheur, horizontaal	€	5	
10	natuursteen, verschoven	€	3	
11	metselwerk, begroeid	€	5	
12	.., ..	€	5	
	Hoogste urgentie	€ [redacted]	1	
	Onderhoud noodzakelijk	€	2	
	Onderhoud gewenst	€	3	
	Lage urgentie	€	5	
	Totaal*	€ [redacted]		
	Nader onderzoek gewenst	Geen	4	
	In vernieuwingsprogramma	Initiatief		
	Vervanginsgswaarde ±	€ [redacted]		

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Volgnummer : 1
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats	: walmuur	
Onderdeel	: ..	
Detail	: ..	
Materiaal	: metselwerk	
Gebrek	: haarscheur	
Specificatie	: T.p.v. brug 266. Horizontaal ca.4,00mtr. Verticaal 4xca.2,00mtr.	± 8,00 mtr
Herstel	: Monitoren.	± € [redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 2
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : aangetast op de waterlijn

Specificatie : Ca.60% van de totaale lengte. ± 240,00 mtr

Herstel : Steens slopen en inmetselen m.b.v. kuip. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 3
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : voeg
Materiaal : specie
Gebrek : los

Specificatie : Diverse plaatsen. ± 25,00 mtr

Herstel : Uitslijpen en voegen. ± € [redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 4
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : voeg
Materiaal : specie
Gebrek : scheur, horizontaal

Specificatie : T.p.v. Hasebroekstraat. ± 40,00 mtr

Herstel : Uitslijpen en voegen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 5
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : dilatatievoeg
Materiaal : kit
Gebrek : onthecht

Specificatie : Alle voegen. ± 10,00 mtr

Herstel : Kit verwijderen en kit op rugvulling aanbrengen. ± €

Vakdiscipline : Kitwerk

Volgnummer : 6
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 3

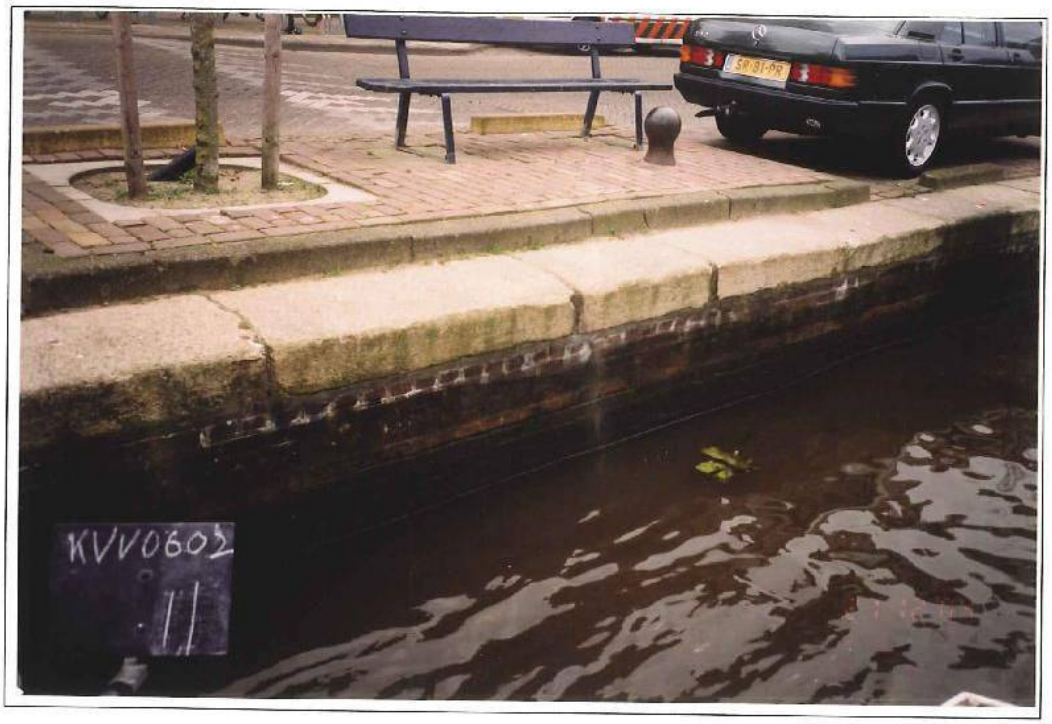

Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : natuursteen
Gebrek : incorrect

Specificatie : T.p.v. Hasebroekstraat 2x4st. omhooggedrukt. ± 8,00 stuks

Herstel : Herleggen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 7
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : voegwerk
Materiaal : specie
Gebrek : slecht

Specificatie : Diverse plaatsen. ± 6,00 m2

Herstel : Uitslijpen en voegen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 8
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : natuursteen
Gebrek : beschadigd

Specificatie : Diverse plaatsen, beschadigd ca.10% van het totaal. Gebroken 3st. ± 26,00 stuks

Herstel : Monitoren. ± € [redacted]

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 9
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : voeg
Materiaal : specie
Gebrek : scheur, horizontaal

Specificatie : T.p.v. Wenslaurstraat. ± 4,00 mtr

Herstel : Monitoren. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 10
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 3



Plaats : walmuur
Onderdeel : dekzerk
Detail : ..
Materiaal : natuursteen
Gebrek : verschoven

Specificatie : T.p.v. nr.45, 8 stuks. ± 15,00 mm

Herstel : Herleggen. ± €

Vakdiscipline : Metselwerk

Volgnummer : 11
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 5



Plaats : walmuur
Onderdeel : ..
Detail : ..
Materiaal : metselwerk
Gebrek : begroeid

Specificatie : Diverse plaatsen mosgroei. Ca.50% van het gehele oppervlak. ± 200,00 m2

Herstel : Periodiek schoonmaken. ± €

Vakdiscipline : Schoonmaakwerk

Volgnummer : 12
Code : KVV0602
Type : Oevers inspectie

urgentie 5

0

Geen foto

22-dec-2004

Plaats : walmuur
Onderdeel : peiling
Detail : ..
Materiaal : ..
Gebrek : ..

Specificatie : Waterstand 0.40 -NAP ± 0,00 mtr

Herstel :

Vakdiscipline : ..

Overspeel resultaat

Melding

Datum : 22-dec-2004 Inspectietype : Oevers inspectie
Inspecteur : [redacted] Functionele inspectie

Verwerkte inspectie

Code : KVV0602

Datum : 22-dec-2004

	nieuw volgnr.	oud volgnr.	
KVV0602	001	(001)	Gewijzigd gebrek
KVV0602	002	(002)	Gewijzigd gebrek
KVV0602	003	(003)	Gebrek is hetzelfde gebleven
KVV0602	004	(004)	Gebrek is hetzelfde gebleven
KVV0602	005	(000)	Nieuw gebrek
KVV0602	006	(000)	Nieuw gebrek
KVV0602	007	(000)	Nieuw gebrek
KVV0602	008	(000)	Nieuw gebrek
KVV0602	009	(000)	Nieuw gebrek
KVV0602	010	(000)	Nieuw gebrek
KVV0602	011	(000)	Nieuw gebrek
KVV0602	012	(005)	Gebrek is hetzelfde gebleven

Aantal ingelezen gebreken : 12
