Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	5 juli 2022	2203-17228- v 0.7
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig:	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1.2e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
	Salverda	5.1.2e
5.1.2e	Salverda	
	BBN directievoerder	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	Geen mededelingen	
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 22-3-2022 – niet besproken	
	Verslag 12-4-2022 – opmerkingen per mail zijn verwerkt	
	Verslag 24-05-2022 – rondgang door Aquarium	
	Verslag 14-06-2022 – niet besproken, rondgang aquarium	-
	Verslag 05-07-2022 – rondgang aquarium	
1.03	**Werkplannen**	
	– Stukje gevel als bestaand houden referentie locatie afstemmen met 5.1.2e en concreet voorstel doen	5.1.2e
	– Werkplan stucwerkherstel opstellen na verwijderen verf – volgt is lopende actie	5.1.2e
	Werkplannen gegevensbehoefteschema voorzien van beoordeling- en acceptatietermijnen – regelmatige update n.a.v. stand van werk – volgt is lopende actie	5.1.2e
1.04	**Natuursteen gevel**	
	Ankers/doken detecteren verder uitwerken – voorstel en uitwerking volgt.	5.1.2e
	Salverda heeft muurscanner gekocht, afhankelijk van levering wordt detectie door Salverda uitgevoerd.	
	Mock-up natuursteen wordt gerealiseerd met als doel juiste steen, behandeling en opzet voor werkplan te maken locatie As J-26.	5.1.2e
1.05	**Stucwerkgevel**	
	– Stucwerk herstel opnemen na verwijderen verf een en ander volgens uitvoeringsplanning	

	Op 4 juli is Venema gestart met het verwijderen van de verf volgens werkwijze in het werkplan. De reden om alvast te starten is omdat het uitvoeringstechnisch beter is om te werken met een rolsteiger zodat er geen staanders en plateau's de bereikbaarheid hinderen. Nu kan de gevel zo snel mogelijk tot rust komen. Ook het eindbeeld kan beter beoordeeld worden voordat de gevel onttrokken wordt aan het zicht door de vaste steiger. Dit helpt om de vervolg handelingen zorgvuldig te bepalen. Werkvolgorde: 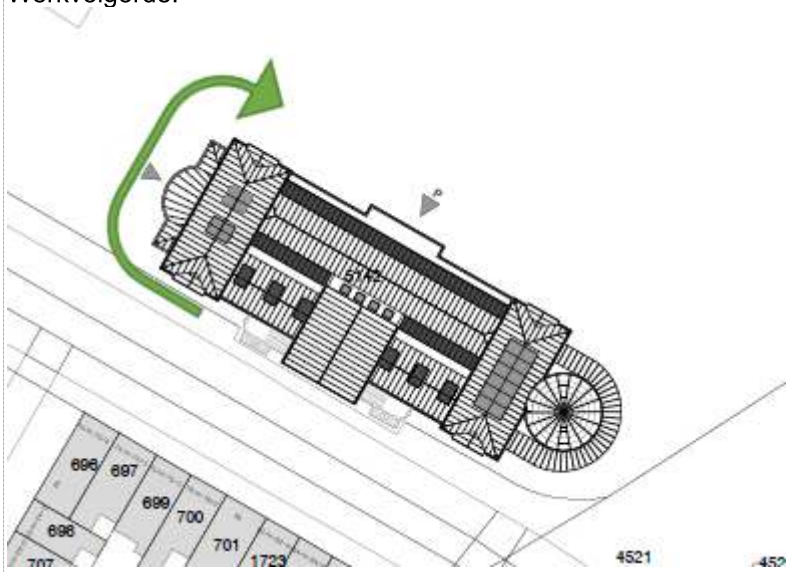 Uitvoeringshoogte fase 1:  Opname moment is gepland op: 14-07-2022 om 10.00 uur bij het aquarium. Aanwezig zijn 5.1.2e en 5.1.2e.	5.1.2e
1.06	**Daken**	
	-	
1.06	**Binnenafbouw**	
03-05	Naar aanleiding van het adviesrapport van ZRI. AAQ2102M020 - Onderzoek hygrisch gedrag gevel filterkelder 20220303, wordt de voorzetwand aan de noordgevel een dampopensysteem (rockwool og isolatiemateriaal).	

	 Het bestaande rapport wordt nog uitgebreid met een aanvullende berekening, RV in bedrijftoestand. OTH komt met voorstel voor de verdere afwerking van de voorzetwand – lopende actie	
1.07	**Overige bespreekpunten**	
	Vergadercyclus na de bouwvak (inmiddels aangepast en ingepland) We starten op 23 augustus en houden een 3 weekse interval aan.	
	Startbouw(vak), informele bijeenkomst op 19 juli vanaf 12.00 uur	
	Planning op hoofdlijnen, verwacht de komende periode: • 4 juli start verwijderen verf steenachtige ondergronden • 19 juli stripsloop gereed • 20 juli aanvang stut- stempelwerk / constructiesloop bouwdeel A -> B -> C • Verwacht einde sloopwerken november	
	Er is ter plaatse van zoutwater gedeelde zwaar vervuilde grond aangetroffen. Met name lood en zink. BUS-melding loopt 5.1.2e zorgt dat 5.1.2e gekoppeld wordt aan de collega die hier overgaat.	
	Monumentale onderdelen zijn gedemonteerd en getransporteerd naar opslaglocatie van Salverda in Swifterbant.	
	Voor bemonstering wordt monsterkamer ingericht in de in unit op de bouwplaats.	
	Er wordt een rapportage opgesteld van de heropname momenten. Zaken die geconstateerd zijn worden gedeeld met betrokkenen.	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3
