Memo

T.a.v. De heer 5.1, 2, e | Gemeente Amsterdam
Onderwerp Rapportage kwaliteitsmeting woonwagencentra
Datum 9 januari 2020

Inleiding

Aanleiding

De gemeente beheert in Amsterdam 18 woonwagenlocaties en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam is bezig met het (her)schrijven van het beleidskader Woonwagens- en standplaatsen. Hierin worden verbeteringsvoorstellen opgenomen voor locaties waar het onderhoud onder de maat is. Om inzicht te krijgen in de huidige staat van het onderhoud heeft u door iFocus/Cyber adviseurs de kwaliteit van de openbare ruimte laten meten. Hierbij is gekeken naar bestrating, verlichting, meubilair en het groen.

Meting

De meting is uitgevoerd op 19 december 2019 door twee CROW gecertificeerde inspecteurs. De inspecteurs zijn samen met de beheerders van de gemeente de locaties langsgegaan. Op elke locatie is de beeldkwaliteit middels de beeldmeetlatten van het CROW vastgelegd. Daarnaast zijn er per locatie meldingen gemaakt van opmerkelijk heden/achterstanden die niet (volledig) in een beeldmeetlat kunnen worden gevat.
De resultaten van de meting en meldingen samen geven een volledig beeld per locatie.

Leeswijzer

De memo start met een toelichting op de meetsystematiek. Daarna wordt het totaalresultaat (over 18 locaties) toegelicht en is aangegeven in welke mate achterstanden/bijzonderheden zijn aangetroffen. Vervolgens treft u de aanbevelingen over het totaal aan.

In de bijlage wordt per locaties kort, bondig en met foto's de kwaliteit beschreven.

Beeldsystematiek

Meetlatten CROW

Om een objectieve beoordeling te kunnen geven van de kwaliteit van de openbare ruimte is de beeldsystematiek toegepast. Deze door het CROW ontwikkelde systematiek hanteert vijf kwaliteitsniveaus voor de beoordeling van de kwaliteit van arealen. De niveaus lopen van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D), zoals weergegeven in Figuur 1. Voor het bepalen van ambities worden alleen niveaus A, B en C gebruikt. A+ is een opleveringskwaliteit die in de praktijk moeilijk is vast te houden. Niveau D wordt gebruikt om aan te geven dat niveau C niet is gehaald en kan niet als ambitie worden gebruikt. Alle niveaus kunnen in de praktijk worden aangetroffen.

Vijf onderhoudsniveaus				
A+	A	B	C	D
Zeer hoog	**Hoog**	**Basis**	**Laag**	**Zeer laag**
Nagenoeg ongeschonden	Mooi en comfortabel	Functioneel	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale veiligheid.

Figuur 1. Vijf kwaliteitsniveaus volgens de beeldsystematiek.

Er zijn ruim 200 meetlatten gedefinieerd die voor het verschillende areaal vereisten weergeven voor het voldoen aan een bepaald onderhoudsniveau. Een voorbeeld van een meetlat ziet u in Figuur 2. Het gaat in dit geval om een meetlat voor de bevuiling van lichtmasten. Deze meetlat is onderdeel van het bepalen van het kwaliteitsniveau van verlichting binnen de beheergroep meubilair. Als het areaal voldoet aan de eisen die binnen een beeldmeetlat gelden voor niveau B, dan scoort het areaal een B voor die beeldmeetlat. In het voorbeeld zal een lichtmast die minder dan 20% maar meer dan 10% bevuild is een C-score krijgen.

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.33.10

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling

A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is weinig bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is redelijk erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0% per lichtmast	**mate van bevuiling** ≤ 5% per lichtmast	**mate van bevuiling** ≤ 10% per lichtmast	**mate van bevuiling** ≤ 20% per lichtmast	**mate van bevuiling** >20% per lichtmast

Figuur 2. Voorbeeld van een beeldmeetlat met eisen voor het voldoen aan een bepaald niveau.

Meetmethode

De metingen zijn door schouwers van iFocus/Cyber Adviseurs uitgevoerd op basis van de CROW systematiek. Er is gebruik gemaakt van het Apptimize platform. Op dit platform worden alle scores in tabellen met foto's visueel, per locatie, weergegeven. De meting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Er zijn 18 woonwagenlocaties beoordeeld.

Brentanostraat	Dilbeekpad	Dwergplanetenbaan
G. Bouwenszstraat	J. Broedeletstraat	J. Calsstraat
Lakenhalstraat	Ma Braunpad I	Ma Braunpad II
Markengouw	Meerkerkdreef	Nellie Bodenheimstraat
Noorderakerweg	Osdorperweg	Ringvaartdijk
Rollemanstraat	Ruys de Beerenbrouckstr.	Willem de Zwijgerlaan


- Elke woonwagenlocatie is één meetlocatie. Hiervoor is gekozen vanwege het specifieke areaal. Dit sluit aan bij de logische grenzenmethode van het CROW.
- De meting is uitgevoerd volgens de methodiek van een bestekmeting. In elke meetlocatie is het meetvak, meetelement of meetstrook met de laagste kwaliteit beoordeeld.
- Uitgangspunt voor de metingen is basisniveau, CROW beeldkwaliteit B.
- De gebruikte beeldmeetlatten (ca. 80) zijn afkomstig uit de KOR 2018.
- Van elk incident (score onder de ambitie) is een detailfoto gemaakt.
- Naast de metingen hebben de schouwers gelet op bijzonderheden en achterstanden die belangrijk zijn voor de rapportage en het beleidskader.
- Aan de hand van de gemeten scores wordt over het totaal het kwaliteitsniveau berekend. Een uitleg van de berekeningsmethode vindt u in bijlage 1.

Resultaten over 18 locaties.

Meetresultaten


De totaal resultaten van de 18 woonwagenlocaties vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle woonwagenlocaties en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de buitenruimte op een D-niveau. 82% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal, over 18 locaties en alle beeldmeetlatten, zijn er 576 waarnemingen gedaan (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beheergroep

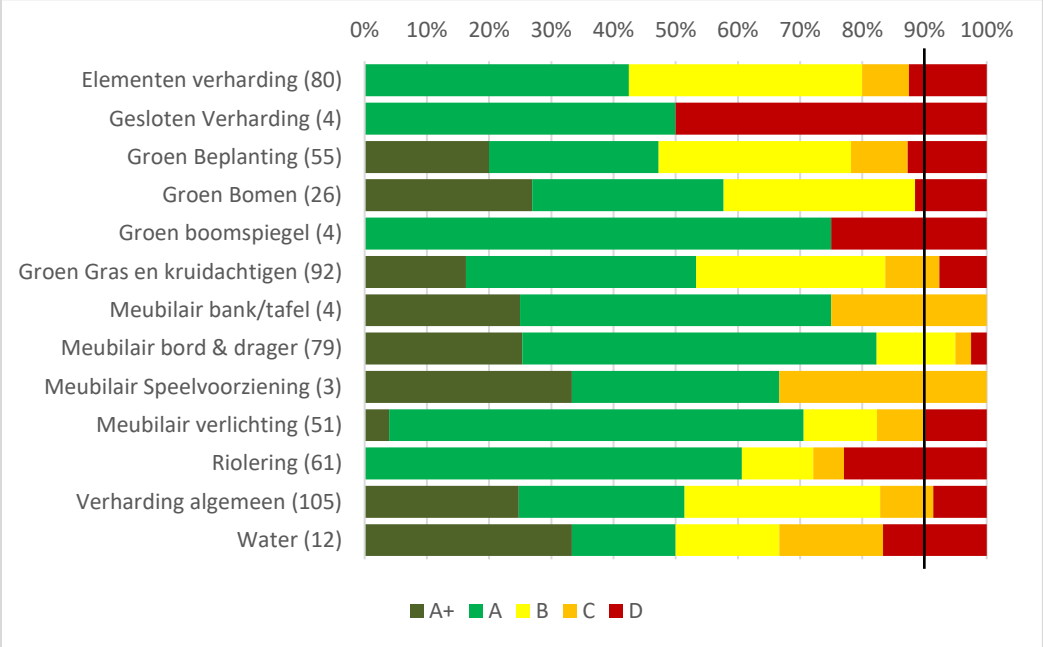


De totaal resultaten per beheergroep laten zien dat de beheergroepen; ‘gesloten verharding’, ‘groen boomspiegel’, ‘meubilair speelvoorziening’ en ‘meubilair bank/tafel’ slecht scoren. In deze groepen zijn slechts 3 respectievelijk 4 waarnemingen gedaan, één waarneming beïnvloed dan 33% respectievelijk 25% van de score. Dit kan een vertekend beeld geven.

Memo

Per beheergroep zijn de volgende zaken geconstateerd.

- In de groep ‘elementen verharding’ zijn in totaal 15 incidenten aangetroffen. Negen incidenten met betrekking tot onkruid op verharding. Vijf incidenten met betrekking tot oneffenheden. Zie foto’s:

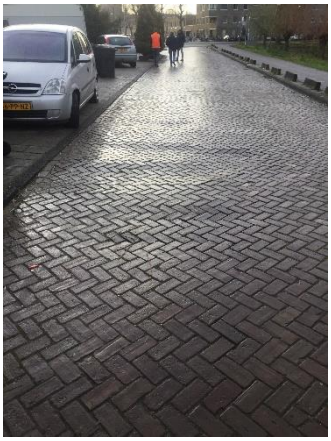
- ‘Gesloten verharding’ is alleen aangetroffen op locatie Meerkerkdreef en Markengouw. Op locatie Markengouw scoort zowel de beeldmeetlat m.b.t. oneffenheden als de beeldmeetlat m.b.t zichtbare reparaties onder ambitie. Beide incidenten zijn gemeten op het pad dat achter de locatie langs loopt en worden veroorzaakt door wortelopdruk. Zie foto’s:




- In de groep ‘groen beplanting’ zijn in totaal 15 incidenten aangetroffen. Vijf incidenten met betrekking tot zwerfafval/grofvuil/opslag in de beplating. Vier incidenten met betrekking tot snoeiwerkzaamheden, drie tot onkruid in beplanting. Zie foto’s:





- In de groep ‘groen boom’ zijn in totaal drie incidenten aangetroffen. Twee incidenten met betrekking tot waterlot. Eén incident heeft betrekking op de staat van de boompaal, de boompaal is afgebroken.
  Zie foto’s:





- In de groep ‘groen gras en kruidachtigen’ zijn in totaal 15 incidenten aangetroffen. Negen incidenten met betrekking tot zwerfafval/grofvuil/opslag in het gras. Drie incidenten hebben betrekking op beschadigingen / sporen in het gras. Zie foto’s:





- ‘Groen boomspiegel’ is alleen aangetroffen op locatie Rollemanstraat. Hier scoort de boomspiegel m.b.t. onkruid een D niveau. De overige beeldmeetlatten scoren op en boven ambitie. Zie foto:



- ‘Meubilair speelvoorziening’ is alleen aangetroffen op locatie Rollemanstraat. Hier scoort de beeldmeetlat m.b.t. bevuiling een C niveau. De speelvoorzieningen zijn bevuild door natuurlijke aanslag. Dit is eenvoudig te verhelpen middels een reguliere onderhoudsronde. De overige beeldmeetlatten scoren op en boven ambitie. Zie foto:



- ‘Meubilair recreatieve voorziening bank/tafel’ is alleen aangetroffen op locatie Ringvaartdijk. Hier scoort de beeldmeetlat m.b.t. bevuiling een C niveau. Beide bankjes zijn bevuild door natuurlijke aanslag. Dit is eenvoudig te verhelpen middels een reguliere onderhoudsronde. De overige beeldmeetlatten scoren boven ambitie. Zie foto:



- In de groep ‘meubilair bord & drager’ zijn in totaal vier incidenten aangetroffen. Drie incidenten hebben betrekking op bevuiling van de dragers en bebording. Eén incident heeft te maken met scheefstand van een drager. Zie foto’s:







- In de groep ‘meubilair verlichting’ zijn in totaal negen incidenten aangetroffen.Zes incidenten hebben betrekking op bevuiling van de lantaarnpalen. Twee incidenten hebben te maken met graffiti en beplakking, één incident heeft te maken met deuken en gaten. Zie foto’s:





- In de groep ‘riolering’ zijn in totaal 17 incidenten aangetroffen. Negen incidenten hebben betrekking op belemmering van de inlaat. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bladafval. Acht incidenten hebben te maken met de oneffenheden van de kolk en putafdekking t.o.v. de omliggende bestrating.
Zie foto’s:





- ‘Verharding algemeen’ laat de meeste incidenten zien, in totaal 18. Tien incidenten hebben betrekking op zwerfvuil en grofvuil. De overige incidenten hebben betrekking op veegvuil en natuurlijk afval op de verharding, dit is niet schokkend voor de tijd van het jaar. Middels een veegronde zijn de incidenten op te lossen. Zie foto’s:





- In de groep ‘water’ zijn slechts vier incidenten gemeten. Drie incidenten hebben betrekking op afval in water, één incident heeft betrekking op de staat van de beschoeiing. Zie foto’s:





-

Bijzonderheden en eventuele achterstanden over alle woonwagenlocaties

Tijdens de meting zijn onze collega’s de oren en ogen op de woonwagenlocaties. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie ‘meldingen’ in het Apptimize Platform. Hieronder volgt en beknopt overzicht wat voor meerdere woonwagenlocaties geldt. Later in het rapport komen de meldingen op locatieniveau terug.

Oevers

- Het viel de schouwers op dat woonwagenlocaties die omringt zijn door water vaak een overwoekerde/rommelig ogende oever hebben. De standplaatsen stoppen een x aantal meter voor het water. Hierdoor blijft een smalle, lastig te onderhouden, groenstrook over. Enkele bewoners hebben een gedeelte van deze groenstrook bij de standplaats getrokken, hierdoor loopt deze niet altijd rond. Zie foto’s:





Openbare ruimte als opslagplaats

- Op meerdere locaties wordt de openbare ruimte door bewoners gebruikt als opslag plaats. Dit varieert van straatstenen, aanhangwagens en meubilair. Dit kan de aannemer/stadswerken belemmeren bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Zie foto's:





Zelf geplaatste speelplekken

- Op meerdere locaties zijn in de openbare ruimte speeltoestellen neergezet. De aangetroffen kwaliteit varieert en ze worden niet jaarlijks gekeurd op veiligheid. Wellicht kan de gemeente hier iets in betekenen in de toekomst. Zie foto's:





Conclusies en aanbevelingen


Deze metingen vonden plaats op basis van de beeldsystematiek, waarbij werd uitgegaan van een ambitie op niveau B. Het is goed om te realiseren dat de metingen een momentopname zijn waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Daarnaast is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Gemeten over alle woonwagenlocaties en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de buitenruimte op een D-niveau. 82% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal zijn er over 18 locaties en alle beeldmeetlatten (maar) 576 waarnemingen gedaan. Het aantal waarnemingen per beheergroep is erg verschillend. In sommige gevallen is één enkele waarneming al verantwoordelijk voor 33% van de score van de beheergroep. Dit kan het beeld vertekenen.

Merendeel van de incidenten heeft betrekking op:

- Zwerfafval & grofvuil (groen, grijs, water)
- Onkruid op verharding
- Bevuiling van meubilair (borden, bankjes, lantaarnpalen, etc.)
- Natuurlijkafval (belemmering kolken & op verharding)

In het figuur hiernaast ziet u een overzicht van de elementen die het beeld van de leefomgeving bepalen: inrichting, beheer en gebruik. Op basis van de meetresultaten van de omgeving kan blijken dat de cirkel van inrichting, beheer en gebruik niet in balans is en er actie moet worden ondernomen. Dit raakt aan de driehoek buiten de cirkel: zijn er voor de nodige actie voldoende middelen, moet er iets veranderd worden in de organisatie, of zijn er wijzigingen in het beleid nodig?

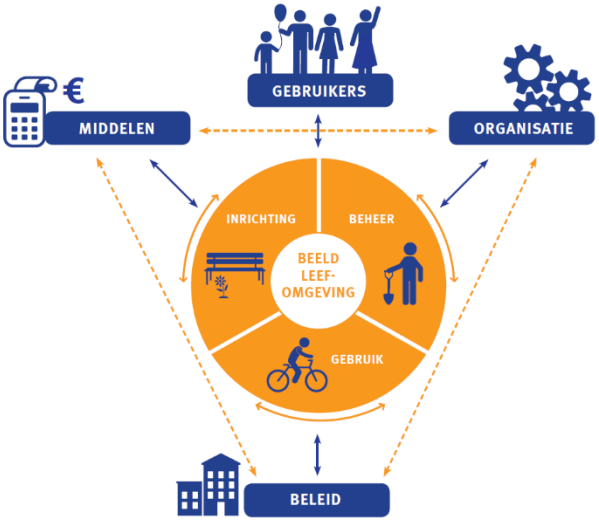

De woonwagenlocaties voldoen momenteel niet aan kwaliteitsniveau B. Aanbevolen wordt meer aandacht te bsteden aan het thema zwerfafval, onkruid en bevuiling van meubilair. Op enkele plaatsen kan de verharding worden vereffend.


Merendeel van de incidenten zijn middels een reguliere onderhoudsronde relatief eenvoudig te verhelpen. Deze kunnen de kwaliteit van de locaties aanzienlijk verbeteren. Andere zaken, zoals de groenstrook langs de oevers, vereffenen van de verhading en het tegengaan van dumping/stalling in de openbare ruimte zijn grotere ingrepen. Om de kwaliteit verder te verhogen zijn deze ingrepen wel nodig. Wij adviseren om de problematiek rond de groenstroken van de oevers met elkaar te bespreken, stel hierbij de volgende vragen: is het mogelijk om de groenstroken bij de standplaatsen uit te geven?, hoe kunnen deze stroken worden omgevormd om het onderhoud en de toegangkelijkheid te verbeteren?, hoe gaan we om met bewoners die deze strook reeds bij de standplaats hebben ‘getrokken’?

Resultaten per woonwagenlocatie

Brentanostraat

De indruk van de locatie is dat het er netjes en verzorgd uitziet.
De meetresultaten van locatie: Brentanostraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Brentanostraat op een C-niveau. 88% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 25 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-grofvuil	A+
Groen-beplanting-onkruid	D
Groen-beplanting-uitwerpselen	A
Groen-beplanting-zwerfafval grof	B
Groen-boom-beschadiging	B
Groen-boom-takvrije zone wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	A
Groen-boom-waterlot	B
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	A
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	D
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	C
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	A
Verharding-zwerfafval fijn	A
Verharding-zwerfafval grof	A

De tabel op de vorige pagina laat zien dat drie beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Brentanostraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-onkruid
  Plantvak omvormen of herinrichten.
- Riolering-kolk oneffenheid
  Levert geen gevaarlijke situaties op. Omliggende goot laten aansluiten op kolk.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
  In volgende regulier onderhoudsronde meenemen.

Zie foto's:





Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn wij de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Brentanostraat.

- Aanwezige beplanting (grens locatie / wijk) is overwoekerd door bramen en klimop.
- Onkruid op verharding. Dit is slechts plekgewijs aanwezig, merendeel is schoon.
- Omliggende bomen hangen deels over de standplaatsen heen.

Zie foto's:






Memo

Dilbeekpad

De indruk van de locatie is dat het er netjes en verzorgd uitziet.
De meetresultaten van locatie: Dilbeekpadt vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Dilbeekpad op een C-niveau. 89% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 37 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-boom-beschadiging	A
Groen-boom-takvrije zone wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	A+
Groen-boom-waterlot	B
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	D
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	A
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	A
Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-bord-bevuiling	B
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	A
Meubilair-bord-deuken en gaten	A
Meubilair-bord-kleurechtheid	A
Meubilair-bord-verdraaiing	A
Meubilair-bord-volledig	A+
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	B
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	C
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	B
Verharding-wortelopdruk	A
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	B
Water-drijfvuil in water	A
Water-zinkvuil in water	A+

De tabel op de vorige pagina laat zien dat slechts vier beeldmeetlatten onder ambitie scoren op het Dilbeekpad. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Riolering-kolk oneffenheid
  Levert geen gevaarlijke situaties op. Kolk ligt boven de omliggende bestrating, hierdoor loopt het water minder goed weg. Kolk evt. laten zakken.
- Riolering-kolk-belemmering inlaat
  Meerdere kolken worden belemmerd door onkruid en blad. Advies is om een borstelwagen de goten te laten reinigen.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
  Onkruid komt allen in de goten voor. Advies is om een borstelwagen de goten te laten reinigen.
- Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil
  Meerdere spullen gestald/gedumpt in het gras. Bewoners aanspreken vervolgens handhaven.

Zie foto's:






Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn wij de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie ‘meldingen’ in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Dilbeekpad.

- Aanwezige grasstrook (langs parkeerstrook) is overwoekerd door bramen en brandnetels.
  Advies is om het eenmalig te verwijderen. Vervolgens de strook intensief maaien.
- Onkruid in goten op verharding.
- Oever oogt rommelig en is sprake van onderhoudsachterstand.
  De groenstrook op de oever is lastig te onderhouden. Hier is nu sprake van achterstand. Advies is om desbetreffende stroken voor de verschillende locaties eenduidig op te lossen. Mogelijk uitgeven bij standplaats, mogelijk omvormen.

Zie foto’s:

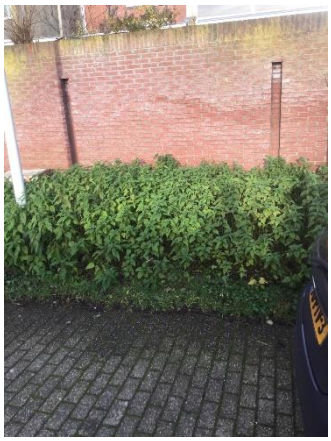




Memo

Dwergplanetenbaan

De indruk van de locatie is dat het er nieuw, netjes en verzorgd uitziet.
De meetresultaten van locatie: Dwergplanetenbaan vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Dwergplanetenbaan op een D-niveau. 84% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 50 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-haag-gaten in haag	A
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen	A
Groen-beplanting-onkruid	C
Groen-beplanting-uitwerpselen	A+
Groen-beplanting-zwerfafval grof	A
Groen-boom-beschadiging	A
Groen-boom-staat boompalen en -banden	D
Groen-boom-takvrije zone wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	A+
Groen-boom-waterlot	D
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	D
Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	A
Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	A
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A+
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	D
Meubilair-afvalbak-scheefstand	D
Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A
Meubilair-bord-bevuiling	B
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	A
Meubilair-bord-deuken en gaten	A
Meubilair-bord-kleurechtheid	A
Meubilair-bord-verdraaiing	A
Meubilair-bord-volledig	A+
Meubilair-drager-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-drager-bevuiling	A
Meubilair-drager-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	C
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A

Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-onkruid rondom obstakels	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	A
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	B
Water-drijfvuil in water	B
Water-technische staat lichte beschoeiing	A
Water-zinkvuil in water	A+

Voorgaande tabel laat zien dat acht beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Dwergplanetenbaan. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-onkruid
  De haagvoet staat vol onkruid. Advies is om kanten te steken en vervolgens te schoffelen.
- Groen-boom-staat boompalen en -banden
  De aanwezige boompalen zijn overbodig. De palen kunnen verwijderd worden.
- Groen-boom-waterlot
  Er is veel waterlot aanwezig op de bomen. Advies is om dit te verwijderen gelijktijdig met de boompalen.
- Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging
  Grasmat is op meerdere locaties beschadigd door zwaar materieel. Het gaat hier niet om zichtlocaties.
- Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof
  Rond container opstalplaats veel zwerfvuil aanwezig. Verder schoon.
- Riolering-kolk-belemmering inlaat
  Enkele kolkinlaten worden belemmerd door blad. Dit is voor de tijd van het jaar niet vreemd.
- Riolering-kolk-oneffenheid
  Kolken liggen relatief laag in de bestrating, geen gevaarlijke situatie. Water wordt goed afgevoerd.

Zie foto's:










Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Dwergplanetenbaan.

- Houtachtige opslag aanwezig op loop/fietsbrug.
  Laten verwijderen.
- Onkruid op verharding.
  Alleen aanwezig op parkeerplaats waar container staat. Advies is om eigenaar aan te spreken en/of handhaving in te schakelen. Momenteel voor aannemer niet mogelijk om te reinigen.

Zie foto's:

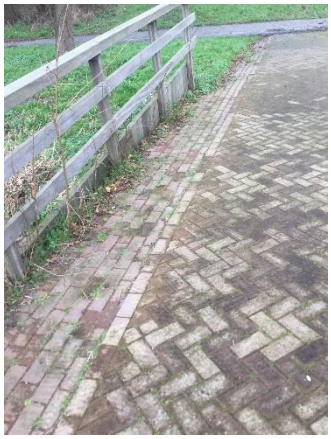



Memo

Geleyn Bouwenszstraat

De indruk van de locatie is dat het er netjes uitziet. De openbare ruimte wordt gebruikt als opslag plaats.
De meetresultaten van locatie: Geleyn Bouwenszstraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Geleyn Bouwenszstraat op een D-niveau. 78% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 41 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras	B
Groen-beplanting-grofvuil	A+
Groen-beplanting-haag-gaten in haag	B
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen	A
Groen-beplanting-uitwerpselen	A+
Groen-beplanting-zwerfafval grof	D
Groen-boom-beschadiging	B
Groen-boom-takvrije zone wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	A+
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	D
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	C
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	C
Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-bord-bevuiling	D
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	B
Meubilair-bord-deuken en gaten	A
Meubilair-bord-kleurechtheid	A
Meubilair-bord-verdraaiing	A
Meubilair-bord-volledig	A+
Meubilair-drager-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-drager-bevuiling	C
Meubilair-drager-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	D
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	A
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	D
Verharding-onkruid rondom obstakels	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	A

Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	B
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	A

Voorgaande tabel laat zien dat negen beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Geleyn Bouwenszstraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-zwerfafval grof
  Reguliere zwerfvuilronde uitvoeren.
- Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil
  Bewoners aanspreken op gedrag. Grasstrook wordt gebruikt als opslagplaats en dump.
  Reguliere zwerfvuilronde uitvoeren
- Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval
  Veel bladafval in groenstrook. Combineren met verwijderen natuurlijkafval op verharding. Bijv. verharding op blazen en vervolgens veegwagen langs sturen.
- Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof
  Combineren met bladruimactie
- Meubilair-bord-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Meubilair-drager-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Riolering-kolk-belemmering inlaat
  Kolk inlaten belemmerd door bladafval. Combineren met verwijderen natuurlijkafval op verharding
- Verharding-natuurlijk afval op verharding
  Er is veel natuurlijkafval aanwezig in de goten/parkeerstrook. Advies veegwagen langs sturen.

Zie foto's:










Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Geleyn Bouwenszstraat.

- Uitstapstrook is niet meer zicht-/beloopbaar.
  Door veegvuil en bladafval is de uitstapstrook niet meer functioneel. Advies is om tijdens de onderhoudsronde de strook reinigen.
- Hedera in bomen.
  Er is erg veel Hedera aanwezig in de bomen naast de parkeerstrook. Hierdoor vangen de bomen extra wind. Advies is om de bomen te laten controleren en eventueel de Hedera te verwijderen.
- Openbare ruimte wordt gebruikt als opslagplaats.
  Bewoners aanspreken op gedrag. Eventueel handhaving intensiveren.

Zie foto's:






Memo

J. Calsstraat

De indruk van de locatie is netjes en verzorgd. De locatie maakt is onderdeel van de woonwijk.
De meetresultaten van locatie: J. Calsstraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: J. Calsstraat op een C-niveau. 87% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 23 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	B
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	A
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A+
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	C
Riolering-kolk-belemmering inlaat	A
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	B
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	A
Verharding-zwerfafval fijn	A
Verharding-zwerfafval grof	A
Water-drijfvuil in water	D
Water-technische staat lichte beschoeiing	C
Water-zinkvuil in water	A+

Voorgaande tabel laat zien dat drie beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de J. Calsstraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof
  Het zwerfafval is aangetroffen op de grens van de locatie / woonwijk. Het kan middels een reguliere onderhoudsronde worden verholpen.
- Water-drijfvuil in water
  De sloot is recent gekorfd/uitgemaaid hierdoor is het drijfvuil zichtbaar geworden. Doordat het in het water ligt is het moeilijker te verwijderen. Lange knijper of schepnet is vereist.
- Water-technische staat lichte beschoeiing
  De beschoeiing is haast niet zichtbaar en is deels vergaan. Dit vraagt om groot onderhoud.

Zie foto's:




Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de J. Calsstraat.

- Bewoner geeft aan dat het gras aan de achterzijde van de locatie pas gemaaid wordt na meermaals melden bij stadswerken.
  Controleren of de maaifrequentie bij stadswerken goed staat. Deze frequentie met bewoners delen.
- Het wijktoegangspad oogt rommelig en onverzorgd. Dit komt door woekerende bramen.
  Advies is om dit stuk(je) om te vormen tot grasveld en vervolgens intensief te maaien.

Zie foto's:





Memo

Johan Broedeletstraat

De locatie oogt sober. In de goten is relatief veel onkruid aanwezig.
De meetresultaten van locatie: Johan Broedeletstraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Johan Broedeletstraat op een B-niveau. 94% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 36 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	D
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	B
Meubilair-afvalbak-scheefstand	A
Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-bord-bevuiling	B
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	B
Meubilair-bord-deuken en gaten	B
Meubilair-bord-kleurechtheid	A
Meubilair-bord-verdraaiing	A
Meubilair-bord-volledig	A+
Meubilair-drager-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-drager-bevuiling	A
Meubilair-drager-deuken en gaten	A+
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	B
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	A
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	A
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A

Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-onkruid rondom obstakels	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	A
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	A

Voorgaande tabel laat zien dat twee beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Johan Broedeletstraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil
  Bewoners aanspreken op gedrag. Grasstrook wordt gebruikt als opslagplaats en dump. Zo nodig handhaving intensiveren
- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
  Onkruid is voornamelijk aanwezig in goten en randstroken. Het incident is middels een reguliere onkruidronde te verhelpen

Zie foto's:





Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Johan Broedeletstraat.

- Kolk verstopt.
  Bewoners geven aan dat de kolken op de locatie verstopt zitten. Advies is om deze te laten reinigen om wateroverlast te voorkomen.
- Bramenstruik op grasveld.
  Het advies is om de bramenstruik te verwijderen en het grasveld (deels) opnieuw in te zaaien. Vervolgens het gras intensief te maaien.

Zie foto's:






Lakenhalstraat

De locatie oogt verzorg en is onderdeel van de woonwijk.
De meetresultaten van locatie: Lakenhalstraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Lakenhalstraat op een B-niveau. 91% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 11 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-grofvuil	A+
Groen-beplanting-heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak	B
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	A
Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld	B
Groen-beplanting-onkruid	A
Groen-beplanting-uitwerpselen	B
Groen-beplanting-zwerfafval grof	B
Groen-boom-beschadiging	B
Groen-boom-waterlot	B
Riolering-putafdekking-oneffenheid	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	B

Voorgaande tabel laat zien dat één beeldmeetlat onder ambitie scoort op de Lakenhalstraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlat, (achter de beeldmeetlat is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Riolering-putafdekking-oneffenheid
  De oneffenheid levert geen gevaarlijke situatie op.

Zie foto's:



Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Lakenhalstraat.

- Veel molshopen aanwezig
  Op de aangrenzende grasveldjes zijn veel molshopen aanwezig. Eventueel mollen bestrijden.
- Oever oogt verzorgd.
  In tegenstelling tot andere locaties oogt de oever hier verzorgt. De knotwilg mag dit jaar en anders komend jaar geknot worden.

Zie foto's:






Memo

Ma Braunpad 1

De locatie oogt rommelig en onverzorgd.
De meetresultaten van locatie: Ma Braunpad 1 vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Ma Braunpad 1 op een C-niveau. 83% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 40 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras	B
Groen-beplanting-uitwerpselen	A
Groen-beplanting-zwerfafval grof	C
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	B
Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	B
Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	B
Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A
Meubilair-bord-bevuiling	A
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	A
Meubilair-bord-deuken en gaten	A
Meubilair-bord-kleurechtheid	B
Meubilair-bord-verdraaiing	B
Meubilair-bord-volledig	A
Meubilair-drager-beplakking en graffiti	A
Meubilair-drager-bevuiling	A
Meubilair-drager-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	C
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	D
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	B
Riolering-kolk-beschadiging	A

Riolering-kolk-oneffenheid	D
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	D
Verharding-natuurlijk afval op verharding	B
Verharding-onkruid rondom obstakels	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	B
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	C
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	B

Voorgaande tabel laat zien dat zeven beeldmeetlatten onder ambitie scoren op het Ma Braunpad 1. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-zwerfafval grof
  Reguliere zwerfvuilronde uitvoeren.
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Riolering-kolk-oneffenheid
  De kolken sluiten niet aan op de omliggende verharding. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie.
- Verharding-grofvuil
  Bewoners aanspreken op gedrag. Grasstrook wordt gebruikt als opslagplaats en dump
- Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7
  De verharding is oneffen en voldoet niet meer aan het gewenste beeld. Om het incident te verhelpen zal er herstraat moeten worden. Het advies is om dan gelijk de oneffenheid van de kolken te herstellen. Hier zal budget voor gereserveerd moeten worden.
- Verharding-veegvuil op verharding
  Advies veegwagen langs sturen.

Zie foto's:









Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van het Ma Braunpad 1.

- Grofvuil op verharding.
  Er is veel grofvuil aanwezig. Advies is om de bewoners aan te spreken en/of handhaving in te schakelen. Momenteel voor aannemer niet mogelijk om te reinigen.
- Natuurlijk afval op verharding.
  Plaatselijk is er veel bladafval aanwezig. Dit is mede door het grofvuil lastig te verwijderen voor stadwerken/ de aannemer.
- Stoep/voetpad bevat veel oneffenheden
  Het voetpad bevat veel oneffenheden dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het advies is om de ergste oneffenheden direct te verhelpen.
- Voetpad wordt overgroeid
  Advies is om de bewoner/eigenaar aan te spreken.

Zie foto's:






Memo

Ma Braunpad 2

De locatie oogt onverzorgd en rommelig

De meetresultaten van locatie: Ma Braunpad 2 vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Ma Braunpad 2 op een D-niveau. 64% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 25 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	D
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	C
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	D
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	D
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	B
Riolering-kolk-belemmering inlaat	B
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	B
Riolering-putafdekking-oneffenheid	D
Verharding-grofvuil	D
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-onkruid rondom obstakels	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	B
Verharding-uitwerpselen	A
Verharding-veegvuil op verharding	C
Verharding-zwerfafval fijn	D
Verharding-zwerfafval grof	B

Voorgaande tabel laat zien dat negen beeldmeetlatten onder ambitie scoren op het Ma Braunpad 2. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging
  Het gras langs de oever is beschadigd door de slootwerkzaamheden. Het oogt rommelig en onverzorgd. Het advies is om het gras deels op nieuw in te zaaien.
- Groen-beplanting-zwerfafval grof
  Reguliere zwerfvuilronde uitvoeren.
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten
  De lantaarnpaal vervangen.
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Riolering-putafdekking-oneffenheid
  De putten sluiten niet aan op de omliggende verharding. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie.
- Verharding-grofvuil
  Bewoners aanspreken op gedrag. Openbare ruimte wordt gebruikt als opslagplaats en dump
- Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7
  De verharding is oneffen en voldoet niet meer aan het gewenste beeld. Om het incident te verhelpen zal er herstraat moeten worden. Het advies is om dan gelijk de oneffenheid van de kolken en putten te herstellen. Hier zal budget voor gereserveerd moeten worden.
- Verharding-veegvuil op verharding
  Advies veegwagen langs sturen.

Zie foto's:









Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van het Ma Braunpad 2.

- Particuliere camera bevestigd aan lantaarnpaal.
  Is dit wenselijk? Zo niet, laten verwijderen.
- Veel grofvuil aanwezig. Openbare ruimte wordt gebruikt als opslag/dumpplaats.
  Het advies is om de bewoners aan te spreken en/of handhaving in te schakelen.
- Verwaarloosde boot.
  Er ligt een verwaarloosde boot vlak bij de locatie. Het advies is om deze boot te verwijderen.

Zie foto's:



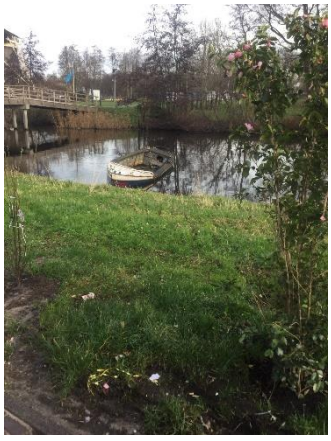


Memo

Markengouw

De meetresultaten van locatie: Markengouw vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Markengouw op een D-niveau. 66% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 29 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-grofvuil	A+
Groen-beplanting-haag-gaten in haag	A+
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen	D
Groen-beplanting-heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak	B
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	C
Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld	B
Groen-beplanting-onkruid	C
Groen-beplanting-uitwerpselen	A+
Groen-beplanting-zwerfafval grof	B
Groen-boom-beschadiging	B
Groen-boom-takvrije zone wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	A+
Groen-boom-waterlot	B
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	A
Riolering-putafdekking-oneffenheid	B
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden	D
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-zichtbare reparatie	D
Verharding-grofvuil	B
Verharding-natuurlijk afval op verharding	C
Verharding-onkruid rondom obstakels	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	C
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	C
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	B
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	B

Verharding-zwerfafval fijn	C
Verharding-zwerfafval grof	B

Voorgaande tabel laat zien dat tien beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Markengouw. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
  De haag staat op de grens tussen de standplaats en de woonwijk, er dient uitgezocht te worden wie verantwoordelijk is voor het beheer. Dit kan de bewoner of de aannemer zijn.
- Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras
  De technische staat van het plantvak is matig. Het advies is om geen snoeiwerkzaamheden meer uit te voeren maar om te hervormen/herinrichten.
- Groen-beplanting-onkruid
  Zie vorige beeldmeetlat.
- Riolering-kolk-belemmering inlaat
  De inlaat van meerdere kolken worden belemmerd door bladafval. Dit is voor de tijd van het jaar niet vreemd. Middels een reguliere veegronde is dit incident te verhelpen.
- Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden
  Het pad dat achter de locatie langs loopt bevalt veel oneffenheden door wortelopdruk. Dit is niet middels regulier onderhoud te verhelpen.
- Verharding-natuurlijk afval op verharding
  Er is relatief veel bladafval aanwezig op de verharding. Dit is voor de tijd van het jaar niet vreemd. Middels een reguliere veegronde is dit incident te verhelpen.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7
  De verharding is oneffen en voldoet niet meer aan het gewenste beeld. Om het incident te verhelpen zal er herstraat moeten worden.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
  Onkruid is voornamelijk aanwezig in goten en randstroken. Het incident is middels een reguliere onkruidronde te verhelpen

Zie foto's:









Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Markengouw.

- Hedera in bomen.
  Er is erg veel Hedera aanwezig in de bomen naast de parkeerstrook. Hierdoor vangen de bomen extra wind. Advies is om de bomen te laten controleren en eventueel de Hedera te verwijderen
- Openbare ruimte wordt gebruikt als opslagplaats.
  Bewoners aanspreken op gedrag. Eventueel handhaving intensiveren.
- Achterstallig onderhoud achterzijde locatie.
  De beplanting aan de achterzijde van de locatie vertoont veel achterstallig onderhoud. De beplanting dient teruggezet of omgevormd te worden om weer aan het beeld te voldoen.
- Onkruid op verharding.
  voornamelijk aanwezig op parkeerplaats waar trailers gestald staan. Advies is om eigenaar aan te spreken en/of handhaving in te schakelen. Momenteel voor aannemer lastig te reinigen.

Zie foto's:






Memo

Meerkerkdreef

De meetresultaten van locatie: Meerkerkdreef vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Meerkerkdreef op een D-niveau. 76% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 29 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-grofvuil	D
Groen-beplanting-haag-gaten in haag	A
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen	D
Groen-beplanting-onkruid	B
Groen-beplanting-uitwerpselen	A+
Groen-beplanting-zwerfafval grof	B
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	B
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	D
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	A
Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	C
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	B
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden	A
Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-zichtbare reparatie	A
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	D
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	B

Verharding-zwerfafval fijn	**B**
Verharding-zwerfafval grof	**B**

Voorgaande tabel laat zien dat zeven beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Meerkerkdreef. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-grofvuil
  Bewoners aanspreken op gedrag. Eventueel handhaving intensiveren.
- Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
  De haag staat op de grens tussen de standplaats en de woonwijk, er dient uitgezocht te worden wie verantwoordelijk is voor het beheer. Dit kan de bewoner of de aannemer zijn.
- Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak
  Bewoners geven aan dat het grasveld regelmatig gebruikt wordt als parkeergelegenheid voor de naast liggende scouting. Hierdoor zijn er meerdere kale plekken aanwezig. Het advies is om met de scouting in gesprek te gaan, om het parkeren te voorkomen.
- Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof
  Middels een reguliere onderhoudsronde is het incident te verhelpen
- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
  De elementenverharding is niet in goede staat. De voegwijdte is te breed en er ontbreken meerdere elementen. Hierdoor krijgt onkruid meer kans. Het advies is om de straat te herstraten.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen
- Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte

Zie foto's:








Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Meerkerkdreef.

- Houtachtige opslag aanwezig in het gras.
  Laten verwijderen en vervolgens intensief maaien.
- Water blijft staan.
  Bewoners geven aan dat er bij regenval veel water op het asfalt blijft staan. Dit komt doordat er geen kolk aanwezig is, wellicht is het mogelijk om op het grasveld een wadi aan te leggen.
- Hek naar naast gelegen terrein is vernield. Het terrein wordt gebruikt als speel-, dump- en opslagplek.
  Het advies is om het naast gelegen terrein te reinigen en vervolgens het hek te herstellen.

Zie foto's:






Memo

Nellie Bodenheimstraat

De indruk van de locatie is dat het er netjes uitziet. De openbare ruimte wordt gebruikt als opslag plaats.
De meetresultaten van locatie: Nellie Bodenheimstraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Nellie Bodenheimstraat op een D-niveau. 79% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 19 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	C
Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	B
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	A
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	A
Water-drijfvuil in water	C
Water-zinkvuil in water	D

Voorgaande tabel laat zien dat vier beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Nellie Bodenheimstraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-gras en kruidachtigen-beschadigingen
  Het gras langs de oever is beschadigd door de slootwerkzaamheden. Het oogt rommelig en onverzorgd. Het advies is om het gras deels op nieuw in te zaaien.
- Verharding-natuurlijk afval op verharding
  Er is veel natuurlijkafval aanwezig in de goten/parkeerstrook. Advies veegwagen langs sturen.
- Water-drijfvuil in water
  De sloot is recent gekorfd/uitgemaaid hierdoor is het drijfvuil zichtbaar geworden. Doordat het in het water ligt is het moeilijker te verwijderen. Lange knijper of schepnet is vereist.

Zie foto's:






Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Nellie Bodenheimstraat.

- Oever oogt rommelig en is sprake van onderhoudsachterstand.
  De groenstrook op de oever is lastig te onderhouden. Hier is nu sprake van achterstand. Advies is om desbetreffende stroken voor de verschillende locaties eenduidig op te lossen. Mogelijk uitgeven bij standplaats, mogelijk omvormen.
- Haag/bodebedekker.
  De haag is netjes geschoren, hij wordt echter wel groot. De aannemer vragen de haag bij de volgende snoeironde verder terug te zetten.

Zie foto's:






Memo

Noorderakerweg

De meetresultaten van locatie: Noorderakerweg vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Noorderakerweg op een D-niveau. 89% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 36 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-beschadiging	A
Groen-beplanting-bodembedekkers-kaal oppervlak	A
Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	D
Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld	B
Groen-beplanting-grofvuil	A+
Groen-beplanting-onkruid	B
Groen-beplanting-uitwerpselen	A+
Groen-beplanting-zwerfafval grof	B
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	B
Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A+
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	B
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	D
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	D
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	B
Verharding-onkruid rondom obstakels	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B

Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	B
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	B
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	B
Water-drijfvuil in water	B
Water-zinkvuil in water	A+

Voorgaande tabel laat zien dat vier beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Noorderakerweg. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras
  Het incident is middels een reguliere onderhoudsronde te verhelpen.
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Riolering-kolk-belemmering inlaat
  Kolk inlaten belemmerd door bladafval. Middels een reguliere veegronde is het incident te verhelpen.
- Riolering-kolk-oneffenheid
  De kolken sluiten niet meer aan op de omliggende opsluitbanden. Dit is niet middels regulier onderhoud te verhelpen. De opsluitbanden moeten opnieuw gezet worden.

Zie foto's:









Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Noorderakerweg.

- Water blijft staan.
  Bewoners geven aan dat er bij regenval veel water op het asfalt blijft staan. Dit komt doordat er geen kolk aanwezig is, wellicht is het mogelijk om op het grasveld een wadi aan te leggen.
- Zelf aangelegde speeltuin
  De bewoners hebben zelf speeltoestellen neergezet. De aangetroffen kwaliteit varieert en ze worden niet jaarlijks gekeurd op veiligheid. Wellicht kan de gemeente hier iets in betekenen in de toekomst. Het grasveldje waar de toestellen staan is erg ongelijk en er groeit veel mos.
- Achterstallig onderhoud beplanting
  Een plantvak is overwoekerd door bramen. Het advies is om dit plantvak om te vormen.

Zie foto's:






Memo

Osdorperweg

De meetresultaten van locatie: Osdorperweg vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Osdorperweg op een C-niveau. 87% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 23 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	C
Riolering-kolk-belemmering inlaat	A
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	A
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	D
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-onkruid rondom obstakels	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	B
Verharding-wortelopdruk	B
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	B

Voorgaande tabel laat zien dat drie beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Osdorperweg. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof
  Middels een reguliere onderhoudsronde is het incident te verhelpen
- Verharding-grofvuil
  Openbare ruimte wordt gebruikt als opslagplaats. Het advies is om de bewoners aanspreken op hun gedrag. Eventueel handhaving intensiveren
- Verharding-onkruid rondom obstakels
  Onkruid is alleen aanwezig rondom obstakels, middels een regulier onderhoudsronde is het incident te verhelpen.

Zie foto's:





Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Osdorperweg.

- Grond langs beschoeiing zakt weg.
  Bewoner geeft aan dat op zijn standplaats zijn straat wegzakt aan de kant van de beschoeiing. De grond achter de beschoeiing lijkt weg te zakken. Het advies is om te inventariseren of dit bij alle standplaatsen het geval is. Daarna kan er een plan van aanpak opgesteld worden.
- Zelf aangelegde speeltuin
  De bewoners hebben zelf speeltoestellen neergezet. De aangetroffen kwaliteit varieert en ze worden niet jaarlijks gekeurd op veiligheid. Wellicht kan de gemeente hier iets in betekenen in de toekomst. Het grasveldje waar de toestellen staan is erg ongelijk en er groeit veel mos.
- Oever oogt rommelig en is sprake van onderhoudsachterstand.
  De groenstrook op de oever is lastig te onderhouden. Hier is nu sprake van achterstand. Advies is om desbetreffende stroken voor de verschillende locaties eenduidig op te lossen. Mogelijk uitgeven bij standplaats, mogelijk omvormen

Zie foto's:






Memo

Ringvaartdijk

De indruk van de locatie is dat het er netjes uitziet. De openbare ruimte wordt gebruikt als opslag plaats.
De meetresultaten van locatie: Ringvaartdijk vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Ringvaartdijk op een C-niveau. 83% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 46 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-haag-gaten in haag	A
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen	A
Groen-beplanting-onkruid	A
Groen-beplanting-zwerfafval grof	B
Groen-boom-beschadiging	A
Groen-boom-waterlot	A+
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	A
Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	B
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A+
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	B
Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-bord-bevuiling	A
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	B
Meubilair-bord-deuken en gaten	A+
Meubilair-bord-kleurechtheid	A
Meubilair-bord-verdraaiing	A
Meubilair-bord-volledig	A+
Meubilair-drager-beplakking en graffiti	A
Meubilair-drager-bevuiling	A
Meubilair-drager-deuken en gaten	A+
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling	C
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-deuken en gaten	A
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-volledig	A

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	A
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	D
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-onkruid rondom obstakels	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	C
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	D
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	B
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	C
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	C


Voorgaande tabel laat zien dat acht beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Ringvaartdijk. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Riolering-kolk-belemmering inlaat
  Kolk inlaten belemmerd door bladafval. Combineren met verwijderen onkruid op verharding.
- Verharding-natuurlijk afval op verharding
  Er is veel natuurlijkafval aanwezig in de goten/parkeerstrook. Advies veegwagen langs sturen.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7
  Ernstige oneffenheden herstraten.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
  Voornamelijk aanwezig op plaatsen waar spullen gestald staan. Advies is om eigenaar aan te spreken en/of handhaving in te schakelen. Momenteel voor aannemer lastig te reinigen
- Verharding-veegvuil op verharding
  Combineren met verwijderen onkruid op verharding.
- Verharding-zwerfafval grof
  Combineren met verwijderen onkruid op verharding.

Memo

Zie foto’s:



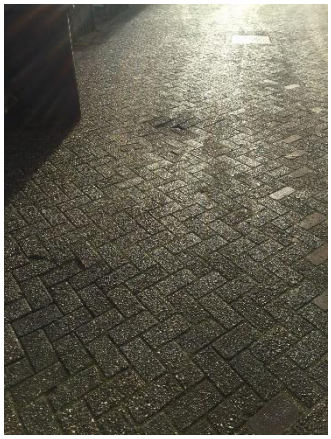

Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Ringvaartdijk.

- Openbare ruimte wordt gebruikt als opslag-, dumpplaats.
  Bewoners aanspreken op gedrag. Eventueel handhaving intensiveren.
- Zelf aangelegde speeltuin
  De bewoners hebben zelf speeltoestellen neergezet. De aangetroffen kwaliteit varieert en ze worden niet jaarlijks gekeurd op veiligheid. Wellicht kan de gemeente hier iets in betekenen in de toekomst.
- Overhangende tak
  Bewoner klaagt over overhangende tak. Advies is om met dit te bespreken met de boom beheerder.

Zie foto's:






Memo

Rollemanstraat

De indruk van de locatie is dat het er netjes uitziet. De openbare ruimte wordt gebruikt als opslag plaats.
De meetresultaten van locatie: Rollemanstraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Rollemanstraat op een D-niveau. 83% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 48 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-beplanting-grofvuil	D
Groen-beplanting-uitwerpselen	A
Groen-beplanting-zwerfafval grof	C
Groen-boom-beschadiging	A
Groen-boom-boomspiegel-onkruid	D
Groen-boom-boomspiegel-uitwerpselen	A
Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	A
Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	A
Groen-boom-takvrije zone wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	A+
Groen-boom-waterlot	D
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	A
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	A
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A+
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	B
Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-bord-bevuiling	A
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	A
Meubilair-bord-deuken en gaten	A
Meubilair-bord-kleurechtheid	B
Meubilair-bord-verdraaiing	A
Meubilair-bord-volledig	A+
Meubilair-drager-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-drager-bevuiling	A
Meubilair-drager-deuken en gaten	A
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-beplakking en graffiti	A+

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling	C
Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-volledig	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	C
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	B
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	B
Riolering-putafdekking-oneffenheid	B
Verharding-grofvuil	D
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-onkruid rondom obstakels	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	B
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	B
Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	B

Voorgaande tabel laat zien dat acht beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Rollemanstraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-beplanting-zwerfafval grof
  Reguliere zwerfvuilronde uitvoeren.
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen.
- Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling.
  Reinigen en evt. coating aanbrengen.
- Groen-beplanting-grofvuil.
  Bewoners aanspreken op gedrag. Plantvak wordt gebruikt als opslagplaats en dump.
- Verharding-grofvuil.
  Bewoners aanspreken op gedrag. Openbare ruimte wordt gebruikt als opslagplaats en dump.
- Riolering-kolk belemmering inlaat.
  Advies veegwagen langs sturen.
- Groen-boom-boomspiegel-onkruid
  Incident is middels een reguliere onderhoudsronde te verhelpen.
- Groen-boom-waterlot.
  Combineren met het onkruidvrij maken van de boomspiegel.

Memo

Zie foto’s:








Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Rollemanstraat.

- Uitmaaien houtwal.
  De houtwal aan de zijde van de doorgaande weg oogt erg rommelig. Het advies is om deze wal met de bosmaaier uit te maaien. Daarnaast dient het zwerfvuil verwijderd te worden.
- Staat drempel.
  De drempel is in zeer slechte staat. Het betonijzer is reeds zichtbaar. De drempel dient om korte termijn vervangen te worden.
- Openbare ruimte wordt gebruikt als opslag-, dumpplaats.
  Bewoners aanspreken op gedrag. Eventueel handhaving intensiveren.

Zie foto's:






Memo

Ruys de Beerenbrouckstraat

De meetresultaten van locatie: Ruys de Beerenbrouckstraat vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Ruys de Beerenbrouckstraat op een C-niveau. 79% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 29 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Meubilair-bord-beplakking en graffiti	A+
Meubilair-bord-bevuiling	C
Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	A
Meubilair-bord-deuken en gaten	A
Meubilair-bord-kleurechtheid	A
Meubilair-bord-verdraaiing	A
Meubilair-bord-volledig	A+
Meubilair-drager-beplakking en graffiti	A
Meubilair-drager-bevuiling	A
Meubilair-drager-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	C
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	C
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	A
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	A+
Verharding-natuurlijk afval op verharding	A
Verharding-onkruid rondom obstakels	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	B
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	C
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	C

Verharding-zwerfafval fijn	B
Verharding-zwerfafval grof	A

Voorgaande tabel laat zien dat zes beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Ruys de Beerenbrouckstraat. Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Meubilair-bord-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti
  Reinigen en evt. coating aanbrengen
- Riolering-kolk-belemmering inlaat
  Kolk inlaten belemmerd door bladafval. Combineren met verwijderen veegvuil op verharding
- Verharding-veegvuil op verharding
  Advies veegwagen langs sturen

Zie foto's:









Memo

Willem 5.1, 2, e

De meetresultaten van locatie: Willem 5.1, 2, e vindt u in enkele grafieken en tabellen met toelichting. Het uitgangspunt is de CROW norm waarbij 90% van het areaal aan de gestelde kwaliteit moet voldoen. De gestelde kwaliteit is ambitieniveau B. De resultaten zijn een momentopname waarbij weers-, seizoensinvloeden en tijdstippen invloed kunnen hebben op de behaalde scores. Conform de besteksystematiek is per locatie de slechtste plek beoordeeld, hierdoor kan één enkel incident de score beïnvloeden.

Eindtotaal



Gemeten over alle beheercategorieën en alle beeldmeetlatten ligt de kwaliteit van de openbare ruimte van locatie: Willem 5.1, 2, e op een C-niveau. 76% van de metingen voldoet aan, of scoort boven, de gestelde ambitie B. In totaal konden er 29 beeldmeetlatten worden beoordeeld (dit is het getal tussen haakjes in de grafiek hierboven).

Totaal resultaten per beeldmeetlat

Groen-boom-beschadiging	A
Groen-boom-staat boompalen en -banden	A
Groen-boom-takvrije zone wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	A+
Groen-boom-waterlot	A
Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging	A
Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil	A+
Groen-gras en kruidachtigen-kaal oppervlak	B
Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	C
Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen	A
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti	A
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	B
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	A
Riolering-kolk-belemmering inlaat	D
Riolering-kolk-beschadiging	A
Riolering-kolk-oneffenheid	C
Riolering-putafdekking-oneffenheid	A
Verharding-grofvuil	D
Verharding-natuurlijk afval op verharding	C
Verharding-onkruid rondom obstakels	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7	C
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	A
Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	A
Verharding-uitwerpselen	A+
Verharding-veegvuil op verharding	A
Verharding-wortelopdruk	A


Verharding-zwerfafval fijn	**B**
Verharding-zwerfafval grof	**C**


Voorgaande tabel laat zien dat zeven beeldmeetlatten onder ambitie scoren op de Willem 5.1, 2, e Het gaat om de volgende beeldmeetlatten, (achter de beeldmeetlatten is beschreven hoe het incident opgelost kan worden):

- Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval
  Combineren met natuurlijkafval verwijderen van de bestrating.
- Riolering-kolk belemmering inlaat
  Combineren met natuurlijkafval verwijderen.
- Riolering-kolk-oneffenheid
  Een aantal kolken ligt niet gelijk met de omliggende bestrating. Het levert geen direct gevaarlijke situaties op. Het water kan goed wegstromen.
- Verharding-grofvuil
  Het advies is om de bewoners aan te spreken en eventueel de handhaving te intensiveren.
- Verharding-natuurlijk afval op verharding
  Het incident is middels een reguliere onderhoudsronde te verhelpen. Het bladafval ligt centraal in windhoeken.
- Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden wegtype 3-7
  Het betreft één enkel incident. Het advies is om het op korte termijn te herstellen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Verharding-zwerfafval grof
  Combineren met natuurlijkafval verwijderen.

Zie foto's:



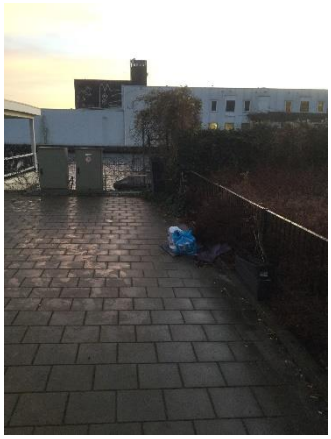

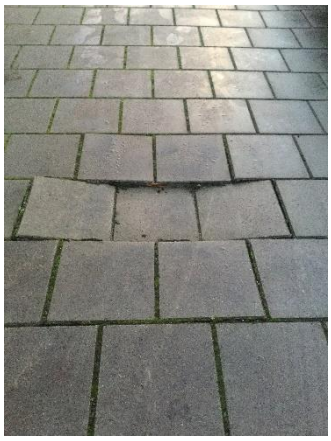Memo

Opmerkelijkheden / meldingen

Tijdens de meting zijn onze collega's de oren en ogen op de woonwagenlocatie. Alles wat opvalt los van de beeldmeetlatten koppelen zij terug via de functie 'meldingen' in het Apptimize Platform.
Hieronder volgen de meldingen van de Willem5.1, 2, e

- Beplanting uit gemeente plantsoen groeit door de afrastering van de locatie.
  Middels een reguliere snoeibeurt is het incident te verhelpen.
- Slot nutskast beschadigd.
  Leverancier inlichten.

Zie foto's:



