
#	Activiteit	Remaining Duration	Start	Gereed
1	**BR O Weteringschans West incl museumbrug**			
2	**Participatie**			
3	Buurtbijeenkomst toelichting uitvoering	0d		03-11-2021
4	**Uitvoeren onderzoeken**			
5	Uitvoeren Flora en fauna onderoek	86d	28-04-2020	10-05-2021
6	Verkeersonderzoeken Spiegelgracht (effectenvermindering tijdens uitvoer	116d	04-01-2021	23-06-2021
7	Mileuonderzoek	43d	26-03-2021	02-06-2021
8	PM Onderzoek naar J.Duizendknoop uiterlijk	65d	03-06-2021	01-09-2021
9	Aanvraag ontheffing F&F(optioneel)	65d	01-09-2021	01-12-2021
10	**Opstellen inkoopstrategie**			
11	Besluitvorming over gewijzigde aanbestedingsprocedure/waternet	6d	16-11-2020	12-01-2021
12	**Definitief Ontwerp**			
13	DO gereed	0d		05-01-2021
14	CVC vergadering ontwerp	0d		29-01-2021*
15	**BLVC Plan**			
16	Opstellen BLVC plan, incl GVB werkzaamheden, en werk waternet	29d	30-03-2020	12-02-2021
17	WIOR vooroverleg	5d	15-02-2021	19-02-2021
18	Aanleveren in WWU overleg	12d	22-02-2021	09-03-2021
19	WWU oveleg en plaatsen in CORA(woensdag)	0d		09-03-2021*
20	Formeel overleg met M&T TBGN	0d		08-06-2021
21	Aanleveren in WWU overleg specifiek omleidingsroetes	12d	16-07-2021	03-08-2021
22	WWU oveleg specifiek omleidingsroetes	0d		03-08-2021
23	**Wenstrace K&L**			
24	Voorbereidingstijd K&L bedrijven (8maanden)	124d	12-11-2020	05-07-2021
25	Opstellen detailplanning k&l (6 weken voor uitvoering)	20d	22-09-2021	19-10-2021
26	**Verkeersbesluit**			
27	Aanvraag Definief verkeersbesluit (Ná UB)	65d	24-02-2021	02-06-2021
28	Aanvraag Tijdelijk verkeersbesluit	65d	01-09-2021	01-12-2021
29	**Kapvergunning**			
30	Aanvraag kapvergunning	40d	24-02-2021	22-04-2021
31	Aanschrijving eigenaren 2 bomen (opkronen)	20d	24-02-2021	23-03-2021
32	Periode uitvoering opkronen 2 bomen (broedseizoen)	40d	24-03-2021*	26-05-2021
33	Publicatie	0d		22-04-2021
34	AWB termijn	30d	23-04-2021	09-06-2021
35	Eerste moment in werking treden bij geen bezwaar (Broedseizoen!)	0d		09-06-2021
36	Proceduretijd bij bezwaar(incl. bezwaarcie)	40d	10-06-2021	04-08-2021
37	Publicatie na bezwaar	0d		04-08-2021
38	AWB termijn na bezwaar	30d	05-08-2021	15-09-2021
39	2e moment in werking treden na bezwaar	0d		15-09-2021
40	**WLS protokollen**			
41	WLS aanvragen	40d	10-03-2021	10-05-2021
42	Aanmelding WLS	0d	10-03-2021	
43	Procedure WLS vergunning	65d	11-05-2021	11-08-2021
44	Reservering TBGN (opgenomen in BLVC plan week 44 2021)	5d	01-11-2021*	05-11-2021
45	Reservering TBGN uiterlijk vóór 1mrt gereed	5d	23-02-2022	01-03-2022*
46	TBGN Kinkerstraat	23d	02-03-2022*	01-04-2022
47	TBGN OL # dgn ntb	18d	04-04-2022*	02-05-2022
48	**Besluitvorming uitvoeringsbesluit**			
49	Centrale stad besluitvorming	43d	04-12-2020	04-03-2021
50	AanleverenStaf WH	0d	21-01-2021*	
51	staf WH	0d		25-01-2021*
52	Aanleveren B&W (di voor 10 uur)	0d	03-02-2021*	
53	Behandeling in B&W	0d		23-02-2021*
54	CIE tk	0d		04-03-2021*
55	**Bestek**			
56	Opdrachtverlening aan GVB	0d		23-02-2021
57	OpstellenBestek/ contractstukken	65d	24-02-2021	02-06-2021
58	Opstellen spoorontwerp	65d	24-02-2021	02-06-2021
59	Bestellen Spoor	250d	24-02-2021	16-02-2022
60	Toetsing bestek	10d	03-06-2021	16-06-2021
61	Verwerken opmerkingen / definitief maken Bestek	5d	17-06-2021	23-06-2021
62	Bestek/ contractstukken definitief	0d		23-06-2021
63	**Aanbesteding en Gunning**			
64	Contractstukken definitief	0d		23-06-2021
65	Publikatie	0d		30-06-2021
66	Start aanbesteding(nationaal openbaar)	0d	01-07-2021	
67	Procedure aanbesteding	43d	01-07-2021	30-08-2021
68	Inlichtingen	1d	08-07-2021	08-07-2021
69	Opstellen NvI	5d	09-07-2021	15-07-2021
70	Toets	5d	16-07-2021	22-07-2021
71	Publikatie NvI (kld)	3d	23-07-2021	25-07-2021
72	Mogelijk tenderreces zomer 21	25d	26-07-2021*	27-08-2021
73	Inschrijving	1d	30-08-2021	30-08-2021
74	Procedure gunning	37d	30-08-2021	19-10-2021
75	Beoordeling en basis toets	10d	31-08-2021	13-09-2021
76	Opstellen gunningsadvies	5d	14-09-2021	20-09-2021
77	Kapvergunning uiterlijk verleend	0d		15-09-2021
78	Toets LB	2d	21-09-2021	22-09-2021
79	Afhandeling/ondertekening OG	5d	23-09-2021	29-09-2021
80	publikatie op TN	0d		29-09-2021
81	Bezwaartermijn(Alcatel)	20d	30-09-2021	19-10-2021
82	Schriftelijke opdracht verleend	0d		19-10-2021
83	Mogelijk tenderreces kerst 21	6d	27-12-2021*	03-01-2022
84	**Vergunningen ON**			
85	WIOR aanvragen	30d	20-10-2021	30-11-2021
86	Reservering TBGN (opgenomen in BLVC plan week 44 2021)	5d	01-11-2021*	05-11-2021
87	Reservering TBGN uiterlijk vóór 1mrt gereed	5d	23-02-2022	01-03-2022*
88	[redacted]			
[redacted]	[redacted]			
90	**Uitvoering**			
91	Voorbereiding aannemer (minimaal 6 weken)	30d	20-10-2021	30-11-2021
92	GSU	0d	01-12-2021	
93	Uitvoering (mogelijk gefaseerd)	194d	01-12-2021	06-09-2022
94	Combinatie met spoorwerk indien nodig	194d	01-12-2021	06-09-2022

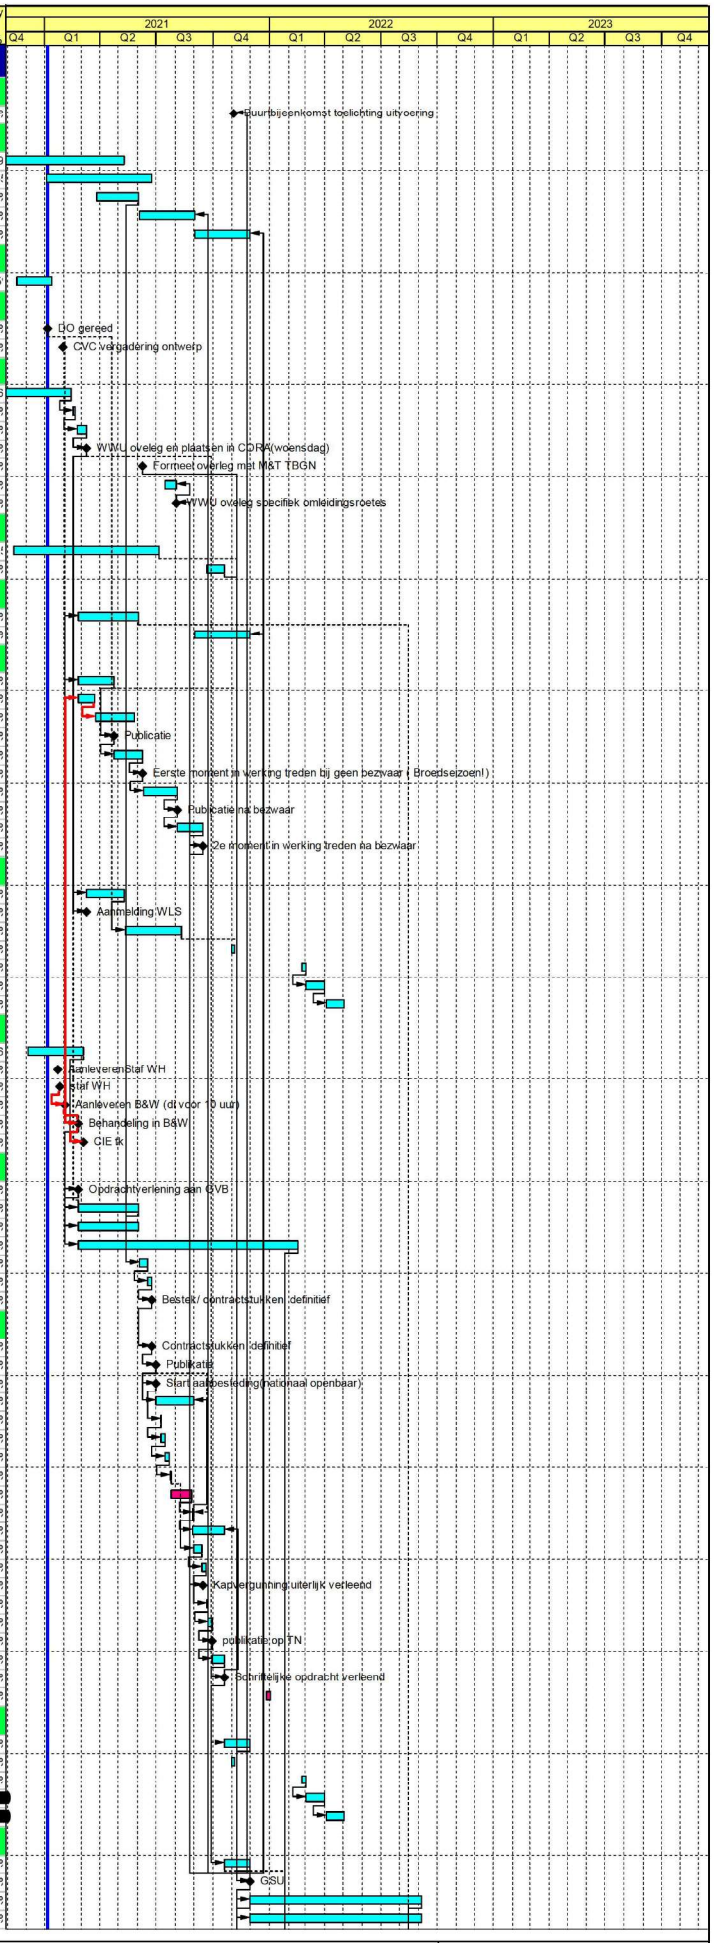

Krietiek
Omgevingsproject
Mijlpaal
Werk met Werk
Tenderreces

Pagina 1 van 2


Versie 0.1

Peildatum: 05-01-2021 /
Afdrukdatum: 27-01-2021

BINNENRING

BR G: Weteringschans West incl museumbrug

#	Activiteit	Remaining Duration	Start	Gereed
95	MVP Bogen Weteringsschans--kleine Garmanplantsoen werk met werk	194d	01-12-2021	06-09-2022
96	MVP Halte Spiegelgracht samen met project werk met werk	194d	01-12-2021	06-09-2022
97	Weteringcirquit zuidzijd, boogjes Vijzelgracht werk met werk(ntb BLVC iter	194d	01-12-2021	06-09-2022
98	Opstellen werkplan tbv WLS vergunning door Waternet	65d	17-02-2022	24-05-2022
99	GEU	0d		06-09-2022
100	**Overdracht**			
101	Uitvoeren Inspectie	10d	06-09-2022	20-09-2022
102	Garantietermijn	129d	06-09-2022	07-03-2023
103	Oplevering aan beheer via overdrachtformulier	10d	20-09-2022	04-10-2022
104	Overdacht	0d		04-10-2022
105	**Afhandeling**			
106	Definitieve toekenning middelen VRA na aanleiding van procesverbaal en	129d	06-09-2022	07-03-2023
107	Vtw en claims afhandeling	20d	07-03-2023	04-04-2023
108	Afsluiten financiën	20d	04-04-2023	09-05-2023
109	Volledig financiele afhandeling	0d		09-05-2023
110	Einde project	0d		09-05-2023
111	**Omgevingsprojecten**			
112	[redacted]			

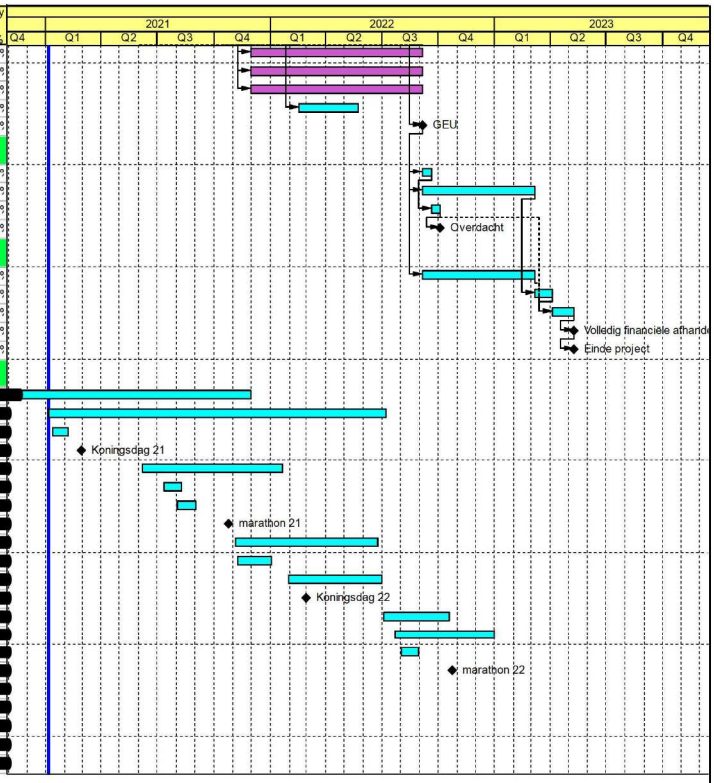

Krietiek
Omgevingsproject
Mijlpaal
Werk met Werk
Tenderreces

Versie 0.1
Peildatum: 05-01-2021 /
Afdrukdatum: 27-01-2021

BINNENRING
BR G: Weteringschans West incl museumbrug
