Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR154949
Project: Amsterdam, Herengracht brug 20 en 21
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

[redacted]

Bout nummer	Nulmeting (0)	Datum 0-meting	HH meting 21(21) 25-3-2019	verschil (21-0) in mm	verschil (21-20) in mm	HH meting 22(22) 25-4-2019	verschil (22-0) in mm	verschil (22-21) in mm	HH meting 23(23) 28-5-2019	verschil (23-0) in mm	verschil (23-22) in mm	HH meting 24(24) 8-8-2019	verschil (24-0) in mm	verschil (24-23) in mm
1013	2,0360	8-1-2016	2,0348	-1,2	0,5	2,0340	-2,0	-0,8	2,0358	-0,2	1,8	2,0341	-1,9	-1,7
2169	1,5047	6-10-2016	1,5033	-1,4	0,2	1,5029	-1,8	-0,4	1,5043	-0,4	1,4	1,5024	-2,3	-1,9
2173A	3,3378	10-5-2016	3,3334	-4,4	-0,1	3,3323	-5,5	-1,1	3,3329	-4,9	0,6	3,3316	-6,2	-1,3
2173B	3,7399	10-5-2016	3,7339	-6,0		3,7320	-7,9	-1,9	3,7341	-5,8	2,1	3,7309	-9,0	-3,2
2173C	1,1035	6-10-2016	1,0961	-7,4	0,1	1,0956	-7,9	-0,5	1,0984	-5,1	2,8	1,0958	-7,7	-2,6
2177A	2,9063	6-10-2016	2,9015	-4,8	0,5	2,9000	-6,3	-1,5	2,8990	-7,3	-1,0	2,8999	-6,4	0,9
2177B	3,2563	6-10-2016	3,2563	0,0		3,2551	-1,2	-1,2	3,2542	-2,1	-0,9	3,2551	-1,2	0,9
2177C	2,0734	6-10-2016	2,0714	-2,0		ntm						2,0703	-3,1	
2179A	1,3916	6-11-2018	1,3909	-0,7	0,3	1,3907	-0,9	-0,2	1,3926	1,0	1,9	1,3912	-0,4	-1,4
2179B	1,3995	6-11-2018	1,4010	1,5	-0,3	1,4013	1,8	0,3	1,4018	2,3	0,5	1,4015	2,0	-0,3
G9110	0,6471	29-11-2018	verdwenen			verdwenen						verdwenen		
2179C	1,4127	6-11-2018	1,4127	0,0	1,1	1,4123	-0,4	-0,4	1,4149	2,2	2,6	1,4125	-0,2	-2,4
2181A	1,4839	6-11-2018	1,4832	-0,7	0,2	1,4827	-1,2	-0,5	1,4829	-1,0	0,2	1,4833	-0,6	0,4
2181B	1,4817	6-11-2018	1,4814	-0,3	-0,6	1,4814	-0,3	0,0	1,4818	0,1	0,4	1,4819	0,2	0,1
2181C	1,4849	6-11-2018	1,4826	-2,3	-0,4	1,4822	-2,7	-0,4	1,4829	-2,0	0,7	1,4837	-1,2	0,8
2160A	3,0930	6-11-2018	3,0922	-0,8	0,4	3,0919	-1,1	-0,3	3,0884	-4,6	-3,5	3,0928	-0,2	4,4
2160B	3,0516	6-11-2018	3,0508	-0,8	0,9	3,0508	-0,8	0,0	3,0545	2,9	3,7	3,0513	-0,3	-3,2
2160C	2,1997	6-11-2018	2,1994	-0,3	0,0	2,1993	-0,4	-0,1	2,2019	2,2	2,6	2,1998	0,1	-2,1
2158A	2,8671	6-10-2016	2,8656	-1,5	0,6	2,8658	-1,3	0,2	2,8676	0,5	1,8	2,8663	-0,8	-1,3
2158B	2,8907	6-10-2016	2,8906	-0,1	1,0	2,8903	-0,4	-0,3	2,8917	1,0	1,4	2,8905	-0,2	-1,2
2156A	1,4844	8-1-2016	1,4828	-1,6	2,3	1,4827	-1,7	-0,1	1,4836	-0,8	0,9	1,4836	-0,8	0,0
2156B	3,8821	8-1-2016	3,8802	-1,9	0,4	3,8797	-2,4	-0,5	3,8794	-2,7	-0,3	3,8795	-2,6	0,1
2154A	2,4886	8-1-2016	2,4842	-4,4	-2,4	2,4865	-2,1	2,3	2,4842	-4,4	-2,3	2,4865	-2,1	2,3
2154B	2,5607	8-1-2016	2,5550	-5,7	1,0	2,5548	-5,9	-0,2	2,5550	-5,7	0,2	2,5545	-6,2	-0,5
2152A	3,7743	8-1-2016	3,7693	-5,0	0,5	3,7695	-4,8	0,2	3,7695	-4,8	0,0	3,7681	-6,2	-1,4
2152B	3,7508	8-1-2016	3,7430	-7,8	-0,4	3,7434	-7,4	0,4	3,7435	-7,3	0,1	3,7429	-7,9	-0,6
2150A	3,6653	8-1-2016	3,6584	-6,9	-0,1	3,6581	-7,2	-0,3	3,6581	-7,2	0,0	3,6577	-7,6	-0,4
2150B	2,8444	8-1-2016	2,8349	-9,5		2,835	-9,4	0,1				2,8349	-9,5	
2150C	3,6411	8-1-2016	3,6353	-5,8	-0,1	3,6357	-5,4	0,4	3,6362	-4,9	0,5	3,635	-6,1	-1,2
2150D	2,1989	8-1-2016	2,1908	-8,1	-0,4	2,1938	-5,1	3,0	2,1917	-7,2	-2,1	2,1930	-5,9	1,3
2150E	1,8307	8-1-2016	1,8164	-14,3	0,4	ntm			ntm			1,8187	-12,0	
2150F	1,8572	8-1-2016	1,8508	-6,4	1,7	1,8503	-6,9	-0,5	1,8512	-6,0	0,9	1,8507	-6,5	-0,5
3001A	2,0034	8-1-2016	1,9976	-5,8		2,0065	3,1	8,9	2,0065	3,1	0,0	ntm		
3001B	2,9161	8-1-2016	ntm			2,9153	-0,8		2,9153	-0,8	0,0	2,9150	-1,1	-0,3
3007A	1,0730	6-11-2018	1,0726	-0,4	0,4	1,0725	-0,5	-0,1	1,0751	2,1	2,6	1,0739	0,9	-1,2
3007B	2,2796	6-11-2018	ntm						2,2822	2,6		2,2809	1,3	-1,3
3011A	2,9660	6-11-2018	2,9648	-1,2	0,2	2,9654	-0,6	0,6	2,9642	-1,8	-1,2	2,9655	-0,5	1,3
3011B	3,1255	6-11-2018	ntm			3,1221	-3,4		3,1229	-2,6	0,8	3,1236	-1,9	0,7
3013A	2,3417	6-11-2018	2,3413	-0,4		2,3417	0,0	0,4	2,3402	-1,5	-1,5	2,3419	0,2	1,7

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR154949
Project: Amsterdam, Herengracht brug 20 en 21
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

[redacted]

Bout nummer	Nulmeting (0)	Datum 0-meting	HH meting 21(21) 25-3-2019	verschil (21-0) in mm	verschil (21-20) in mm	HH meting 22(22) 25-4-2019	verschil (22-0) in mm	verschil (22-21) in mm	HH meting 23(23) 28-5-2019	verschil (23-0) in mm	verschil (23-22) in mm	HH meting 24(24) 8-8-2019	verschil (24-0) in mm	verschil (24-23) in mm
3013B	2,2785	6-11-2018	2,2777	-0,8	0,9	2,2780	-0,5	0,3	2,2760	-2,5	-2,0	2,2783	-0,2	2,3
3015A	3,2948	6-11-2018	3,2936	-1,2	-0,1	3,2939	-0,9	0,3	3,2916	-3,2	-2,3	3,2940	-0,8	2,4
3015B	3,2274	6-11-2018	3,2263	-1,1	-1,4	3,2268	-0,6	0,5	3,2262	-1,2	-0,6	3,2272	-0,2	1,0
3015C	2,4251	6-11-2018	2,4240	-1,1	0,5	2,4245	-0,6	0,5	2,4217	-3,4	-2,8	2,4245	-0,6	2,8
3019A	2,4207	6-11-2018	2,4194	-1,3	-0,6	2,4215	0,8	2,1	2,4239	3,2	2,4	2,4206	-0,1	-3,3
3019B	2,4576	6-11-2018	2,4559	-1,7	-0,8	2,4566	-1,0	0,7	2,4576	0,0	1,0	2,4566	-1,0	-1,0
3021A	3,4286	6-11-2018	3,4270	-1,6		3,4268	-1,8	-0,2	3,4278	-0,8	1,0	3,4271	-1,5	-0,7
3021B	3,2762	6-11-2018	3,2742	-2,0	-0,3	3,2755	-0,7	1,3	3,2754	-0,8	-0,1	3,2750	-1,2	-0,4
3019C	2,1387	6-11-2018	ntm			ntm						2,1366	-2,1	
3023A	2,8285	6-11-2018	2,8269	-1,6	0,2	2,8284	-0,1	1,5	2,8285	0,0	0,1	2,8274	-1,1	-1,1
3023C	1,8216	6-11-2018	1,8205	-1,1	1,0	ntm			1,8228	1,2		1,8217	0,1	-1,1
3023B	2,7682	6-11-2018	2,7671	-1,1	0,3	2,7686	0,4	1,5	2,7690	0,8	0,4	2,7680	-0,2	-1,0
3027A	2,5300	6-11-2018	2,5289	-1,1	0,3	2,5296	-0,4	0,7	2,5316	1,6	2,0	2,5292	-0,8	-2,4
3027B	1,6620	6-11-2018	1,6615	-0,5	0,6	1,6623	0,3	0,8	1,6643	2,3	2,0	1,6626	0,6	-1,7
3027C	2,4861	6-11-2018	2,4848	-1,3	0,2	2,4873	1,2	2,5	2,4875	1,4	0,2	2,4854	-0,7	-2,1
4159A	2,1300	6-11-2018	2,1289	-1,1	0,8	2,1297	-0,3	0,8	2,1319	1,9	2,2	2,1296	-0,4	-2,3
4159B	2,1363	6-11-2018	2,1352	-1,1	-0,2	2,1361	-0,2	0,9	2,1384	2,1	2,3	2,1357	-0,6	-2,7
4159C	2,1250	6-11-2018	2,1240	-1,0	0,6	2,1248	-0,2	0,8	2,1265	1,5	1,7	2,1248	-0,2	-1,7
G4157	0,3228	29-11-2018	verdwenen			verdwenen			verdwenen			verdwenen		
													0,0	0,0
G3010	1,2735	29-11-2018	1,2689	-4,6		1,2691	-4,4	0,2	ntm			1,2691	-4,4	
3018B	1,4890	6-11-2018	1,4885	-0,5	0,6	ntm			1,4901	1,1		1,4894	0,4	-0,7
3020A	0,8465	6-11-2018	0,8453	-1,2		0,8449	-1,6	-0,4	ntm bloembak			0,8473	0,8	
3020B	2,2835	6-11-2018	2,2829	-0,6	1,0	2,2827	-0,8	-0,2	2,2858	2,3	3,1	2,2835	0,0	-2,3
3020C	2,1035	6-11-2018	2,1026	-0,9	0,6	2,1027	-0,8	0,1	2,1055	2,0	2,8	2,1032	-0,3	-2,3
3022A	1,3717	6-11-2018	1,3715	-0,2	1,1	1,3717	0,0	0,2	1,3743	2,6	2,6	1,3725	0,8	-1,8
3022B	1,4297	6-11-2018	1,4291	-0,6	1,6	1,4296	-0,1	0,5	ntm bloembak			1,4306	0,9	
3028B	1,8969	6-11-2018	1,8962	-0,7	2,1	1,8964	-0,5	0,2	1,8976	0,7	1,2	1,8971	0,2	-0,5
3030A	2,9917	6-11-2018	2,9912	-0,5	1,4	2,9904	-1,3	-0,8	2,9908	-0,9	0,4	2,9909	-0,8	0,1
3030B	3,1047	6-11-2018	3,1040	-0,7	0,8	ntm			3,1046	-0,1		3,1043	-0,4	-0,3
4157A	2,3659	6-11-2018	2,3654	-0,5	1,0	2,3656	-0,3	0,2	2,3661	0,2	0,5	2,3652	-0,7	-0,9
4157B	2,0965	6-11-2018	2,0927	-3,8	0,8	2,0926	-3,9	-0,1	2,0930	-3,5	0,4	2,0928	-3,7	-0,2
4157C	2,6320	6-11-2018	2,6285	-3,5	0,8	2,6276	-4,4	-0,9	2,6292	-2,8	1,6	2,6277	-4,3	-1,5
													0,0	0,0
G2148	1,4043	29-11-2018	verdwenen			verdwenen			verdwenen			verdwenen		
2148A	1,9746	6-10-2016	1,9737	-0,9	0,5	1,9741	-0,5	0,4	1,9759	1,3	1,8	1,9741	-0,5	-1,8
2148B	2,2098	6-10-2016	2,2084	-1,4	0,2	2,2088	-1,0	0,4	2,2114	1,6	2,6	2,2092	-0,6	-2,2
2148C	2,5308	6-10-2016	2,5309	0,1	0,3	2,5306	-0,2	-0,3	2,5330	2,2	2,4	2,5309	0,1	-2,1
2148D	1,9377	6-10-2016	1,9366	-1,1	0,0	1,9372	-0,5	0,6	1,9394	1,7	2,2	1,9377	0,0	-1,7
2148E	2,4960	6-10-2016	2,4962	0,2	0,9	2,4960	0,0	-0,2	2,4978	1,8	1,8	2,4965	0,5	-1,3
2144A	2,6685	6-10-2016	2,6692	0,7	0,3	2,6690	0,5	-0,2	2,6705	2,0	1,5	2,6695	1,0	-1,0
2144B	2,6537	6-10-2016	2,6542	0,5	0,2	2,6541	0,4	-0,1	2,6554	1,7	1,3	2,6547	1,0	-0,7
													0,0	0,0

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR154949
Project: Amsterdam, Herengracht brug 20 en 21
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

[redacted]

Bout nummer	Nulmeting (0)	Datum 0-meting	HH meting 21(21) 25-3-2019	verschil (21-0) in mm	verschil (21-20) in mm	HH meting 22(22) 25-4-2019	verschil (22-0) in mm	verschil (22-21) in mm	HH meting 23(23) 28-5-2019	verschil (23-0) in mm	verschil (23-22) in mm	HH meting 24(24) 8-8-2019	verschil (24-0) in mm	verschil (24-23) in mm
2149A	0,9324	6-10-2016	0,9312	-1,2	-0,8	0,9314	-1,0	0,2	0,9330	0,6	1,6	0,9314	-1,0	-1,6
2149B	0,9239	6-10-2016	0,9230	-0,9	-0,2	0,9228	-1,1	-0,2	0,9253	1,4	2,5	0,9233	-0,6	-2,0
2157A	0,9511	6-10-2016	0,9490	-2,1	-0,4	0,9493	-1,8	0,3	0,9517	0,6	2,4	0,9491	-2,0	-2,6
2157B	0,9662	6-10-2016	0,9642	-2,0	-0,2	0,9640	-2,2	-0,2	0,9661	-0,1	2,1	0,9639	-2,3	-2,2
G2157	1,1654	29-11-2018	verdwenen			verdwenen			verdwenen			verdwenen		
2163A	2,4379	6-10-2016	2,4390	1,1	0,7	2,4371	-0,8	-1,9	2,4418	3,9	4,7	2,4382	0,3	-3,6
2163B	2,4674	6-10-2016	2,4691	1,7	1,3	2,4677	0,3	-1,4	2,4717	4,3	4,0	2,4681	0,7	-3,6
2163C	1,4258	6-10-2016	1,4254	-0,4		1,4246	-1,2	-0,8	1,4292	3,4	4,6	1,4248	-1,0	-4,4
G2169B	0,8813	29-11-2018	verdwenen			verdwenen			verdwenen			verdwenen		
2169A	1,5250	6-10-2016	1,5229	-2,1	-0,2	1,5227	-2,3	-0,2	1,5258	-0,2	1,8	1,5222	-2,8	-3,6
2169B	2,2729	6-10-2016	2,2710	-1,9	1,1	2,2695	-3,4	-1,5	2,2721	-0,2	1,8	2,2688	-4,1	-3,3
2169C	2,2830	6-10-2016	2,2800	-3,0	-0,5	2,2800	-3,0	0,0	2,2802	-0,2	1,8	2,2793	-3,7	-0,9
G2169	1,1034	29-11-2018	verdwenen			verdwenen			verdwenen			verdwenen		
1016A	2,5411	6-10-2016	2,5388	-2,3	0,3	2,5377	-3,4	-1,1	2,5394	-1,7	1,7	2,5373	-3,8	-2,1
1016B	1,8711	6-10-2016	1,8684	-2,7	-0,1	1,8684	-2,7	0,0	1,8695	-1,6	1,1	1,8679	-3,2	-1,6
Opmerkingen														

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR154949
Project: Amsterdam, Herengracht brug 20 en 21
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

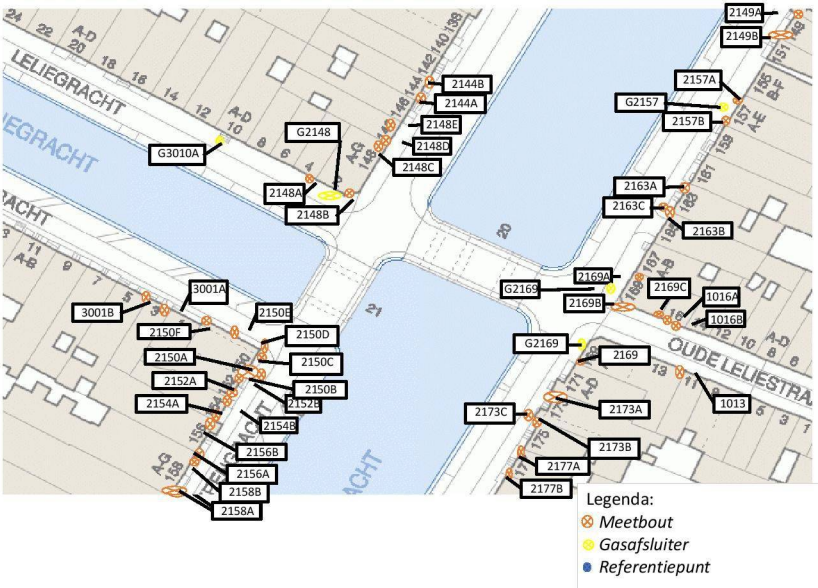

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR154949
Project: Amsterdam, Herengracht brug 20 en 21
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting



Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR154949
Project: Amsterdam, Herengracht brug 20 en 21
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

[redacted]

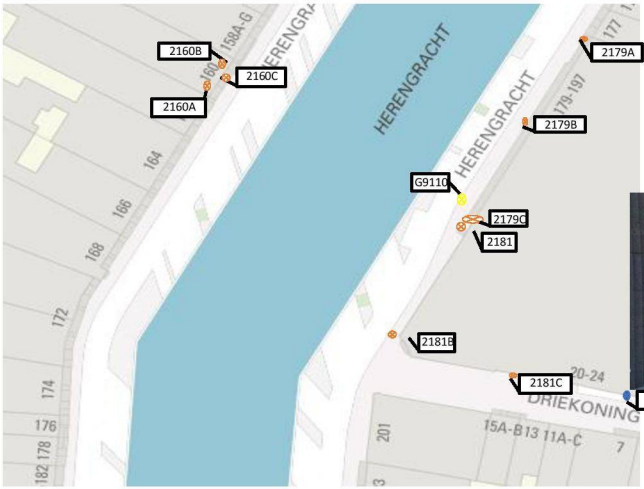



Legenda:
- *Meetbout*
- *Gasafsluiter*
- *Referentiepunt*
