
Datum: 11-12-2018
Versie: 1
Status: In bewerking
Betreft: Overallplanning o.b.v. werkbare dagen planning
Opsteller: [redacted]

Planning CAN Noorderkwartier Aanleg maaiveldinrichting woningen laagbouw

Reimert Bouw en Infrastructuur

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Project Woonrijp maken maaiveldinrichting laagbouw woningen**	**301 dagen?**	**maa 3-9-18**	**maa 16-12-19**
2	**Contractueel**	**249 dagen**	**maa 3-9-18**	**vri 4-10-19**
3	Indienen inschrijving	0 dagen	maa 3-9-18	maa 3-9-18
4	Opdrachtverstrekking contractueel	0 dagen	maa 17-9-18	maa 17-9-18
5	Opdracht ontvangen	0 dagen	din 23-10-18	din 23-10-18
6	Opleverdatum	0 dagen	vri 4-10-19	vri 4-10-19
7	**BLVC-Uitvoeringsfasering**	**182 dagen**	**don 1-11-18**	**vri 30-8-19**
8	Fase 1	73 dagen	don 1-11-18	don 28-2-19
9	Fase 2	73 dagen	don 1-11-18	don 28-2-19
10	Fase 3	81 dagen	maa 4-2-19	woe 29-5-19
11	Fase 4	47 dagen	maa 3-6-19	vri 30-8-19
12	Fase 5	13 dagen	maa 3-12-18	woe 19-12-18
13				
14	**Planning opdrachtgever versie 14 26-11-18**	**153 dagen**	**maa 18-2-19**	**vri 18-10-19**
15	**Fase 1**	**61 dagen**	**maa 4-3-19**	**woe 29-5-19**
16	Aanleg parkstrook	34 dagen	maa 4-3-19	don 18-4-19
17	Aanleg blok 1	27 dagen	din 23-4-19	woe 29-5-19
18	**Fase2**	**71 dagen**	**maa 18-2-19**	**woe 29-5-19**
19	Aanleg bouwweg	10 dagen	maa 18-2-19	vri 1-3-19
20	Maaiveld inrichting	36 dagen	maa 8-4-19	woe 29-5-19
21	**Fase 3**	**46 dagen**	**maa 13-5-19**	**don 18-7-19**
22	Maaiveld inrichting	46 dagen	maa 13-5-19	don 18-7-19
23	**Fase 4**	**18 dagen**	**maa 8-7-19**	**vri 23-8-19**
24	Maaiveld inrichting	18 dagen	maa 8-7-19	vri 23-8-19
25	**Fase 5**	**30 dagen**	**maa 9-9-19**	**vri 18-10-19**
26	Maaiveld inrichting	30 dagen	maa 9-9-19	vri 18-10-19
27				
28	**Uitvoering**	**260 dagen?**	**maa 29-10-18**	**maa 16-12-19**
29	**Voorbereidende werkzaamheden**	**82 dagen**	**maa 29-10-18**	**maa 11-3-19**
30	Opstellen planning	25 dagen	din 30-10-18	maa 3-12-18
31	Opstellen V&G-plan	25 dagen	din 30-10-18	maa 3-12-18
32	Opstellen PKP	25 dagen	din 30-10-18	maa 3-12-18
33	**Engineering M2 t/m M4, M7 t/m M9, M11 t/m M14, M6en T4 t/m T6**	**56 dagen**	**woe 28-11-18**	**maa 4-3-19**
34	Maken UO	20 dagen	woe 28-11-18	maa 14-1-19
35	Goedkeuring- acceptatieperiode door directie	10 dagen	maa 14-1-19	vri 25-1-19
36	Doorvoeren aanpassingen	1 wk	maa 28-1-19	vri 1-2-19
37	Indienen definitieve UO	1 dag	maa 4-2-19	maa 4-2-19
38	Gereed voor start werk	20 dagen	din 5-2-19	maa 4-3-19
39	Inkoop wapeningen, beton etc	5 dagen	din 5-2-19	maa 11-2-19
40	Productie wapening	20 dagen	din 12-2-19	maa 11-3-19
41	Inkoop en OA	0 dagen	maa 29-10-18	maa 29-10-18
42	**Start werk**	**223 dagen?**	**din 8-1-19**	**maa 16-12-19**
43	Inrichten werkterrein	5 dagen	din 8-1-19	maa 14-1-19
44	**Fase 1A**	**83 dagen**	**maa 4-3-19**	**woe 3-7-19**
45	Aanbrengen verkeersmaatregelen	0 dagen	maa 4-3-19	maa 4-3-19
46	Verwijderen steconplaten	2 dagen	maa 4-3-19	din 5-3-19
47	Verwijderen bestrating	5 dagen	woe 6-3-19	din 12-3-19
48	Verwijderen containers (door derden)	1 dag	woe 6-3-19	woe 6-3-19
49	Grondwerk tbv wanden	3 dagen	maa 4-3-19	woe 6-3-19
50	**Aanbrengen keermuren M11, M12, M13 en M14**	**50 dagen**	**don 7-3-19**	**vri 17-5-19**
51	Aanbrengen werkvloer	2 dagen	don 7-3-19	vri 8-3-19
52	Toepassen vloerbekisting	4 dagen	maa 11-3-19	don 14-3-19
53	Aanbrengen wapening vloer	4 dagen	woe 13-3-19	maa 18-3-19
54	Stoppunt wapening	1 dag	din 19-3-19	din 19-3-19
55	Aanbrengen beton voor vloer	2 dagen	woe 20-3-19	don 21-3-19
56	Uitharden beton	28 vdagen	don 21-3-19	don 18-4-19
57	Ontkisten vloerbekisting	2 dagen	vri 29-3-19	maa 1-4-19
58	Toepassen wandbekisting	7 dagen	maa 25-3-19	din 2-4-19
59	Aanbrengen wapening wand	4 dagen	maa 1-4-19	don 4-4-19
60	Stoppunt wapening	1 dag	vri 5-4-19	vri 5-4-19
61	Aanbrengen beton voor wanden	2 dagen	maa 8-4-19	din 9-4-19
62	Uitharden beton	28 vdagen	din 9-4-19	din 7-5-19
63	Ontkisten wandbekisting	4 dagen	maa 15-4-19	don 18-4-19
64	Aanbrengen metselwerk	16 dagen	din 23-4-19	din 14-5-19

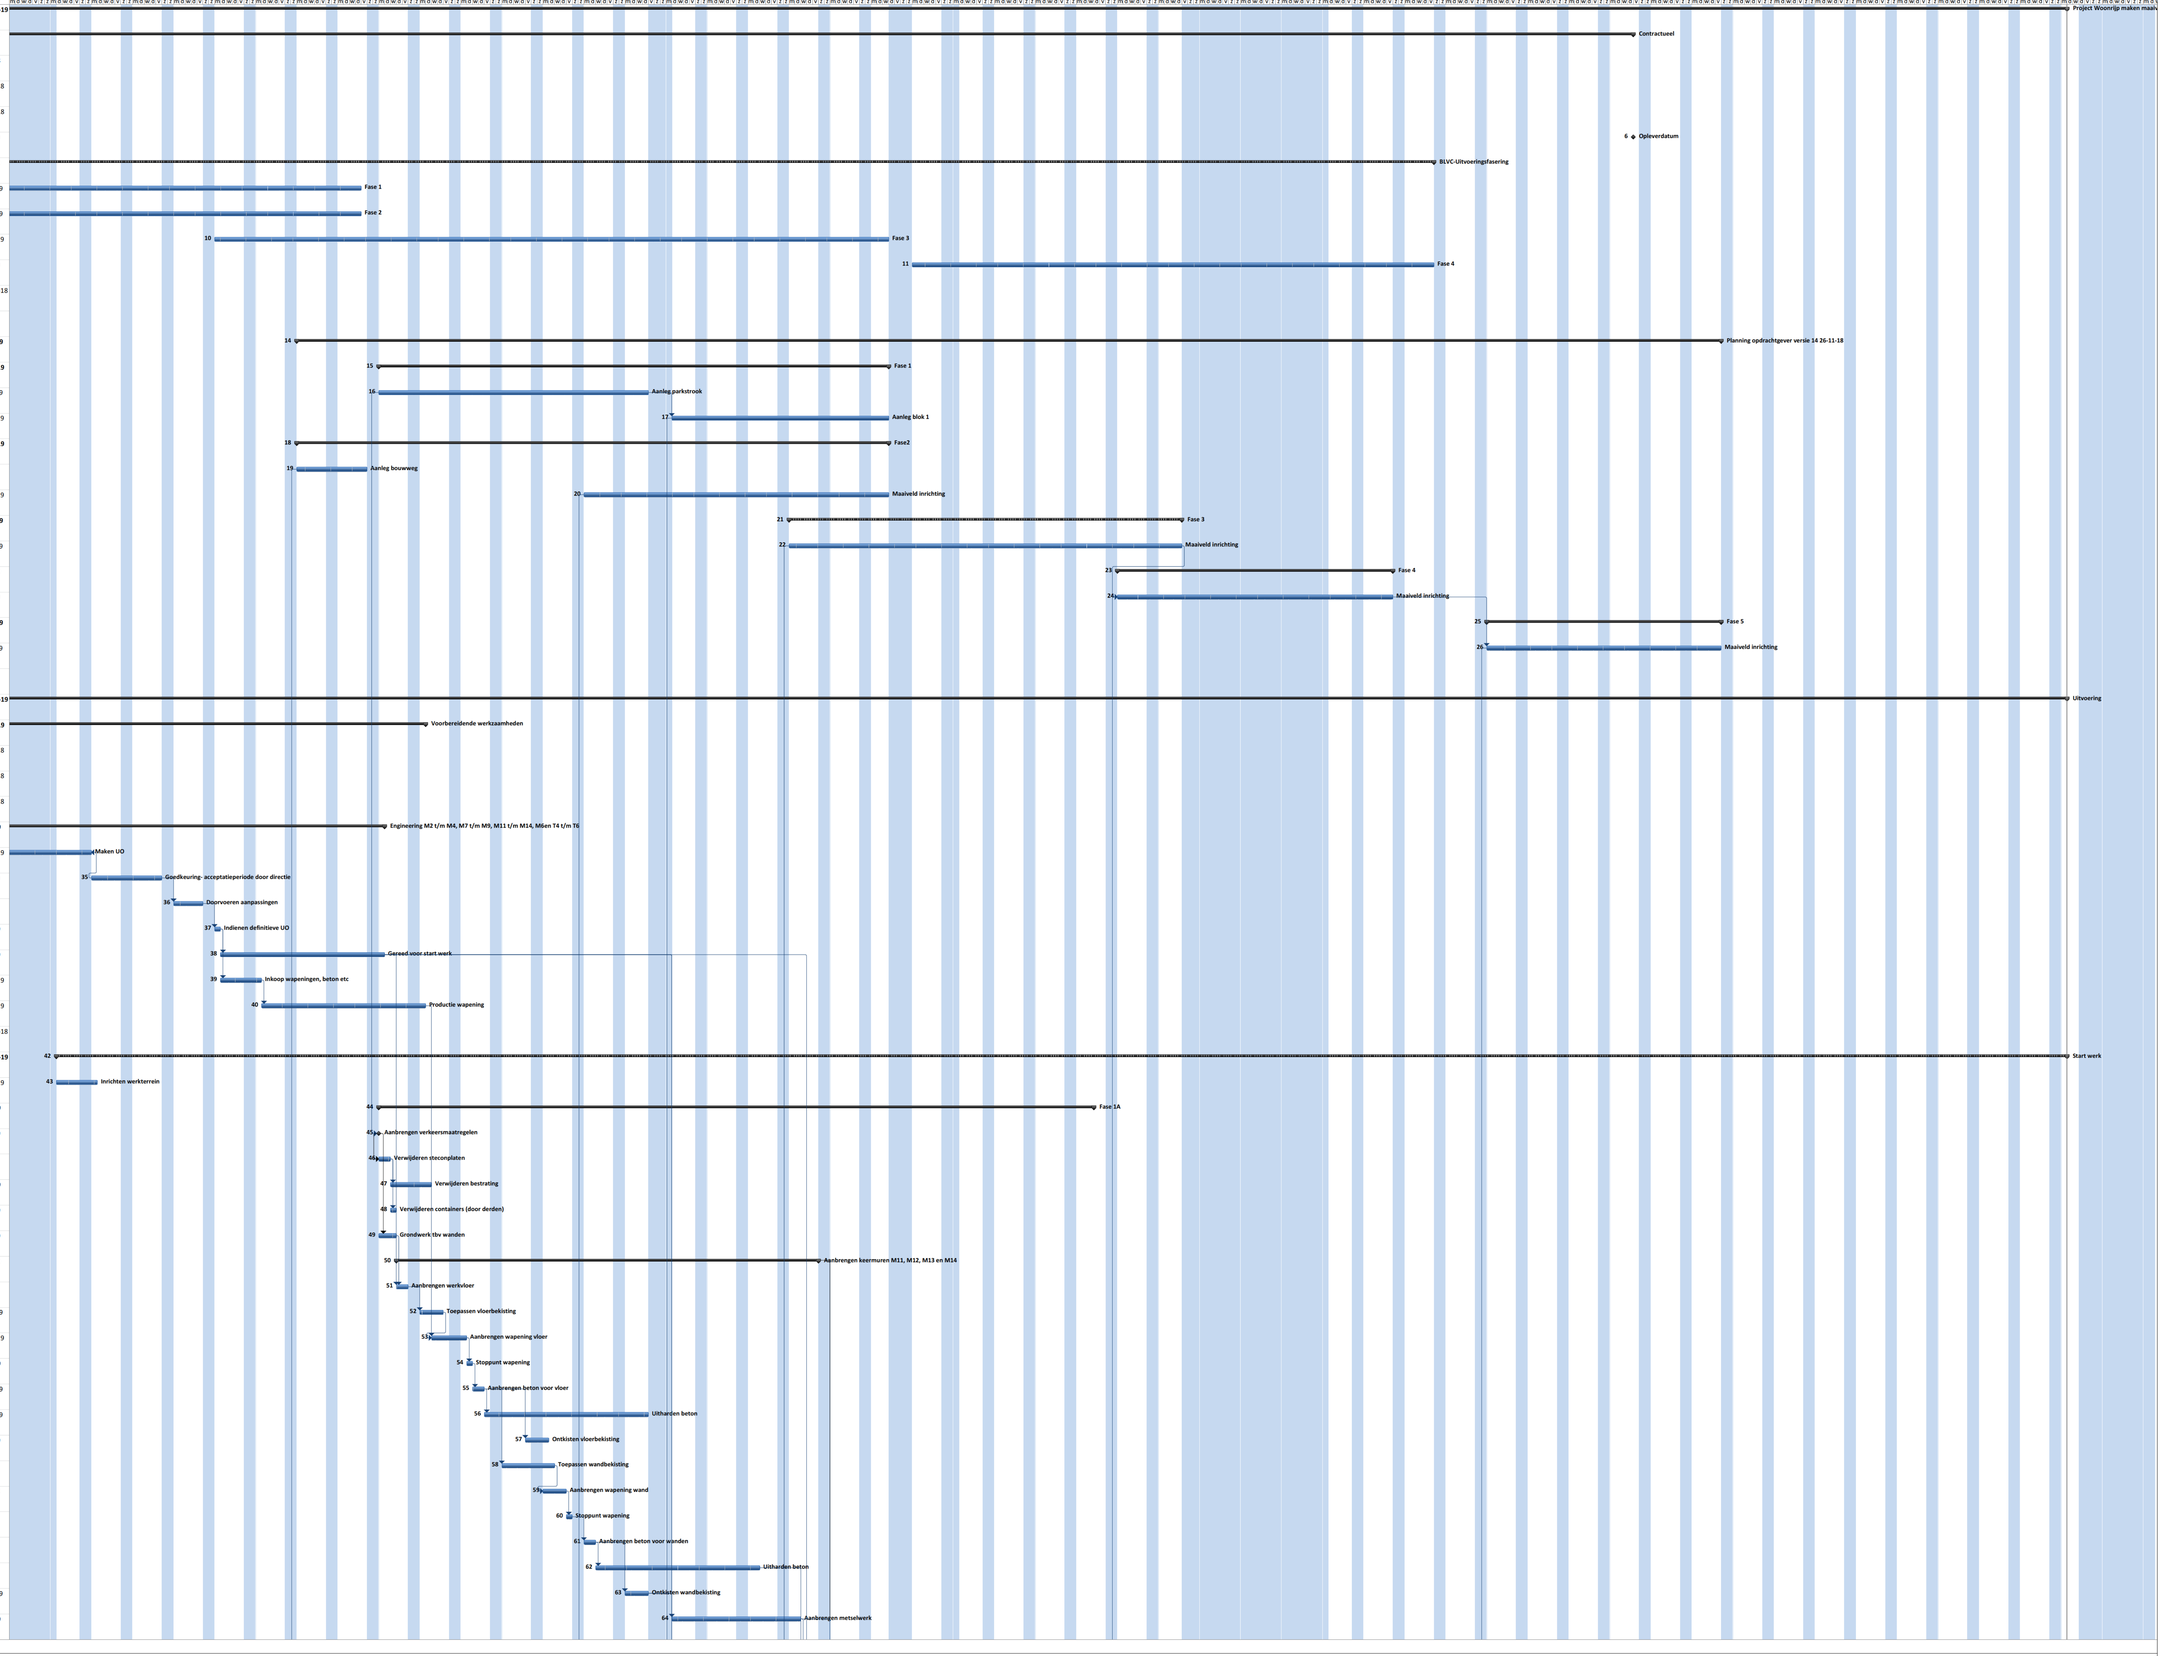

Project: 180109; OPL 20181211
Datum: din 11-12-18

Taak | Splitsing | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Externe taken | Externe mijlpaal | Inactieve taken | Inactieve mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatig taak | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Deadline | Voortgang

Datum: 11-12-2018
Versie: 1
Status: In bewerking
Betreft: Overallplanning o.b.v. werkbare dagen planning
Opsteller: [redacted]

Planning CAN Noorderkwartier Aanleg maaiveldinrichting woningen laagbouw

Reimert
Bouw en Infrastructuur

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
65	Aanvullen rondom wanden	3 dagen	woe 15-5-19	vri 17-5-19
66	Aanbrengen Seats en rabat strook incl zandcement stabilisatie	10 dagen	maa 20-5-19	din 4-6-19
67	Aanbrengen trap 9 incl grondwerk	5 dagen	woe 15-5-19	din 21-5-19
68	Aanbrengen elementen verharding tpv seats	5 dagen	woe 5-6-19	woe 12-6-19
69	Aanbrengen kolken tpv seats	3 dagen	vri 7-6-19	woe 12-6-19
70	Aanbrengen betonweg	5 dagen	woe 5-6-19	woe 12-6-19
71	Aanbrengen schanskorf	5 dagen	don 13-6-19	woe 19-6-19
72	Ontgraven cunet tbv asfalt	1,5 dagen	don 13-6-19	vri 14-6-19
73	Aanbrengen cunet asfalt	1,5 dagen	vri 14-6-19	maa 17-6-19
74	Aanbrengen fundering asfalt	2 dagen	din 18-6-19	woe 19-6-19
75	Aanbrengen onderlaag asfalt	0,5 dagen	don 20-6-19	don 20-6-19
76	Aanbrengen deklaag asfalt	0,5 dagen	don 20-6-19	don 20-6-19
77	Afstrooien asfalt met parelgrind	0,1 dagen	don 20-6-19	don 20-6-19
78	Afwerken groenstroken maken plantgaten	10 dagen	don 20-6-19	woe 3-7-19
79	**Fase 1B**	**34 dagen**	**din 23-4-19**	**woe 12-6-19**
80	Grond ontgraven uit cunet	4 dagen	din 23-4-19	vri 26-4-19
81	Aanbrengen fundering	4 dagen	don 25-4-19	din 30-4-19
82	Aanbrengen opsluitbanden	4 dagen	woe 1-5-19	maa 6-5-19
83	Aanbrengen trottiorband	4 dagen	din 7-5-19	vri 10-5-19
84	Aanbrengen kolken	10 dagen	maa 13-5-19	vri 24-5-19
85	Aanbrengen rijweg kf incl drempel en plateau	10 dagen	maa 13-5-19	vri 24-5-19
86	Aanbrengen trottior (naar aanleg K&L)	10 dagen	maa 27-5-19	woe 12-6-19
87	Aanbrengen trap 10 incl grondwerk	5 dagen	woe 1-5-19	din 7-5-19
88	**Fase 2A**	**17 dagen**	**maa 18-2-19**	**din 12-3-19**
89	Verwijderen menggranulaat	3 dagen	maa 18-2-19	woe 20-2-19
90	Cunet op hoogte maken	2 dagen	don 21-2-19	vri 22-2-19
91	Aanbrengen menggranulaat	3 dagen	maa 25-2-19	woe 27-2-19
92	Aanbrengen straatlaag	4 dagen	don 28-2-19	din 5-3-19
93	Aanbrengen trottiorband	2 dagen	woe 6-3-19	don 7-3-19
94	Aanbrenge inritband	1 dag	woe 6-3-19	woe 6-3-19
95	Aanbrengen kolken	1 dag	don 7-3-19	don 7-3-19
96	Aanbrengen rollaag	1 dag	vri 8-3-19	vri 8-3-19
97	Aanbrengen stelconplaten	2 dagen	maa 11-3-19	din 12-3-19
98	**Fase 2B**	**127 dagen?**	**maa 8-4-19**	**don 31-10-19**
99	Verwijderen bouwweg	3 dagen	maa 8-4-19	woe 10-4-19
100	Grondwerk tbv wanden en trappen	3 dagen	don 11-4-19	maa 15-4-19
101	**Aanbrengen wanden M2, M3 en M4**	**41 dagen?**	**din 23-4-19**	**vri 21-6-19**
102	Aanbrengen werkvloer	2 dagen	din 23-4-19	woe 24-4-19
103	Toepassen vloerbekisting	4 dagen	don 25-4-19	din 30-4-19
104	Aanbrengen wapening vloer	3 dagen	maa 29-4-19	woe 1-5-19
105	Stoppunt wapening	1 dag	don 2-5-19	don 2-5-19
106	Aanbrengen beton voor vloer	2 dagen	vri 3-5-19	maa 6-5-19
107	Uitharden beton	28 vdagen	maa 6-5-19	maa 3-6-19
108	Ontkisten vloerbekisting	2 dagen	din 14-5-19	woe 15-5-19
109	Toepassen wandbekisting	4 dagen	woe 8-5-19	maa 13-5-19
110	Aanbrengen wapening wand	4 dagen	vri 10-5-19	woe 15-5-19
111	Stoppunt wapening	1 dag?	don 16-5-19	don 16-5-19
112	Aanbrengen beton voor wanden	2 dagen	vri 17-5-19	maa 20-5-19
113	Uitharden beton	28 vdagen	maa 20-5-19	maa 17-6-19
114	Ontkisten wandbekisting	4 dagen	vri 24-5-19	woe 29-5-19
115	Aanbrengen metselwerk	12 dagen	maa 3-6-19	woe 19-6-19
116	Aanvullen rondom wanden	2 dagen	don 20-6-19	vri 21-6-19
117	Aanbrengen Trap 1 (prefab)	15 dagen	maa 24-6-19	vri 12-7-19
118	Aanbrengen Trap 2 (prefab)	15 dagen	maa 15-7-19	din 27-8-19
119	Aanbrengen schanskorf	5 dagen	woe 28-8-19	din 3-9-19
120	Ontgraven cunet asfalt	2 dagen	woe 4-9-19	don 5-9-19
121	Ontgraven cunet parkeervakken rijweg en trottoir	3 dagen	vri 6-9-19	din 10-9-19
122	Aanbrengen fundering	4 dagen	woe 11-9-19	maa 16-9-19
123	Aanbrengen onderlaag asfalt	0,5 dagen	din 17-9-19	din 17-9-19
124	Aanbrengen deklaag asfalt	0,5 dagen	vri 20-9-19	vri 20-9-19
125	Afstrooien asfalt met parelgrind	0,1 dagen	vri 20-9-19	vri 20-9-19
126	Aanbrengen straatlaag	3 dagen	din 17-9-19	don 19-9-19
127	Aanbrengen trottoirbanden en opsluitbanden	7 dagen	vri 20-9-19	maa 30-9-19
128	Aanbrengen kolken	7 dagen	vri 20-9-19	maa 30-9-19
129	Aanbrengen trottoir	3 dagen	din 1-10-19	don 3-10-19
130	Aanbrengen perkeervakken	3 dagen	din 1-10-19	don 3-10-19

Datum: 11-12-2018
Versie: 1
Status: In bewerking
Betreft: Overallplanning o.b.v. werkbare dagen planning
Opsteller: [redacted]

Planning CAN Noorderkwartier Aanleg maaiveldinrichting woningen laagbouw

Reimert Bouw en Infrastructuur

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
131	Aanbrengen rollaag en molgoot	4 dagen	vri 4-10-19	woe 9-10-19
132	Aanbrengen rijweg	6 dagen	don 10-10-19	don 17-10-19
133	Afwerken groenstroken maken plantgaten	10 dagen	vri 18-10-19	don 31-10-19
134	**Fase 3**	**150 dagen**	**din 23-4-19**	**maa 16-12-19**
135	**Prefabriceren wanden M6 (zelf)**	**48 dagen**	**din 23-4-19**	**din 2-7-19**
136	Maken werkvloer	3 dagen	din 23-4-19	don 25-4-19
137	Toepassen randbekisting	9 dagen	vri 26-4-19	woe 8-5-19
138	Aanbrengen wapening	9 dagen	don 9-5-19	din 21-5-19
139	Aanbrengen beton	5 dagen	woe 22-5-19	din 28-5-19
140	Uitharden beton	28 vdagen	din 28-5-19	din 25-6-19
141	Ontkisten randbekisting	9 dagen	vri 7-6-19	don 20-6-19
142	Aanbrengen metselwerk	8 dagen	vri 21-6-19	din 2-7-19
143	Plaatsen elementen	10 dagen	woe 3-7-19	din 16-7-19
144	Grondwerk tbv wanden en trappen	3 dagen	maa 13-5-19	woe 15-5-19
145	**Aanbrengen wanden M7, M8 en M9**	**78 dagen**	**don 16-5-19**	**maa 30-9-19**
146	Aanbrengen werkvloer	3 dagen	don 16-5-19	maa 20-5-19
147	Toepassen vloerbekisting	7 dagen	din 21-5-19	woe 29-5-19
148	Aanbrengen wapening vloer	4 dagen	din 28-5-19	din 4-6-19
149	Stoppunt wapening	1 dag	woe 5-6-19	woe 5-6-19
150	Aanbrengen beton voor vloer	3 dagen	don 6-6-19	din 11-6-19
151	Uitharden beton	28 vdagen	din 11-6-19	din 9-7-19
152	Ontkisten vloerbekisting	4 dagen	woe 19-6-19	maa 24-6-19
153	Toepassen wandbekisting	19 dagen	don 13-6-19	din 9-7-19
154	Aanbrengen wapening wand	10 dagen	woe 26-6-19	din 9-7-19
155	Stoppunt wapening	1 dag	woe 10-7-19	woe 10-7-19
156	Aanbrengen beton voor wanden	3 dagen	don 11-7-19	maa 15-7-19
157	Uitharden beton	28 vdagen	maa 15-7-19	maa 12-8-19
158	Ontkisten wandbekisting	10 dagen	din 13-8-19	maa 26-8-19
159	Aanbrengen metselwerk	25 dagen	din 20-8-19	maa 23-9-19
160	Aanvullen rondom wanden	5 dagen	din 24-9-19	maa 30-9-19
161	**Aanbrengen trappen T4 t/m T6**	**29 dagen**	**din 20-8-19**	**vri 27-9-19**
162	Aanbrengen werkvloer	2 dagen	din 20-8-19	woe 21-8-19
163	Toepassen rand- en verloren bekisting	3 dagen	don 22-8-19	maa 26-8-19
164	Aanbrengen wapening traptreden	2 dagen	maa 26-8-19	din 27-8-19
165	Stoppunt wapening	1 dag	woe 28-8-19	woe 28-8-19
166	Aanbrengen beton voor traptreden	2 dagen	don 29-8-19	vri 30-8-19
167	Uitharden beton	28 vdagen	vri 30-8-19	vri 27-9-19
168	Ontkisten randbekisting	2 dagen	don 5-9-19	vri 6-9-19
169	Aanbrengen metselwerk	10 dagen	maa 9-9-19	vri 20-9-19
170	Aanbrengen trap 3 (prefab)	15 dagen	din 24-9-19	maa 14-10-19
171	Aanbrengen trap 7 (prefab)	15 dagen	din 24-9-19	maa 14-10-19
172	Aanbrengen trap 8 (prefab)	15 dagen	din 24-9-19	maa 14-10-19
173	Aanbrengen schanskorf	5 dagen	maa 23-9-19	vri 27-9-19
174	Ontgraven cunet asfalt	2 dagen	maa 30-9-19	din 1-10-19
175	Aanbrengen fundering	4 dagen	woe 2-10-19	maa 7-10-19
176	Aanbrengen banden	4 dagen	din 8-10-19	vri 11-10-19
177	Aanbrengen onderlaag asfalt	0,5 dagen	maa 14-10-19	maa 14-10-19
178	Aanbrengen deklaag asfalt	0,5 dagen	din 29-10-19	din 29-10-19
179	Afstrooien asfalt met parelgrind	0,1 dagen	din 29-10-19	din 29-10-19
180	Ontgraven cunet	5 dagen	din 8-10-19	maa 14-10-19
181	Aanbrengen menggranulaat	5 dagen	din 15-10-19	maa 21-10-19
182	Aanbrengen straatlaag	5 dagen	din 22-10-19	maa 28-10-19
183	Aanbrengen trottoirbanden en opsluitbanden	10 dagen	din 29-10-19	maa 11-11-19
184	Aanbrengen kolken	10 dagen	din 29-10-19	maa 11-11-19
185	Aanbrengen trottoir	5 dagen	din 12-11-19	maa 18-11-19
186	Aanbrengen rijweg	10 dagen	din 19-11-19	maa 2-12-19
187	Afwerken groenstroken maken plantgaten	10 dagen	din 3-12-19	maa 16-12-19
188	**Fase 4**	**40 dagen**	**maa 8-7-19**	**din 24-9-19**
189	Ontgravgen cunet	5 dagen	maa 8-7-19	vri 12-7-19
190	Aanbrengen menggranulaat	5 dagen	maa 15-7-19	din 13-8-19
191	Aanbrengen banden	10 dagen	woe 14-8-19	din 27-8-19
192	Aanbrengen kolken	10 dagen	woe 14-8-19	din 27-8-19
193	Aanbrengen straatlaag	20 dagen	woe 28-8-19	din 24-9-19
194	Aanbrengen straatwerk	20 dagen	woe 28-8-19	din 24-9-19
195	**Fase 5**	**30 dagen**	**maa 9-9-19**	**vri 18-10-19**
196	Maaiveld inrichting	30 dagen	maa 9-9-19	vri 18-10-19
