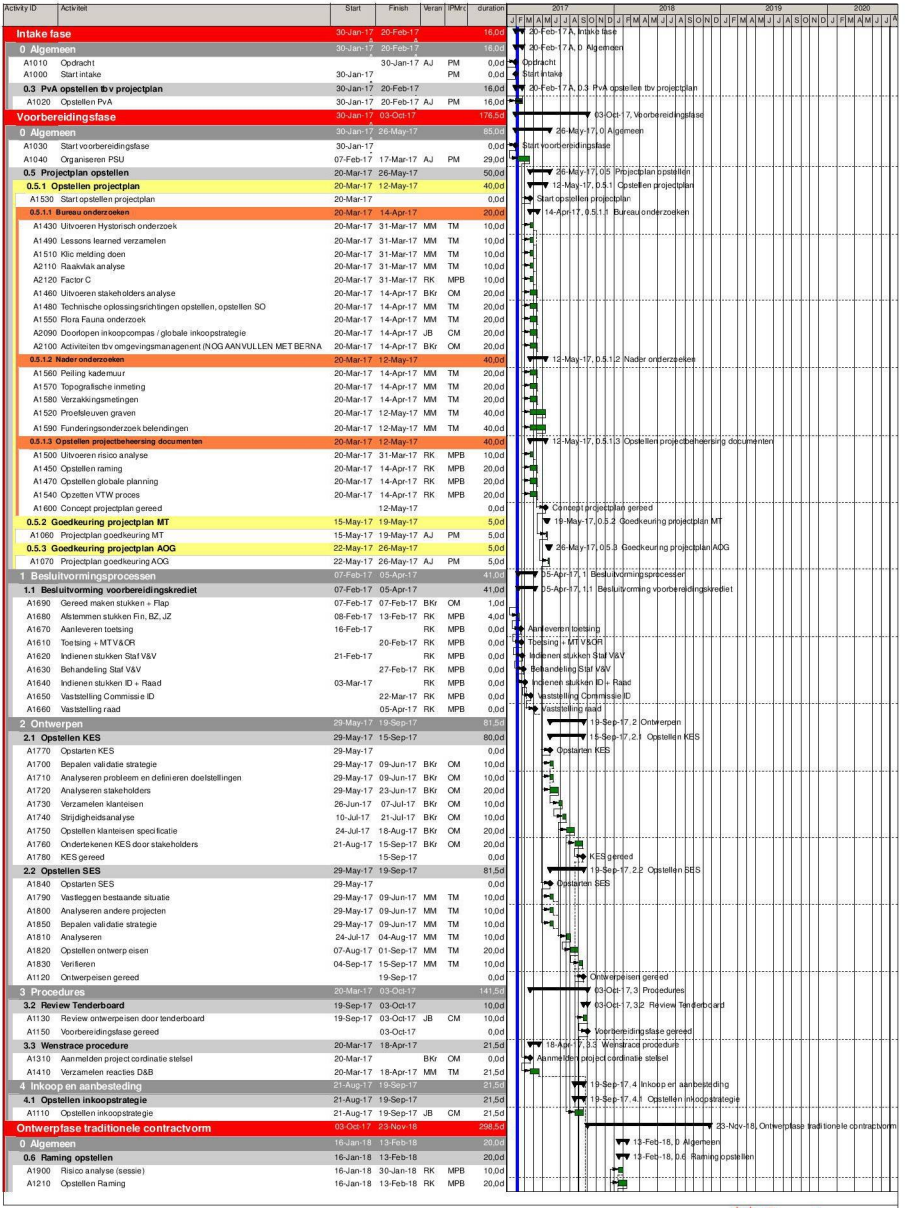

Activity ID	Activiteit	Start	Finish	Veran	IPMrc	duration
Intake fase		30-Jan-17	20-Feb-17			16,0d
0 Algemeen		30-Jan-17	20-Feb-17			16,0d
A1010	Opdracht		30-Jan-17	AJ	PM	0,0d
A1000	Start intake	30-Jan-17			PM	0,0d
0.3 PvA opstellen tbv projectplan		30-Jan-17	20-Feb-17			16,0d
A1020	Opstellen PvA	30-Jan-17	20-Feb-17	AJ	PM	16,0d
Voorbereidingsfase		30-Jan-17	03-Oct-17			176,5d
0 Algemeen		30-Jan-17	26-May-17			65,0d
A1030	Start voorbereidingsfase	30-Jan-17				0,0d
A1040	Organiseren PSU	07-Feb-17	17-Mar-17	AJ	PM	29,0d
0.5 Projectplan opstellen		20-Mar-17	26-May-17			50,0d
0.5.1 Opstellen projectplan		20-Mar-17	12-May-17			40,0d
A1530	Start opstellen projectplan	20-Mar-17				0,0d
0.5.1.1 Bureau onderzoeken		20-Mar-17	14-Apr-17			20,0d
A1430	Uitvoeren Hystorisch onderzoek	20-Mar-17	31-Mar-17	MM	TM	10,0d
A1490	Lessons learned verzamelen	20-Mar-17	31-Mar-17	MM	TM	10,0d
A1510	Klic melding doen	20-Mar-17	31-Mar-17	MM	TM	10,0d
A2110	Raakvlak analyse	20-Mar-17	31-Mar-17	MM	TM	10,0d
A2120	Factor C	20-Mar-17	31-Mar-17	RK	MPB	10,0d
A1460	Uitvoeren stakeholders analyse	20-Mar-17	14-Apr-17	BKr	OM	20,0d
A1480	Technische oplossingsrichtingen opstellen, opstellen SO	20-Mar-17	14-Apr-17	MM	TM	20,0d
A1550	Flora Fauna onderzoek	20-Mar-17	14-Apr-17	MM	TM	20,0d
A2090	Doorlopen inkoopcompas / globale inkoopstrategie	20-Mar-17	14-Apr-17	JB	CM	20,0d
A2100	Activiteiten tbv omgevingsmanagement (NOG AANVULLEN MET BERNA	20-Mar-17	14-Apr-17	BKr	OM	20,0d
0.5.1.2 Nader onderzoeken		20-Mar-17	12-May-17			40,0d
A1560	Peiling kademuur	20-Mar-17	14-Apr-17	MM	TM	20,0d
A1570	Topografische inmeting	20-Mar-17	14-Apr-17	MM	TM	20,0d
A1580	Verzakkingsmetingen	20-Mar-17	14-Apr-17	MM	TM	20,0d
A1520	Proefsleuven graven	20-Mar-17	12-May-17	MM	TM	40,0d
A1590	Funderingsonderzoek belendingen	20-Mar-17	12-May-17	MM	TM	40,0d
0.5.1.3 Opstellen projectbeheersing documenten		20-Mar-17	12-May-17			40,0d
A1500	Uitvoeren risico analyse	20-Mar-17	31-Mar-17	RK	MPB	10,0d
A1450	Opstellen raming	20-Mar-17	14-Apr-17	RK	MPB	20,0d
A1470	Opstellen globale planning	20-Mar-17	14-Apr-17	RK	MPB	20,0d
A1540	Opzetten VTW proces	20-Mar-17	14-Apr-17	RK	MPB	20,0d
A1600	Concept projectplan gereed		12-May-17			0,0d
0.5.2 Goedkeuring projectplan MT		15-May-17	19-May-17			5,0d
A1060	Projectplan goedkeuring MT	15-May-17	19-May-17	AJ	PM	5,0d
0.5.3 Goedkeuring projectplan AOG		22-May-17	26-May-17			5,0d
A1070	Projectplan goedkeuring AOG	22-May-17	26-May-17	AJ	PM	5,0d
1 Besluitvormingsprocessen		07-Feb-17	05-Apr-17			41,0d
1.1 Besluitvorming voorbereidingskrediet		07-Feb-17	05-Apr-17			41,0d
A1690	Gereed maken stukken + Flap	07-Feb-17	07-Feb-17	BKr	OM	1,0d
A1680	Afstemmen stukken Fin, BZ, JZ	08-Feb-17	13-Feb-17	RK	MPB	4,0d
A1670	Aanleveren toetsing	16-Feb-17		RK	MPB	0,0d
A1610	Toetsing + MT V&OR		20-Feb-17	RK	MPB	0,0d
A1620	Indienen stukken Staf V&V	21-Feb-17		RK	MPB	0,0d
A1630	Behandeling Staf V&V		27-Feb-17	RK	MPB	0,0d
A1640	Indienen stukken ID + Raad	03-Mar-17		RK	MPB	0,0d
A1650	Vaststelling Commissie ID		22-Mar-17	RK	MPB	0,0d
A1660	Vaststelling raad		05-Apr-17	RK	MPB	0,0d
2 Ontwerpen		29-May-17	19-Sep-17			81,5d
2.1 Opstellen KES		29-May-17	15-Sep-17			80,0d
A1770	Opstarten KES	29-May-17				0,0d
A1700	Bepalen validatie strategie	29-May-17	09-Jun-17	BKr	OM	10,0d
A1710	Analyseren probleem en definieren doelstellingen	29-May-17	09-Jun-17	BKr	OM	10,0d
A1720	Analyseren stakeholders	29-May-17	23-Jun-17	BKr	OM	20,0d
A1730	Verzamelen klanteisen	26-Jun-17	07-Jul-17	BKr	OM	10,0d
A1740	Strijdigheidsanalyse	10-Jul-17	21-Jul-17	BKr	OM	10,0d
A1750	Opstellen klanteisen specificatie	24-Jul-17	18-Aug-17	BKr	OM	20,0d
A1760	Ondertekenen KES door stakeholders	21-Aug-17	15-Sep-17	BKr	OM	20,0d
A1780	KES gereed		15-Sep-17			0,0d
2.2 Opstellen SES		29-May-17	19-Sep-17			81,5d
A1840	Opstarten SES	29-May-17				0,0d
A1790	Vastleggen bestaande situatie	29-May-17	09-Jun-17	MM	TM	10,0d
A1800	Analyseren andere projecten	29-May-17	09-Jun-17	MM	TM	10,0d
A1850	Bepalen validatie strategie	29-May-17	09-Jun-17	MM	TM	10,0d
A1810	Analyseren	24-Jul-17	04-Aug-17	MM	TM	10,0d
A1820	Opstellen ontwerp eisen	07-Aug-17	01-Sep-17	MM	TM	20,0d
A1830	Verifieren	04-Sep-17	15-Sep-17	MM	TM	10,0d
A1120	Ontwerpeisen gereed		19-Sep-17			0,0d
3 Procedures		20-Mar-17	03-Oct-17			141,5d
3.2 Review Tenderboard		19-Sep-17	03-Oct-17			10,0d
A1130	Review ontwerpeisen door tenderboard	19-Sep-17	03-Oct-17	JB	CM	10,0d
A1150	Voorbereidingsfase gereed		03-Oct-17			0,0d
3.3 Wenstrace procedure		20-Mar-17	18-Apr-17			21,5d
A1310	Aanmelden project cordinatie stelsel	20-Mar-17		BKr	OM	0,0d
A1410	Verzamelen reacties D&B	20-Mar-17	18-Apr-17	MM	TM	21,5d
4 Inkoop en aanbesteding		21-Aug-17	19-Sep-17			21,5d
4.1 Opstellen inkoopstrategie		21-Aug-17	19-Sep-17			21,5d
A1110	Opstellen inkoopstrategie	21-Aug-17	19-Sep-17	JB	CM	21,5d
Ontwerpfase traditionele contractvorm		03-Oct-17	23-Nov-18			298,5d
0 Algemeen		16-Jan-18	13-Feb-18			20,0d
0.6 Raming opstellen		16-Jan-18	13-Feb-18			20,0d
A1900	Risico analyse (sessie)	16-Jan-18	30-Jan-18	RK	MPB	10,0d
A1210	Opstellen Raming	16-Jan-18	13-Feb-18	RK	MPB	20,0d

Printdatum07-Feb-17
Peildatum 07-Feb-17
Opmaak DN Walmuur JCM
Standaardplanning:

Vernieuwing walmuren Jacob Catskade en Marnixkade

Gemeente Amsterdam

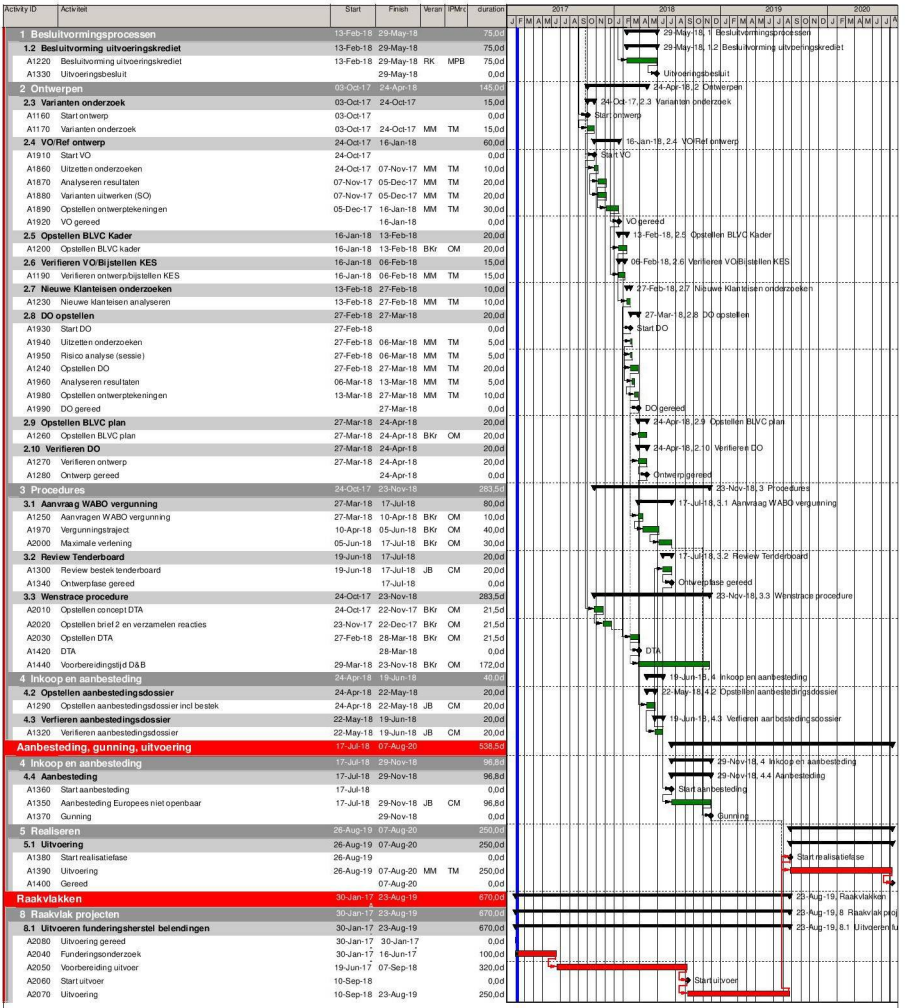

Activity ID	Activiteit	Start	Finish	Veran	IPMrc	duration
1	**Besluitvormingsprocessen**	13-Feb-18	29-May-18			75,0d
1.2	**Besluitvorming uitvoeringskrediet**	13-Feb-18	29-May-18			75,0d
A1220	Besluitvorming uitvoeringskrediet	13-Feb-18	29-May-18	RK	MPB	75,0d
A1330	Uitvoeringsbesluit		29-May-18			0,0d
2	**Ontwerpen**	03-Oct-17	24-Apr-18			145,0d
2.3	**Varianten onderzoek**	03-Oct-17	24-Oct-17			15,0d
A1160	Start ontwerp	03-Oct-17				0,0d
A1170	Varianten onderzoek	03-Oct-17	24-Oct-17	MM	TM	15,0d
2.4	**VO/Ref ontwerp**	24-Oct-17	16-Jan-18			60,0d
A1910	Start VO	24-Oct-17				0,0d
A1860	Uitzetten onderzoeken	24-Oct-17	07-Nov-17	MM	TM	10,0d
A1870	Analyseren resultaten	07-Nov-17	05-Dec-17	MM	TM	20,0d
A1880	Varianten uitwerken (SO)	07-Nov-17	05-Dec-17	MM	TM	20,0d
A1890	Opstellen ontwerptekeningen	05-Dec-17	16-Jan-18	MM	TM	30,0d
A1920	VO gereed		16-Jan-18			0,0d
2.5	**Opstellen BLVC Kader**	16-Jan-18	13-Feb-18			20,0d
A1200	Opstellen BLVC kader	16-Jan-18	13-Feb-18	BKr	OM	20,0d
2.6	**Verfieren VO/Bijstellen KES**	16-Jan-18	06-Feb-18			15,0d
A1190	Verfieren ontwerp/bijstellen KES	16-Jan-18	06-Feb-18	MM	TM	15,0d
2.7	**Nieuwe Klanteisen onderzoeken**	13-Feb-18	27-Feb-18			10,0d
A1230	Nieuwe klanteisen analyseren	13-Feb-18	27-Feb-18	MM	TM	10,0d
2.8	**DO opstellen**	27-Feb-18	27-Mar-18			20,0d
A1930	Start DO	27-Feb-18				0,0d
A1940	Uitzetten onderzoeken	27-Feb-18	06-Mar-18	MM	TM	5,0d
A1950	Risico analyse (sessie)	27-Feb-18	06-Mar-18	MM	TM	5,0d
A1240	Opstellen DO	27-Feb-18	27-Mar-18	MM	TM	20,0d
A1960	Analyseren resultaten	06-Mar-18	13-Mar-18	MM	TM	5,0d
A1980	Opstellen ontwerptekeningen	13-Mar-18	27-Mar-18	MM	TM	10,0d
A1990	DO gereed		27-Mar-18			0,0d
2.9	**Opstellen BLVC plan**	27-Mar-18	24-Apr-18			20,0d
A1260	Opstellen BLVC plan	27-Mar-18	24-Apr-18	BKr	OM	20,0d
2.10	**Verifieren DO**	27-Mar-18	24-Apr-18			20,0d
A1270	Verifieren ontwerp	27-Mar-18	24-Apr-18			20,0d
A1280	Ontwerp gereed		24-Apr-18			0,0d
3	**Procedures**	24-Oct-17	23-Nov-18			283,5d
3.1	**Aanvraag WABO vergunning**	27-Mar-18	17-Jul-18			80,0d
A1250	Aanvragen WABO vergunning	27-Mar-18	10-Apr-18	BKr	OM	10,0d
A1970	Vergunningstraject	10-Apr-18	05-Jun-18	BKr	OM	40,0d
A2000	Maximale verlening	05-Jun-18	17-Jul-18	BKr	OM	30,0d
3.2	**Review Tenderboard**	19-Jun-18	17-Jul-18			20,0d
A1300	Review bestek tenderboard	19-Jun-18	17-Jul-18	JB	CM	20,0d
A1340	Ontwerpfase gereed		17-Jul-18			0,0d
3.3	**Wenstrace procedure**	24-Oct-17	23-Nov-18			283,5d
A2010	Opstellen concept DTA	24-Oct-17	22-Nov-17	BKr	OM	21,5d
A2020	Opstellen brief 2 en verzamelen reacties	23-Nov-17	22-Dec-17	BKr	OM	21,5d
A2030	Opstellen DTA	27-Feb-18	28-Mar-18	BKr	OM	21,5d
A1420	DTA		28-Mar-18			0,0d
A1440	Voorbereidingstijd D&B	29-Mar-18	23-Nov-18	BKr	OM	172,0d
4	**Inkoop en aanbesteding**	24-Apr-18	19-Jun-18			40,0d
4.2	**Opstellen aanbestedingsdossier**	24-Apr-18	22-May-18			20,0d
A1290	Opstellen aanbestedingsdossier incl bestek	24-Apr-18	22-May-18	JB	CM	20,0d
4.3	**Verfieren aanbestedingsdossier**	22-May-18	19-Jun-18			20,0d
A1320	Verfieren aanbestedingsdossier	22-May-18	19-Jun-18	JB	CM	20,0d
Aanbesteding, gunning, uitvoering		17-Jul-18	07-Aug-20			538,5d
4	**Inkoop en aanbesteding**	17-Jul-18	29-Nov-18			96,8d
4.4	**Aanbesteding**	17-Jul-18	29-Nov-18			96,8d
A1360	Start aanbesteding	17-Jul-18				0,0d
A1350	Aanbesteding Europees niet openbaar	17-Jul-18	29-Nov-18	JB	CM	96,8d
A1370	Gunning		29-Nov-18			0,0d
5	**Realiseren**	26-Aug-19	07-Aug-20			250,0d
5.1	**Uitvoering**	26-Aug-19	07-Aug-20			250,0d
A1380	Start realisatiefase	26-Aug-19				0,0d
A1390	Uitvoering	26-Aug-19	07-Aug-20	MM	TM	250,0d
A1400	Gereed		07-Aug-20			0,0d
Raakvlakken		30-Jan-17	23-Aug-19			670,0d
8	**Raakvlak projecten**	30-Jan-17	23-Aug-19			670,0d
8.1	**Uitvoeren funderingsherstel belendingen**	30-Jan-17	23-Aug-19			670,0d
A2080	Uitvoering gereed	30-Jan-17	30-Jan-17			0,0d
A2040	Funderingsonderzoek	30-Jan-17	16-Jun-17			100,0d
A2050	Voorbereiding uitvoer	19-Jun-17	07-Sep-18			320,0d
A2060	Start uitvoer	10-Sep-18				0,0d
A2070	Uitvoering	10-Sep-18	23-Aug-19			250,0d

Printdatum07-Feb-17
Peildatum 07-Feb-17
Opmaak DN Walmuur JCM
Standaardplanning:

Vernieuwing walmuren Jacob Catskade en Marnixkade

Gemeente Amsterdam
