
Activiteit	Duration (planned)	Start	Finish
Maaiveld LV route & kruising	392	17-Jul-18 A	30-Jan-20
Voorbereiding	392	17-Jul-18 A	30-Jan-20
Besluitvorming	108	19-Jul-18 A	18-Dec-18
Overleg BM	0	03-Aug-18 A	
Besluit kruising verwerken in notitie/flap	10	03-Aug-18 A	16-Aug-18 A
Opstellen NVB + notitie monumenten	29	19-Jul-18 A	28-Aug-18 A
Stuurgroep overleg	0	05-Sep-18 A	
Aanleveren stukken (DO) tbv advisering SD-comm	0	03-Dec-18*	
Behandeling advies door SD-commissie	0	18-Dec-18*	
Onderzoeken	65	17-Jul-18 A	15-Oct-18 A
Offerte aanvraag tbv bodemonderzoek	20	17-Jul-18 A	13-Aug-18 A
Beoordelen geleverde offerte	5	14-Aug-18 A	20-Aug-18 A
Opdracht	0	21-Aug-18 A	
Uitvoeren onderzoek	30	21-Aug-18 A	01-Oct-18 A
Leveren rapportage	10	02-Oct-18 A	15-Oct-18 A
Technisch DO	78	03-Aug-18 A	21-Nov-18 A
DO maaiveld	78	03-Aug-18 A	21-Nov-18 A
Opstellen DO	40	03-Aug-18 A	27-Sep-18 A
Schets aansluiting gereed	0		17-Aug-18 A
Aanleveren ontwerp tbv CVC behandeling	0	20-Sep-18 A	
CVC behandeling	0	02-Oct-18 A	
Concept DO	0		02-Oct-18 A
Review DO	5	02-Oct-18 A	08-Oct-18 A
Verwerken opmerkingen	5	09-Oct-18 A	15-Oct-18 A
Technisch DO vastgesteld	0		21-Nov-18 A
Vergunningen & procedures	257	20-Aug-18 A	23-Aug-19
Monumenten	257	20-Aug-18 A	23-Aug-19
Kwalificatie toets op schets door BMA	90	20-Aug-18 A	21-Dec-18
Aanvraag omgevingsvergunning monumenten	130	07-Jan-19	12-Jul-19
Vergunning verleend	0	15-Jul-19	
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	15-Jul-19	23-Aug-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		23-Aug-19
Omgevingswet Bouwen	70	07-Jan-19	12-Apr-19
Aanvraag omgevingsvergunning tbv bouwen	40	07-Jan-19*	01-Mar-19
Vergunning verleend	0	04-Mar-19	
1e Bezwarenterijn conform AWB	30	04-Mar-19	12-Apr-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		12-Apr-19
Omgevingswet Bomenkap	70	14-Jan-19	23-Apr-19
Aanvraag Omgevingsverguning tbv kappen	40	14-Jan-19*	08-Mar-19
Vergunning verleend	0	11-Mar-19	
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	11-Mar-19	23-Apr-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		23-Apr-19
Waterwet	70	07-Jan-19	12-Apr-19
Aanvraag watervergunning (keurontheffing)	40	07-Jan-19*	01-Mar-19
Vergunning verleend	0	04-Mar-19	
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	04-Mar-19	12-Apr-19
Vergunning onherroepelijk bij geen bezwaar	0		12-Apr-19
ProRail	75	14-Jan-19	02-May-19
Aanvraag vergunning ProRail	45	14-Jan-19*	15-Mar-19
Vergunning verleend	0		15-Mar-19
1e Bezwarentermijn conform AWB	30	18-Mar-19	30-Apr-19
Vergunnging onherroepelijk bij geen bezwaar	0	02-May-19	
BLVC	152	20-Sep-18 A	26-Apr-19
Aanleveren tbv CVC vooroverleg	0	20-Sep-18 A	
Behandeling CVC	0	02-Oct-18 A	
Opstellen BLVC-kader	40	14-Jan-19*	08-Mar-19
Vooroverleg WBB	20	11-Mar-19	05-Apr-19
Verwerken opmerkingen	5	08-Apr-19	12-Apr-19
Aanleveren tbv WWU	8	15-Apr-19	26-Apr-19
Behandeling WWU	0		26-Apr-19*
BLVC-kader definitief	0		26-Apr-19
Wenstracé	272	14-Aug-18 A	10-Sep-19
Wenstracé procedure	60	14-Aug-18 A	14-Feb-19
Akkoord wenstracé	10	15-Feb-19	28-Feb-19
DTA	0	01-Mar-19	
Voorbereiding K&L bedrijven	132	01-Mar-19	09-Sep-19
Vroegste start uitvoering K&L	0	10-Sep-19	
Inkoopstrategie	20	07-Jan-19	04-Feb-19
Opstellen inkoopstrategie	20	07-Jan-19*	01-Feb-19
Inkoopplan gereed	0	04-Feb-19	
Bestek	70	04-Feb-19	15-May-19
maaiveld	70	04-Feb-19	15-May-19
Opstellen bestek	40	04-Feb-19*	29-Mar-19
Concept bestek gereed	0		29-Mar-19
Interne review bestek	5	01-Apr-19	05-Apr-19
Verwerken opmerkingen	5	08-Apr-19	12-Apr-19
Bestek naar OG	5	15-Apr-19	23-Apr-19
Verwerken opmerkingen van OG	5	24-Apr-19	30-Apr-19
Definitief bestek	0		30-Apr-19
Bestek naar ABT (check, registratie & upload)	10	02-May-19	15-May-19
Nationale openbare aanbesteding (maaiveld)	43	16-May-19	18-Jul-19
Inschrijving/Aanbesteding	20	16-May-19	14-Jun-19
Bestek op tendernet & start tender	0	16-May-19	

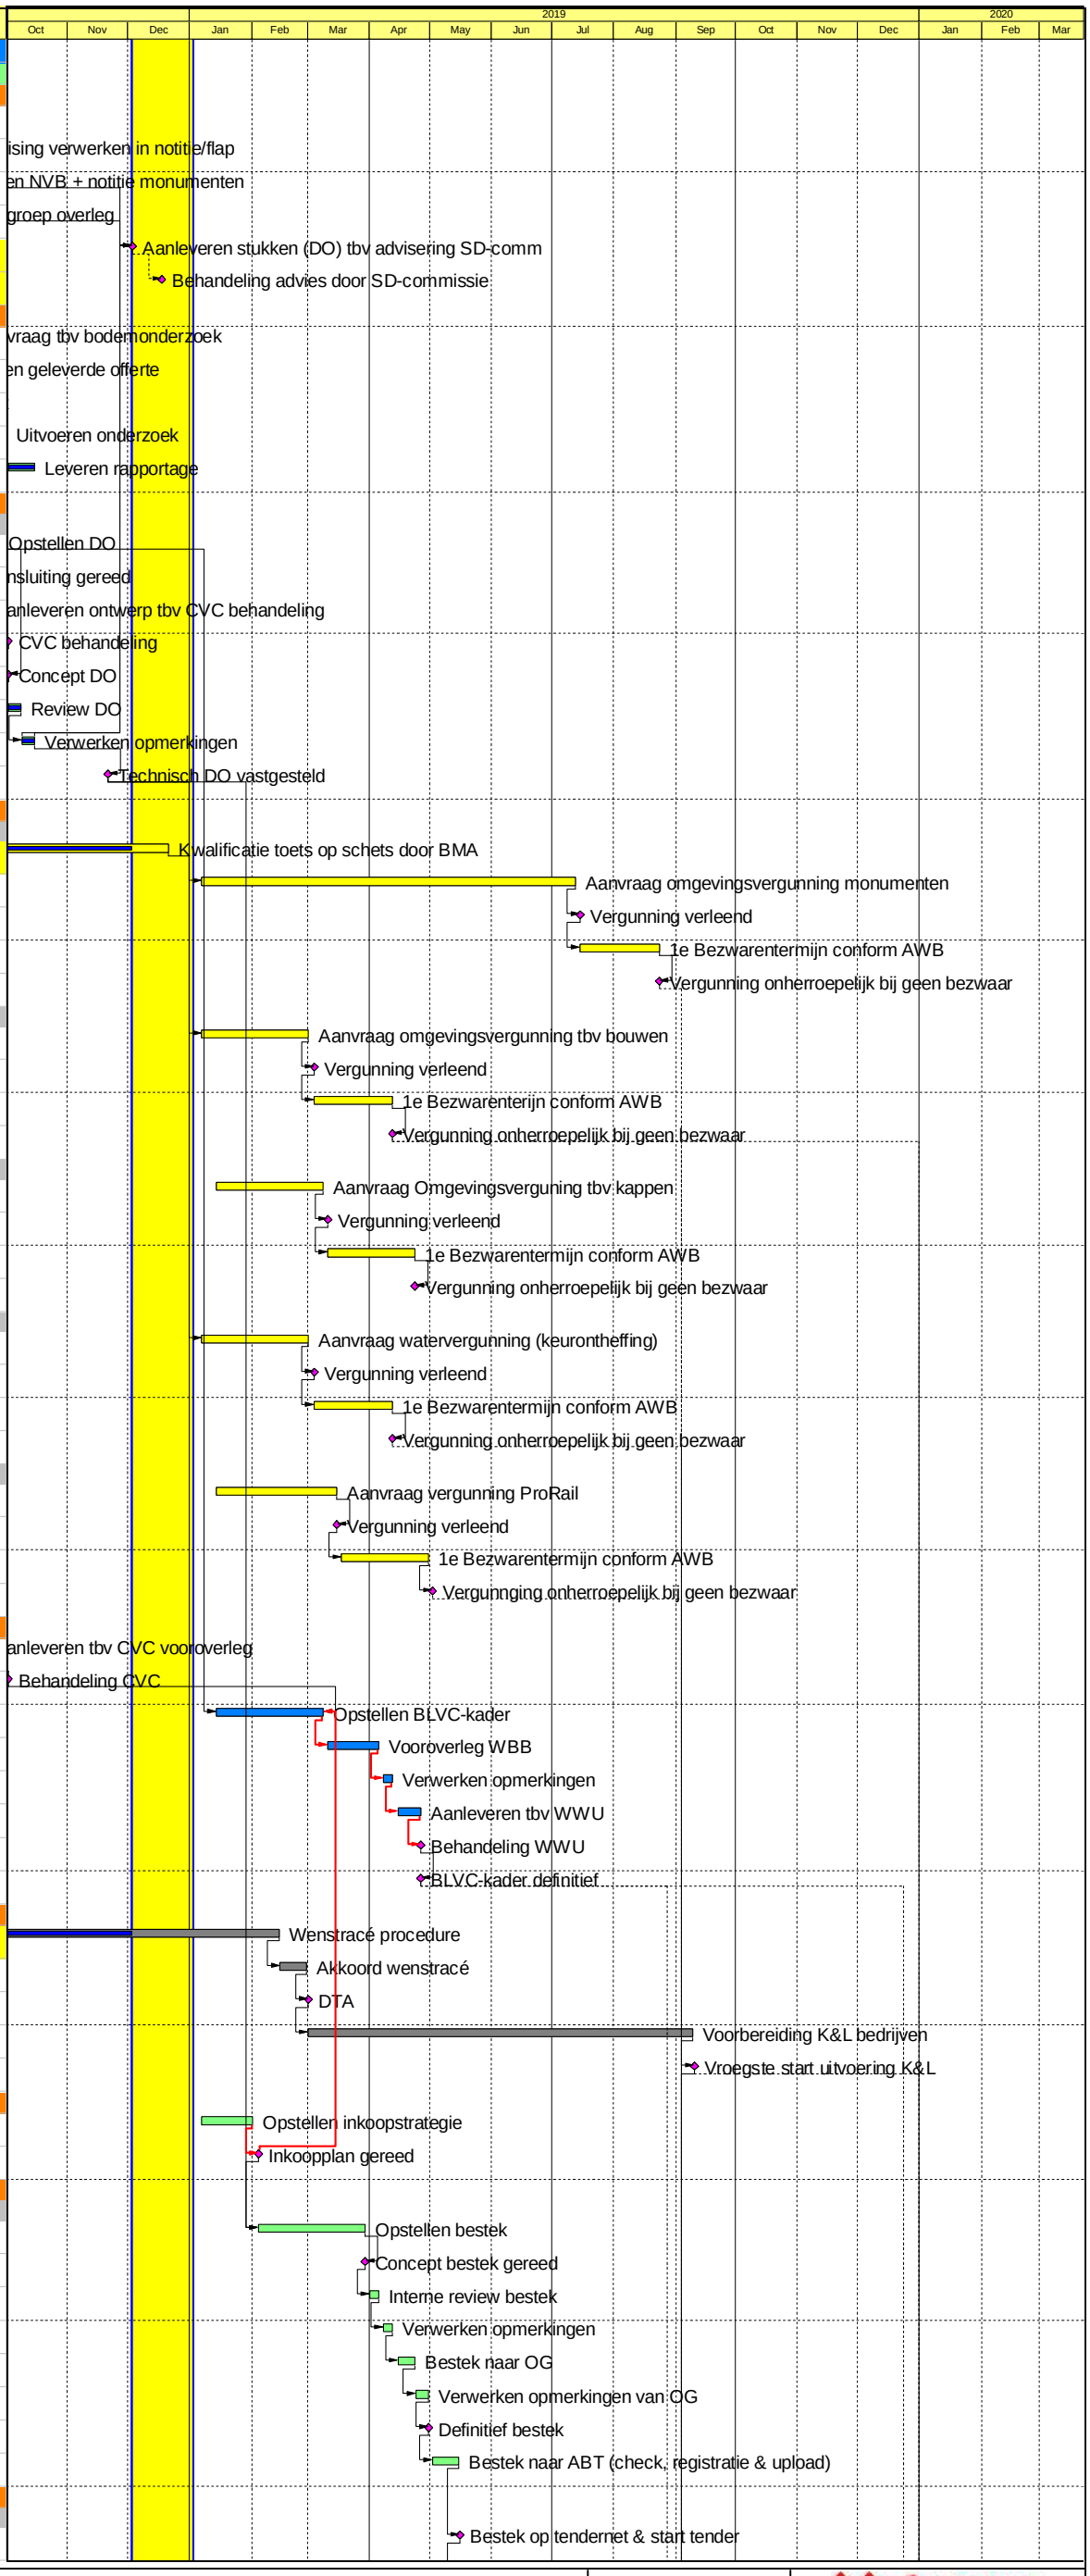

Printdatum: 03-Dec-18
Peildatum: 03-Dec-18
Naam planning: Dijksgracht-Oost fietsroute
Layout: Dijksgracht-Oost
Planningsadviseur: 5.1, 2, e

Versie: 03-Dec-18

Pagina: 1 van 2


Planning
Fietsroute Dijksgracht-Oost

Voorlopig

Ter informatie

Gemeente Amsterdam

Activiteit	Duration (planned)	Start	Finish
Termijn tbv inschrijving (in kalenderdagen)	30	16-May-19	14-Jun-19
Sluiting periode tbv stellen vragen	0		28-May-19
Opstellen nota van inlichtingen	5	29-May-19	05-Jun-19
Nvl naar ABT	2	06-Jun-19	07-Jun-19
Nota van inlichtingen beschikbaar (in kalenderdagen)	6	09-Jun-19	14-Jun-19
Inschrijving / Aanbesteding	0		14-Jun-19
Gunning	23	17-Jun-19	18-Jul-19
Beoordelen inschrijvingen	5	17-Jun-19	21-Jun-19
Openen digitale kluis (inschrijfstaten bekend)	0	24-Jun-19	
Opstellen gunningsadvies	2	24-Jun-19	25-Jun-19
gunningsadvies gereed	0		25-Jun-19
Behandeling advies door leadbuyer	2	26-Jun-19	27-Jun-19
Behandeling advies door OG	3	28-Jun-19	02-Jul-19
Gunningsbesluit	0		02-Jul-19
Publicatie gunningsbeslissing	0	03-Jul-19	
Stand still periode (in kalenderdagen)	10	04-Jul-19	17-Jul-19
Schriftelijke opdracht conform AUV	0	18-Jul-19	
Start contract beheerfase	0	18-Jul-19	
Contract beheerfase	138	18-Jul-19	30-Jan-20
Maaiveld inrichting	138	18-Jul-19	30-Jan-20
Voorbereiding door opdrachtnemer	30	18-Jul-19	28-Aug-19
Aanvraag WIOR vergunning	5	03-Sep-19	09-Sep-19
Start uitvoering (GSU)	0	10-Sep-19	
Uitvoering constructie aansluiting brug	100	10-Sep-19	30-Jan-20
GEU	0		30-Jan-20
Steigers	264	29-Mar-19	15-Apr-20
Voorbereiding	120	29-Mar-19	19-Sep-19
Besluitvorming	0	29-Mar-19	29-Mar-19
Besluit nachtparkeren rondvaartboten (weth)	0	29-Mar-19*	
Ontwerp	50	29-Mar-19	13-Jun-19
DO steigers	50	29-Mar-19	13-Jun-19
Opstellen technisch DO steigers	40	29-Mar-19	28-May-19
Concept TDO steigers	0		28-May-19
Review TDO	5	29-May-19	05-Jun-19
Verwerken opmerkingen	5	06-Jun-19	13-Jun-19
Technisch DO steigers vastgesteld	0		13-Jun-19
Vergunningen	70	14-Jun-19	19-Sep-19
Procedure omgevingsvergunning	40	14-Jun-19	08-Aug-19
Vergunning verleend	0	09-Aug-19	
1e bezwarentermijn conform AWB	30	09-Aug-19	19-Sep-19
Procedure watervergunning	40	14-Jun-19	08-Aug-19
Vergunning verleend	0	09-Aug-19	
1e bezwarentermijn conform AWB	30	09-Aug-19	19-Sep-19
Bestek steigers	70	14-Jun-19	19-Sep-19
Opstellen bestek steigers	40	14-Jun-19	08-Aug-19
Concept bestek steigers gereed	0		08-Aug-19
Interne review bestekdeel	5	09-Aug-19	15-Aug-19
Verwerken opmerkingen	5	16-Aug-19	22-Aug-19
Concept bestek naar OG	5	23-Aug-19	29-Aug-19
Verwerken opmerkingen	5	30-Aug-19	05-Sep-19
Bestek definitief	0		05-Sep-19
Bestek naar ABT (check, registratie & upload)	10	06-Sep-19	19-Sep-19
Nationale openbare aanbesteding (steigers)	44	20-Sep-19	21-Nov-19
Inschrijving/Aanbesteding	21	20-Sep-19	21-Oct-19
Bestek op tendernet & start tender	0	20-Sep-19	
Termijn tbv inschrijving (in kalenderdagen)	30	20-Sep-19	19-Oct-19
Sluiting periode tbv stellen vragen	0		03-Oct-19
Opstellen nota van inlichtingen	5	04-Oct-19	10-Oct-19
Nvl naar ABT	2	11-Oct-19	14-Oct-19
Nota van inlichtingen beschikbaar (in kalenderdagen)	6	15-Oct-19	20-Oct-19
Inschrijving / Aanbesteding	0		21-Oct-19
Gunning	23	21-Oct-19	21-Nov-19
Beoordelen inschrijvingen	5	21-Oct-19	25-Oct-19
Openen digitale kluis (inschrijfstaten bekend)	0	28-Oct-19	
Opstellen gunningsadvies	2	28-Oct-19	29-Oct-19
gunningsadvies gereed	0		29-Oct-19
Behandeling advies door leadbuyer	2	30-Oct-19	31-Oct-19
Behandeling advies door OG	3	01-Nov-19	05-Nov-19
Gunningsbesluit	0		05-Nov-19
Publicatie gunningsbeslissing	0	06-Nov-19	
Alcatel arrest / stand still periode (in kalenderdagen)	10	07-Nov-19	20-Nov-19
Schriftelijke opdracht conform AUV	0	21-Nov-19	
Start contract beheerfase	0	21-Nov-19	
Contractrealisatie	100	21-Nov-19	15-Apr-20
Steigers	100	21-Nov-19	15-Apr-20
Voorbereiding	30	21-Nov-19	06-Jan-20
Voorbereiding door opdrachtnemer	30	21-Nov-19	06-Jan-20
Aanvraag WIOR vergunning	5	30-Dec-19	06-Jan-20
Uitvoering steigers	70	07-Jan-20	15-Apr-20
Start uitvoering (GSU)	0	07-Jan-20	
Uitvoering steigerconstructies	70	07-Jan-20	15-Apr-20
GEU	0		15-Apr-20

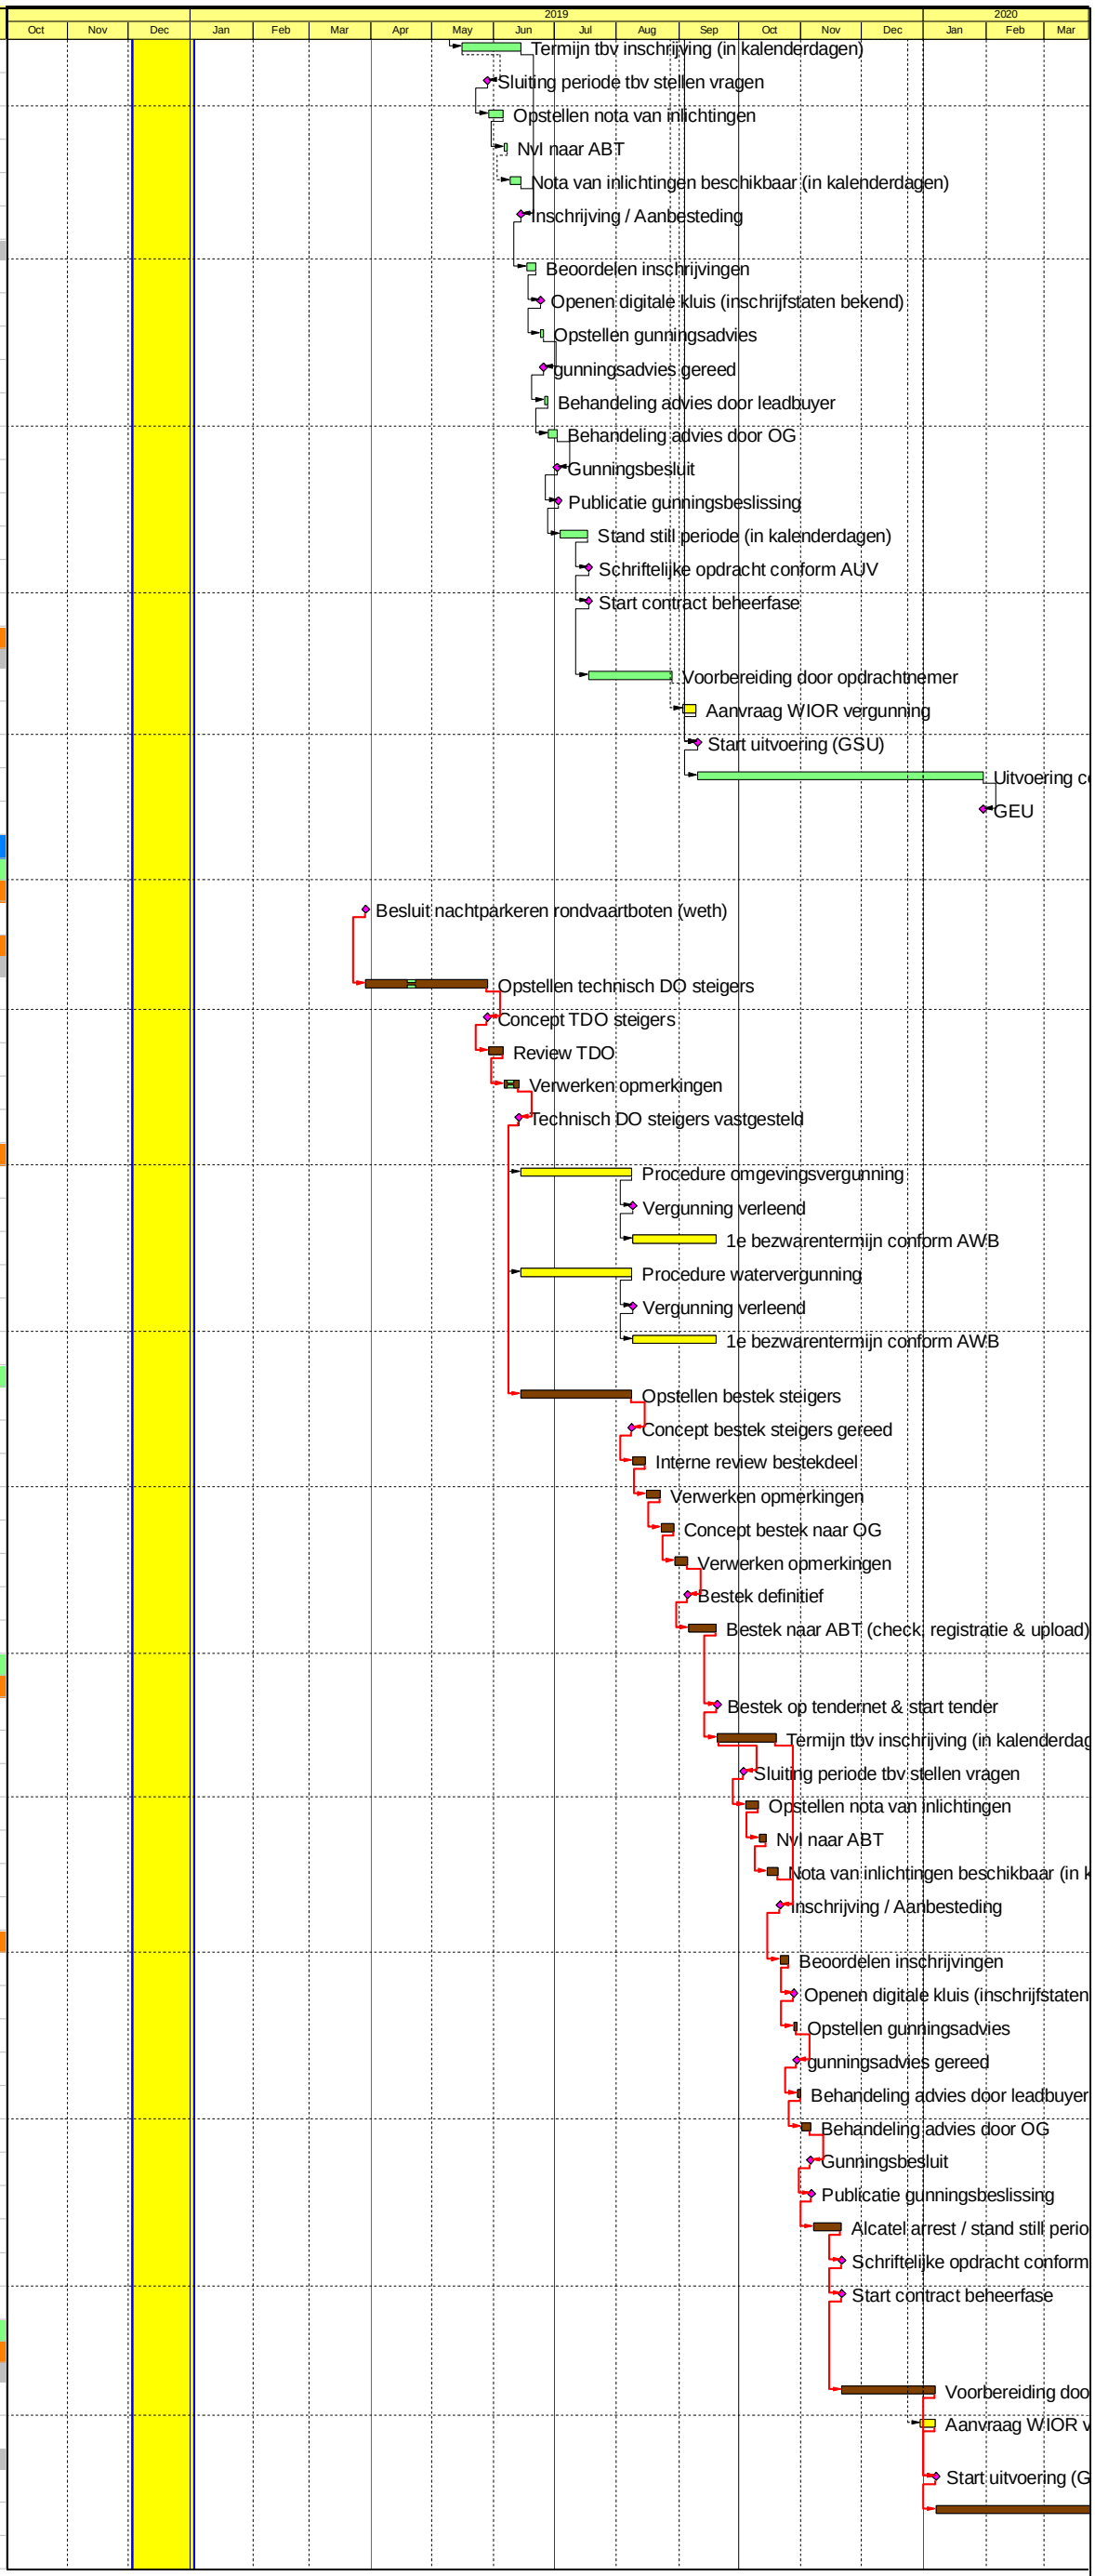

Printdatum: 03-Dec-18
Peildatum: 03-Dec-18
Naam planning: Dijksgracht-Oost fietsroute
Layout: Dijksgracht-Oost
Planningsadviseur: 5.1, 2, e

Versie: 03-Dec-18

Planning
Fietsroute Dijksgracht-Oost

Voorlopig

Ter informatie

Gemeente Amsterdam
