
Activity Name	Start	Duur <T>	Finish
Ontwikkellocaties G&O Noord	03-01-22 A	894	30-05-25
Meidoornweg	03-01-22 A	894	30-05-25
Participatie	01-02-22 A	435	02-10-23
Projectteam Meidoornweg	01-02-22 A	435	02-10-23
Participatie deel II - kavelpaspoort	01-02-22 A	42	06-04-22
Participatie deel III - maaiveldontwerp	01-08-23	45	02-10-23
Kavelpaspoort / Bouwenvelop	03-01-22 A	87	03-05-22
Projectteam Meidoornweg	03-01-22 A	86	02-05-22
Afronden concept kavelpaspoort	03-01-22 A	30	13-04-22
Bespreking kavelpaspoort in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit		0	16-03-22*
Bespreking kavelpaspoort in Kwaliteitstafel R&D		0	31-03-22*
Beoordeling van het kavelpaspoort door de TAC		0	13-04-22*
Afronden kavelpaspoort voor vaststelling	14-04-22	5	20-04-22
Aanleveren stukken DB voor vaststelling definitief kavelpaspoort		0	20-04-22
Risicosessie		0	02-05-22*
Stadsdeelbestuur Noord	21-04-22	9	03-05-22
Vaststelling DB	21-04-22	3	25-04-22
Staf		0	25-04-22
Vaststellen definitief kavelpaspoort door DB stadsdeel		0	03-05-22
GREX	04-05-22	130	01-11-22
Projectteam Meidoornweg	04-05-22	130	01-11-22
Opstellen/afronden/afstemmen GREX	04-05-22	65	02-08-22
Vaststellen GREX (via raad?)	03-08-22	65	01-11-22
Juridisch Planologisch Kader	04-05-22	259	01-05-23
Projectteam Meidoornweg	04-05-22	194	30-01-23
Akoestisch onderzoek	04-05-22	30	14-06-22
Afronden conceptontwerp bestemmingsplan	15-06-22	15	05-07-22
311-termijn	03-08-22	30	13-09-22
Opstellen nota vooroverleg (mits bijvoorbeeld TAVGA vooraf al akkoord)	14-09-22	10	27-09-22
Opstellen NvB zienswijzen	13-12-22	15	02-01-23
Verwerken in bestemmingsplan	03-01-23	20	30-01-23
Gemeente Amsterdam	06-07-22	214	01-05-23
Besluitvorming vrijgave 311	06-07-22	20	02-08-22
College geeft vrij voor 311		0	02-08-22
Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan college	28-09-22	20	25-10-22
Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan door college (ntd)		0	25-10-22
Vaststellen bestemmingsplan (ntd obv besluitvorming 22)	31-01-23	65	01-05-23
Bestemmingsplan vastgesteld		0	01-05-23
Tervisielegging	01-11-22	30	12-12-22
TVL - gecoordineerd met bouwaanvraag	01-11-22	30	12-12-22
Maaiveldontwerp	02-05-23	435	30-12-24
Projectteam Meidoornweg	02-05-23	435	30-12-24
Afronden concept maaiveldontwerp	02-05-23	65	31-07-23
Afronden en vaststellen maaiveldontwerp	03-10-23	65	01-01-24
Voorbereiden maaiveldinrichting	02-01-24	260	30-12-24

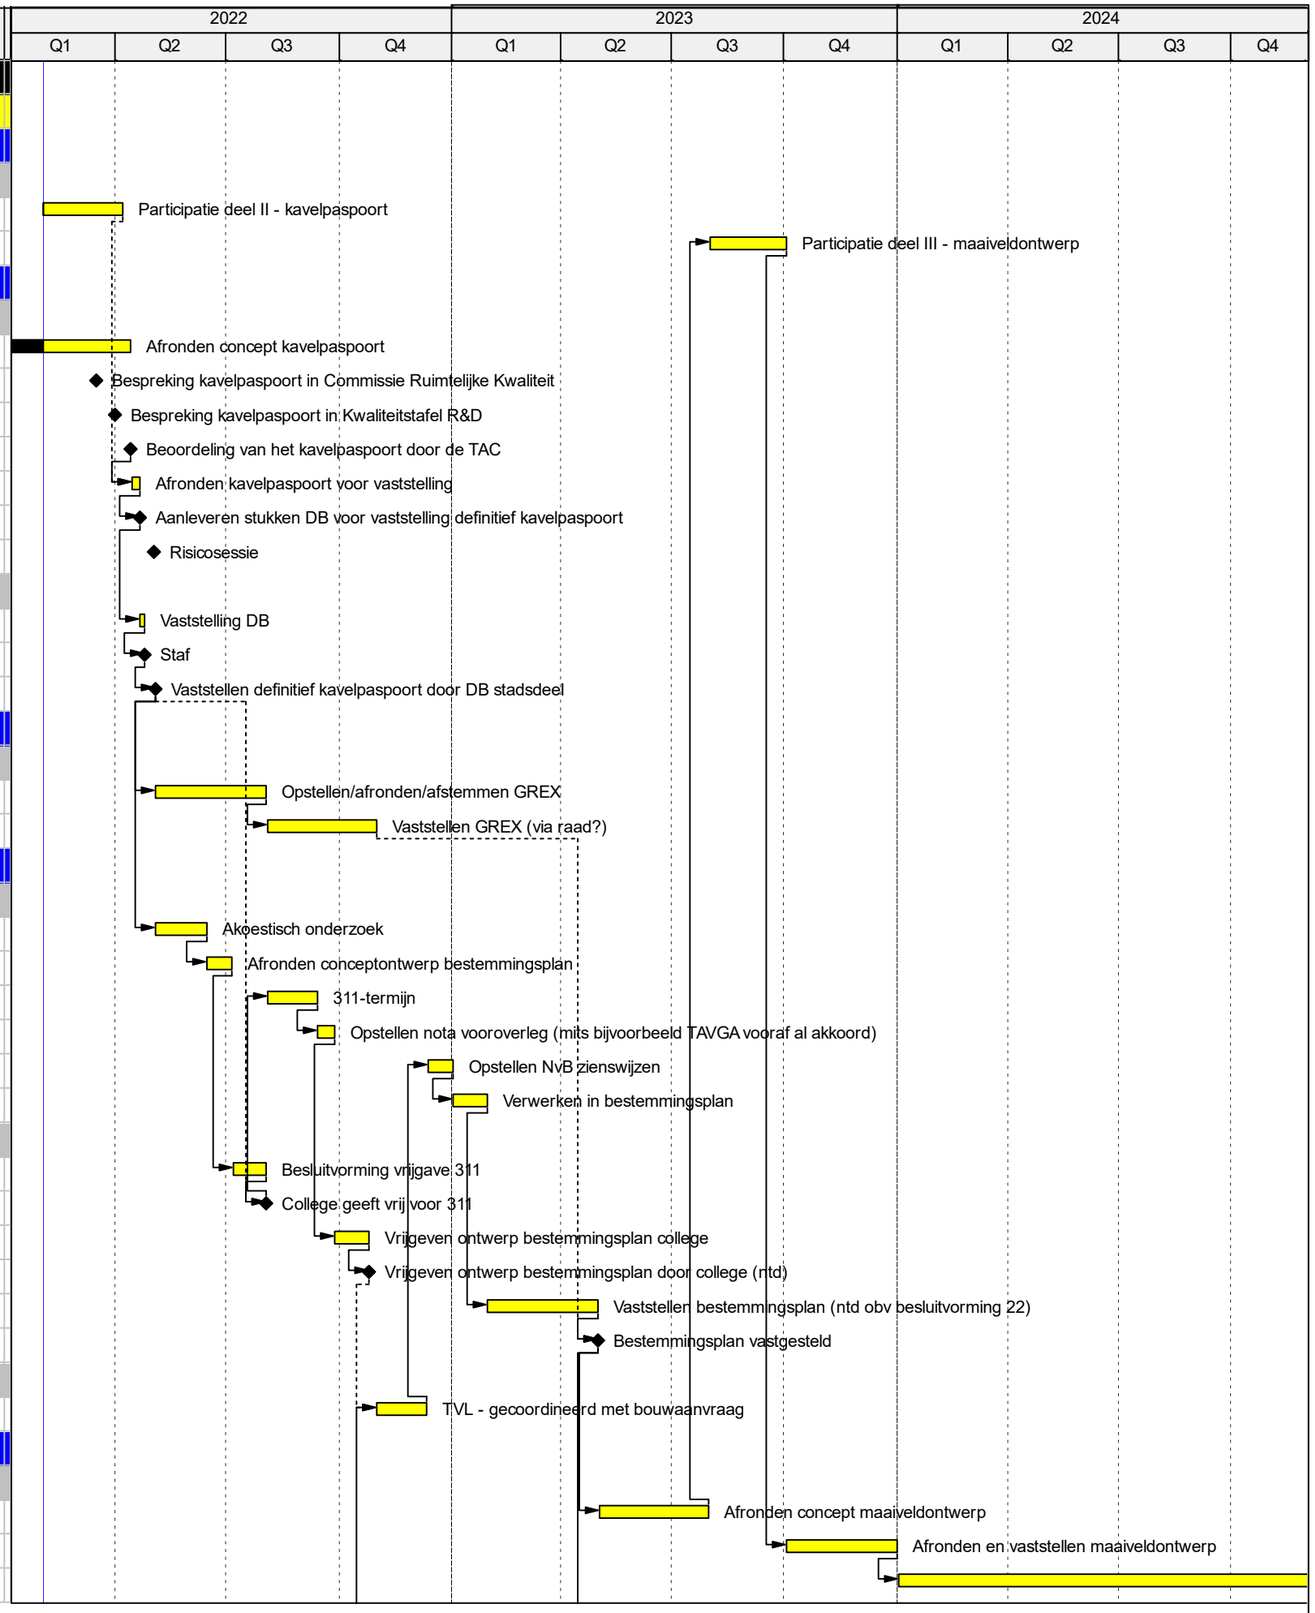


Remaining Level of Effort
Remaining Work
Actual Work
Critical Remaining Work

Meidoornweg
Concept projectplanning

Planningsadvies PMB: Th. Brouwer
printdatum: 23-03-22

Activity Name	Start	Duur <T>	Finish
VO-school	03-01-22 A	730	14-10-24
Projectteam Meidoornweg	23-08-22	156	28-03-23
Toetsen DO	23-08-22	30	03-10-22
DO goedgekeurd	04-10-22	0	
Bouwrijpmaken - K&L en bomen	01-03-23*	20	28-03-23
Coordinatieregeling	31-10-22	160	12-06-23
Ontwerpbeschikking bouwaanvraag (bij coordregeling)		0	31-10-22
Besluit omgevingsvergunning (bij coordregeling)		0	01-05-23
Bezwaartermijn	02-05-23	30	12-06-23
Gemeente Amsterdam	04-10-22	20	31-10-22
Behandeling bouwaanvraag	04-10-22	20	31-10-22
VOVA	03-01-22 A	730	14-10-24
Afronden VO	03-01-22 A	0	29-04-22
Opstellen DO	02-05-22	81	22-08-22
DO gereed voor omgevingsvergunning		0	04-10-22
Technisch ontwerp / uitvoeringsontwerp en werkvoorbereiding	04-10-22	160	15-05-23
Sloopwerk	01-11-22*	65	30-01-23
Start realisatie	16-05-23	0	
Realisatie tot start woonrijpmaken (ntd)	16-05-23	370	14-10-24
Sporthal	21-02-22	855	30-05-25
Sport & Bos; planning dd 10022022	21-02-22	855	30-05-25
Architectenselectie, PvE en financiering	21-02-22*	100	08-07-22
VO	11-07-22	125	30-12-22
DO	02-01-23	110	02-06-23
Behandeling bouwaanvraag	05-06-23	70	08-09-23
Bestek	05-06-23	75	15-09-23
Aanbesteding en gunning	18-09-23	165	03-05-24
Realisatie	06-05-24	280	30-05-25
PO-school	21-02-22	855	30-05-25
Planning PO-school V4 dd. 25 augustus 2021	21-02-22	855	30-05-25
Architectenselectie en SO	21-02-22*	160	30-09-22
VO	03-10-22	55	16-12-22
DO	19-12-22	90	21-04-23
Bestek	24-04-23	75	04-08-23
Aanbesteding en gunning	07-08-23	60	27-10-23
Realisatie	30-10-23	415	30-05-25
Woonrijpmaken	31-12-24	65	31-03-25
Projectteam Meidoornweg	31-12-24	65	31-03-25
Realisatie woonrijpmaken	31-12-24	65	31-03-25

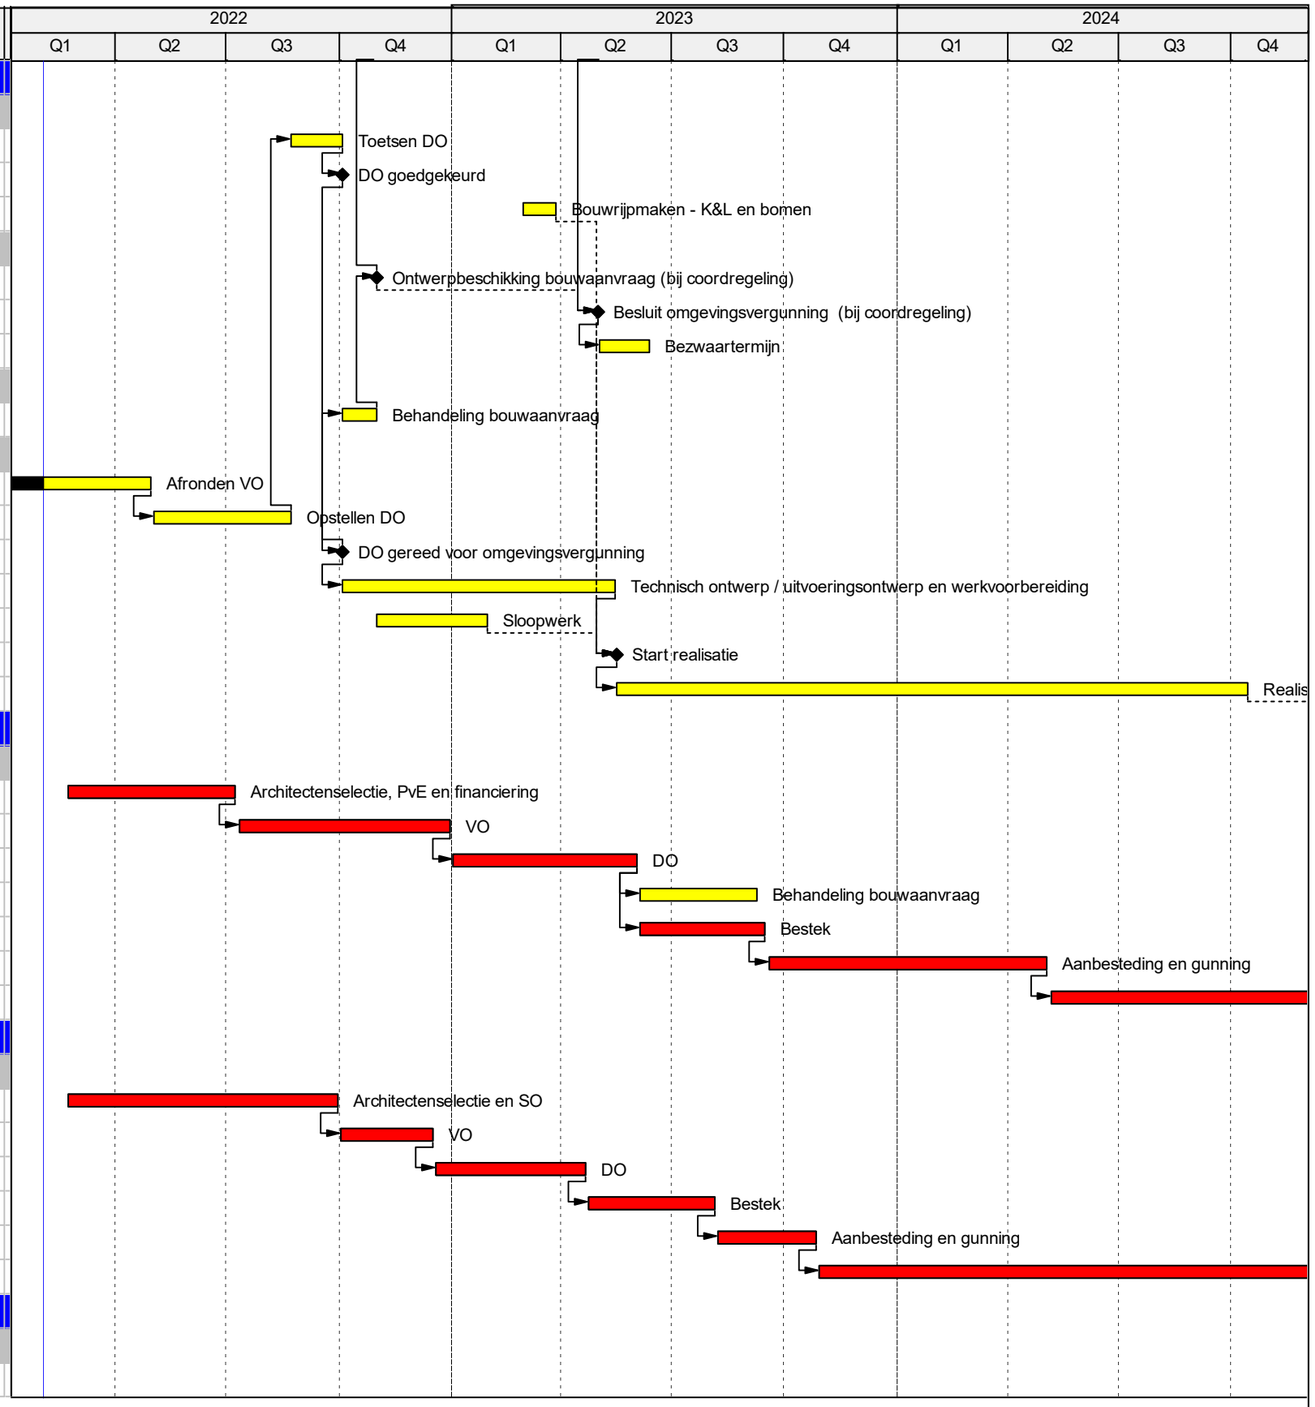

Remaining Level of Effort
Remaining Work
Actual Work
Critical Remaining Work

Meidoornweg
Concept projectplanning

Planningsadvies PMB: Th. Brouwer
printdatum: 23-03-22
