[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 15:36
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: verzoek planaanpassing/aanvulling OLO-3583061 (6 padelbanen Koenenkade 6-8)

Urgentie: Hoog

Geachte [redacted],

Onze deskundige adviseur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft beoordeeld dat de constructieve veiligheid niet voldoet en dat de aanvraag hierom gewegerd moet worden.

Bij deze krijgt u alsnog de gelegenheid om uw project conform hieronder genoemde advies van de constructeur aan te passen en via 1 week na de verzending van deze e-mail via omgevingsloket in te dienen en deze aan mij per e-mail te bevestigen.

** Voor inhoudelijke vragen over dit advies u kunt contact opnemen met [redacted] van OD NZKG, bereikbaar via [redacted]

Advies van de Constructeur:

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:
Projectlocatie: Koenenkade 6-8, 1081 KH Amsterdam (Buitenveldert)
Projectomschrijving: 6 padeelbanen aan de Koenenkade 6-8
Aanvraagnummer: OLO-3583061

In het kader van dit verzoek hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit. Na toetsing van de aangeleverde gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties zijn wij tot de conclusie gekomen dat het onvoldoende aannemelijk is dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012: Onvoldoende aannemelijk in verband met de volgende opmerkingen/vragen:
• Aangetoond dient te worden dat de glasconstructie de vervorming van de draagconstructie en de gebruiksbelastingen kunnen opnemen.
Wij adviseren de aanvraag te weigeren.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 1

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**				
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	2	2	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet
1.4	Constructieberekening "Stalconstructie Padelbaan Amsterdam, Panoramic Padelbaan", werknummer 18085	2	2	Opmerkingen	Voldoet niet
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**				
3.1	Staalconstructie	2	2	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet
5.	**Onderdeel 3: Elementen die bij bezwijken geen voortschrijdende instorting tot gevolg hebben**				
5.1	Glasconstructie	2	2	Aangetoond dient te worden dat de glasconstructie de vervorming van de draagconstructie en de gebruiksbelastingen kunnen opnemen	Ontbreekt
	Conclusie	: Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.			

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen Bouw

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)
Team Vergunningen Bouw

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid

T. [redacted]
E. [redacted]

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
www.zuid.amsterdam.nl

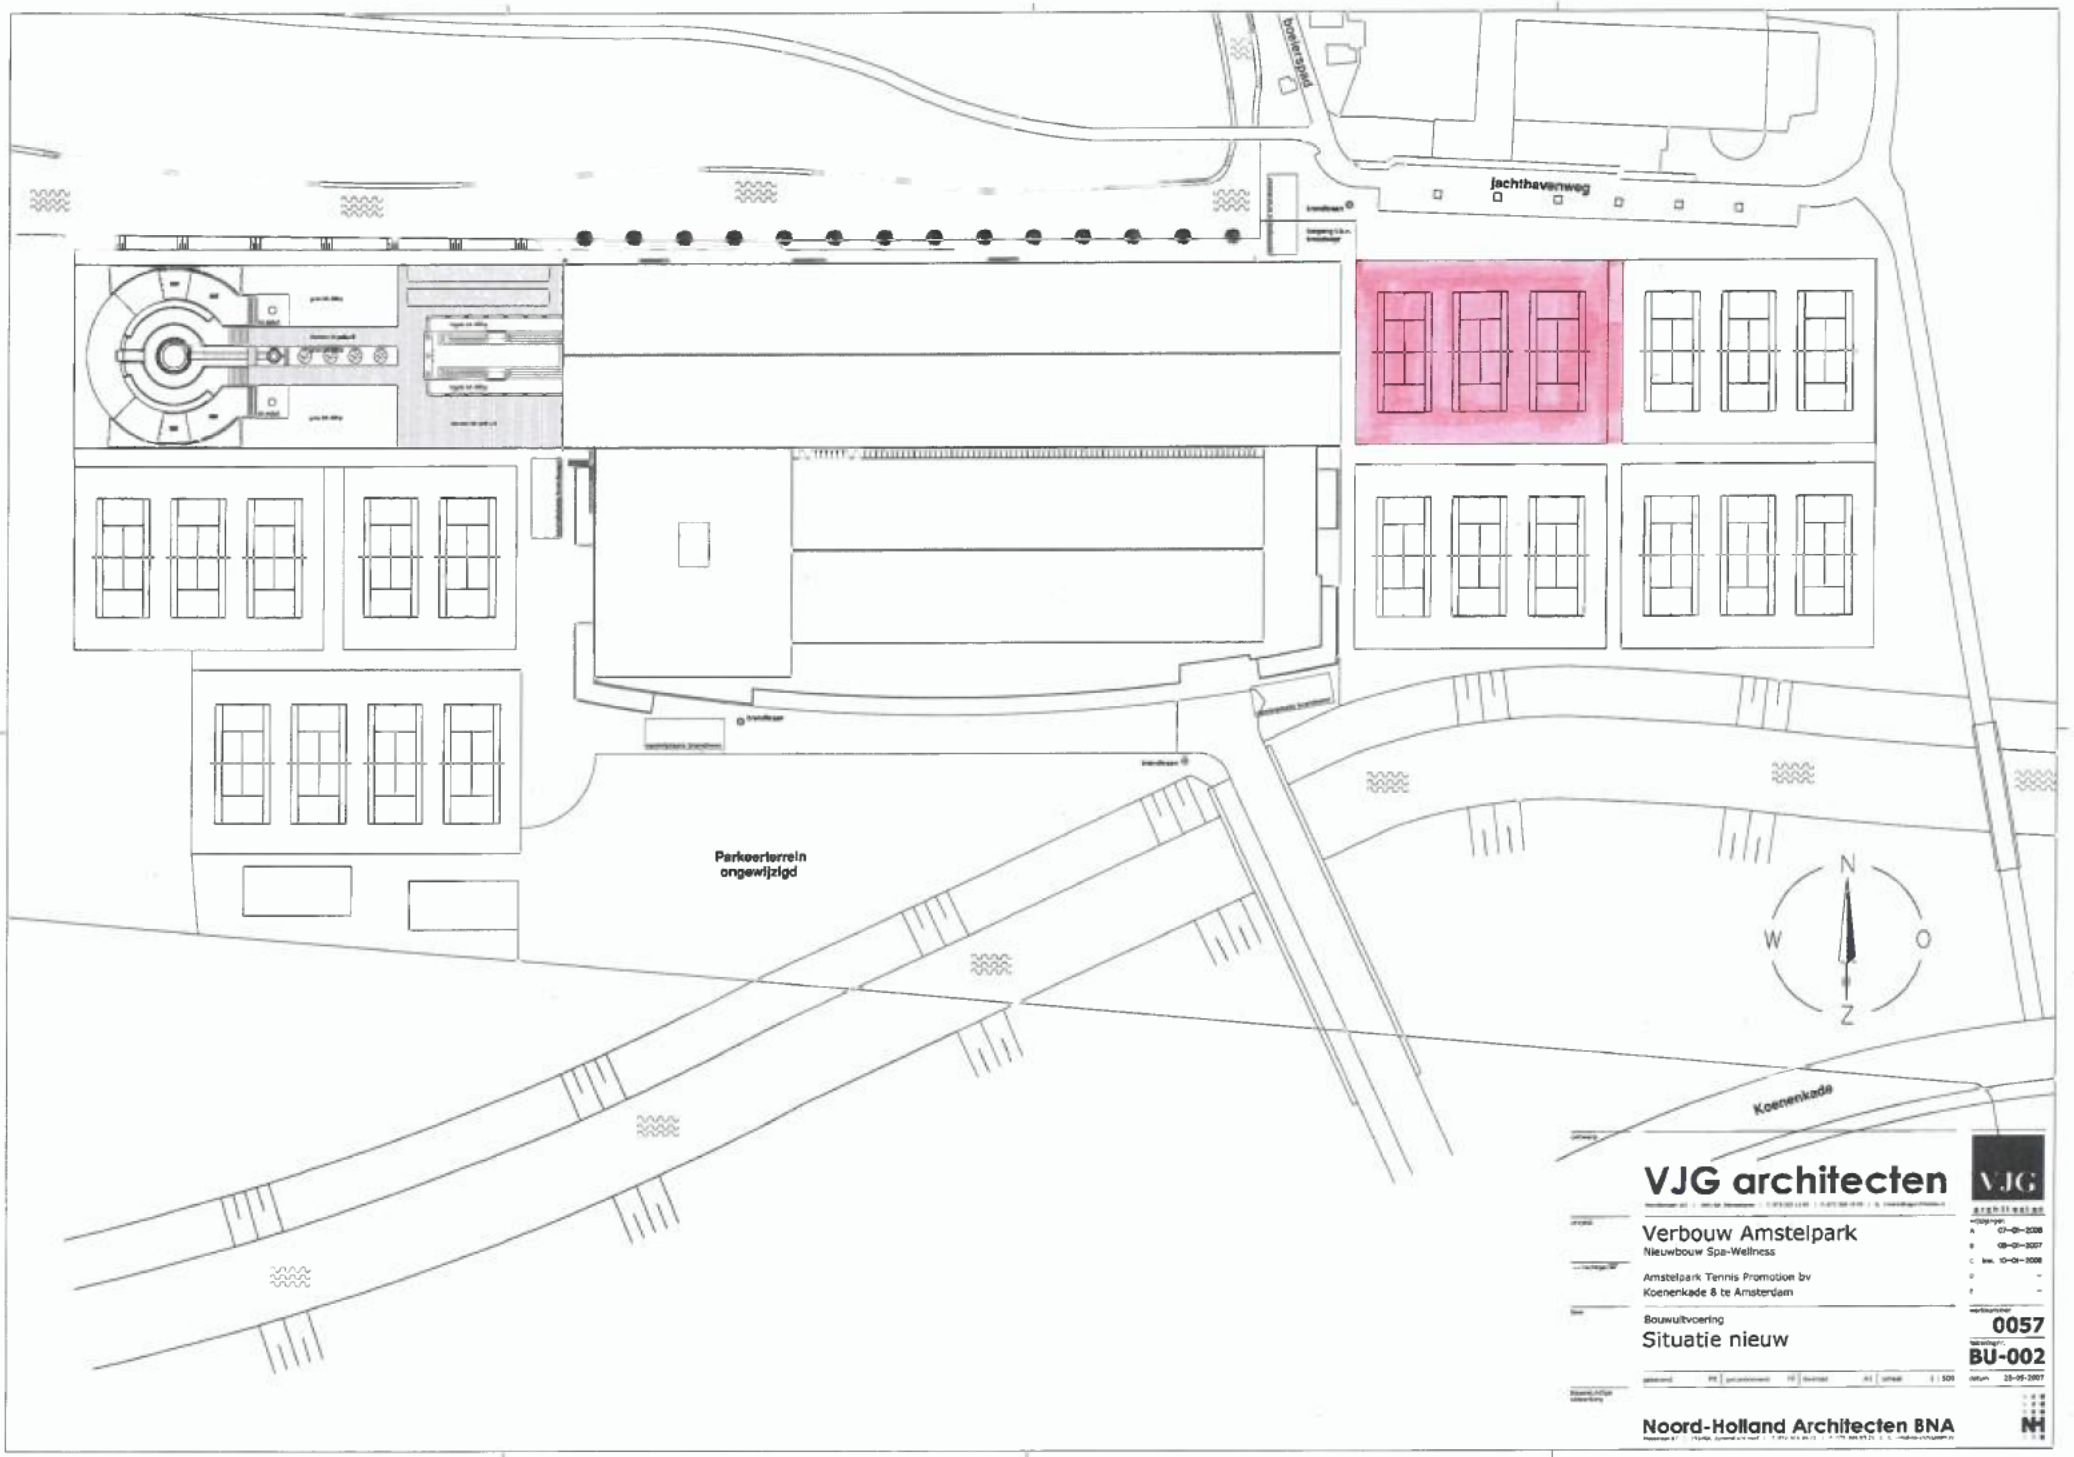

boeierspad
jachthavenweg
Parkeerterrein
ongewijzigd
Koenenkade
N
W
O
Z
VJG architecten
Verbouw Amstelpark
Nieuwbouw Spa-Wellness
Amstelpark Tennis Promotion bv
Koenenkade 8 te Amsterdam
Bouwuitvoering
Situatie nieuw
0057
BU-002
Noord-Holland Architecten BNA
