
Activity ID	Activiteit	Start	Finish	duration	Ver
Bouwprotocol van toepassing; funderingshestel niet noodzakelijk		07-Feb-17	07-Dec-22	1521,5d	
Verzakkingsmetingen volgens bouwprotocol		07-Feb-17	22-Dec-21	1271,5d	
A1150	Aanbesteden plaatsen meetbouten	07-Feb-17	08-Mar-17	21,5d	
A1160	Meten zakkingsnelheid dmv hoogtemetingen	08-Mar-17	06-Feb-19	500,0d	
A1170	Zakking is nihil, minder dan 2mm / jaar > Geen funderingshestel		06-Feb-19	0,0d	
A1180	Verzakkingsmeting tbv 0 meting	06-Feb-19	22-Dec-21	750,0d	
A1190	0 meting	22-Dec-21		0,0d	
Uitvoeren walmuur vernieuwing beide kades		13-May-20	07-Dec-22	670,0d	
A1250	Voorbereidingsfase	13-May-20	13-Jan-21	175,0d	
A1240	Ontwerpfase	13-Jan-21	04-Aug-21	145,0d	
A1230	Aanbesteding	04-Aug-21	22-Dec-21	100,0d	
A1200	GSU	22-Dec-21		0,0d	
A1210	Uitvoering	22-Dec-21	07-Dec-22	250,0d	
A1220	GEU		07-Dec-22	0,0d	
Bouwprotocol van toepassing op één kade, inclusief funderingsherstel		07-Feb-17	07-Dec-22	1521,5d	
Verzakkingsmetingen volgens bouwprotocol		07-Feb-17	22-Dec-21	1271,5d	
A1270	Aanbesteden plaatsen meetbouten	07-Feb-17	08-Mar-17	21,5d	
A1280	Meten zakkingsnelheid dmv hoogtemetingen	08-Mar-17	06-Feb-19	500,0d	
A1290	Zakking is matig tot groot, >3mm per jaar		06-Feb-19	0,0d	
A1300	Verzakkingsmeting tbv 0 meting	06-Feb-19	22-Dec-21	750,0d	
A1310	0 meting	22-Dec-21		0,0d	
Uitvoeren funderingsherstel		06-Feb-19	01-Sep-21	670,0d	
A1320	Uitvoeren funderings onderzoek / opstellen CFO (indien niet aanwezig)	06-Feb-19	26-Jun-19	100,0d	
A1330	Voorbereiden uitvoer funderingsherstel, inc. jurische procedures	26-Jun-19	16-Sep-20	320,0d	
A1340	Uitvoeren funderingsherstel	16-Sep-20	01-Sep-21	250,0d	
Uitvoeren walmuur vernieuwing kade 1		13-May-20	07-Dec-22	670,0d	
A1360	Voorbereidingsfase	13-May-20	13-Jan-21	175,0d	
A1370	Ontwerpfase	13-Jan-21	04-Aug-21	145,0d	
A1380	Aanbesteding	04-Aug-21	22-Dec-21	100,0d	
A1390	GSU	22-Dec-21		0,0d	
A1400	Uitvoering	22-Dec-21	07-Dec-22	250,0d	
A1410	GEU		07-Dec-22	0,0d	
Uitvoeren walmuur vernieuwing kade 2		07-Feb-17	02-Sep-19	670,0d	
A1430	Voorbereidingsfase	07-Feb-17	09-Oct-17	175,0d	
A1440	Ontwerpfase	10-Oct-17	30-Apr-18	145,0d	
A1450	Aanbesteding	01-May-18	17-Sep-18	100,0d	
A1460	GSU	18-Sep-18		0,0d	
A1470	Uitvoering	18-Sep-18	02-Sep-19	250,0d	
A1480	GEU		02-Sep-19	0,0d	
Bouwprotocol van toepassing op beide kades, inclusief funderingsherstel		07-Feb-17	07-Dec-22	1521,5d	
Verzakkingsmetingen volgens bouwprotocol		07-Feb-17	22-Dec-21	1271,5d	
A1500	Aanbesteden plaatsen meetbouten	07-Feb-17	08-Mar-17	21,5d	
A1510	Meten zakkingsnelheid dmv hoogtemetingen	08-Mar-17	06-Feb-19	500,0d	
A1520	Zakking is matig tot groot, >3mm per jaar		06-Feb-19	0,0d	
A1530	Verzakkingsmeting tbv 0 meting	06-Feb-19	22-Dec-21	750,0d	
A1540	0 meting	22-Dec-21		0,0d	
Uitvoeren funderingsherstel		06-Feb-19	01-Sep-21	670,0d	
A1550	Uitvoeren funderings onderzoek / opstellen CFO (indien niet aanwezig)	06-Feb-19	26-Jun-19	100,0d	
A1560	Voorbereiden uitvoer funderingsherstel, inc. jurische procedures	26-Jun-19	16-Sep-20	320,0d	
A1570	Uitvoeren funderingsherstel	16-Sep-20	01-Sep-21	250,0d	
Uitvoeren walmuur vernieuwing beide kades		13-May-20	07-Dec-22	670,0d	
A1580	Voorbereidingsfase	13-May-20	13-Jan-21	175,0d	
A1590	Ontwerpfase	13-Jan-21	04-Aug-21	145,0d	
A1600	Aanbesteding	04-Aug-21	22-Dec-21	100,0d	
A1610	GSU	22-Dec-21		0,0d	
A1620	Uitvoering	22-Dec-21	07-Dec-22	250,0d	
A1630	GEU		07-Dec-22	0,0d	

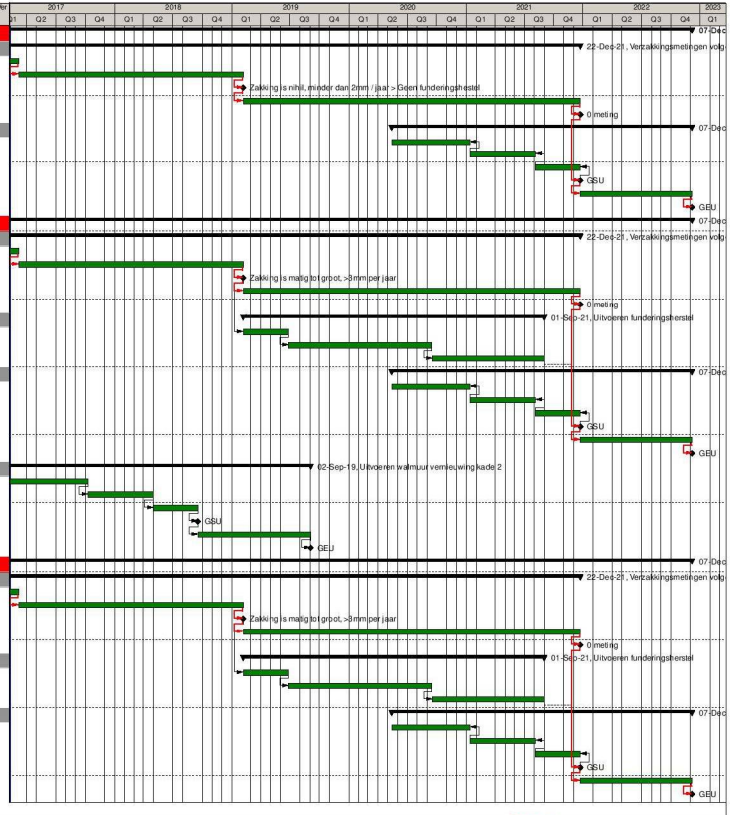

Printdatum28-Feb-17
Peildatum 07-Feb-17
Opmaak DN Walmuur scenario's
Standaardplanning:

Scenario's bouwprotocol Jacob Cats en Marnixkade

Gemeente Amsterdam
