[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 7:03
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: trillingsmeter Grimburgwal

Urgentie: Hoog

Om 9.00 uur even bespreken?

Groeten[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 16:44
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: trillingsmeter Grimburgwal
Urgentie: Hoog

Goedemiddag[redacted]

Wij zijn bij Bouwrisk nagegaan wat de mogelijkheden van jouw voorstel zijn. Het aanbrengen van bevestigingspunten aan de buitenzijde is al een opgave, omdat de aangegeven punten boven water zitten.
Het verhangen van de meters wordt hiermee dagelijks ook erg bewerkelijk en praktisch niet te doen. Tevens bestaat het risico dat de meter te water kan raken en de meter kan je gewoonweg niet kwijt.

Ons voorstel is of jij z.s.m. na kan gaan of de meters inpandig geplaatst kunnen. Het lijkt ons ook beter om vaste trillingsmeters te hangen, anders moet je elke dag het gebouw in en uit, weet niet of dit wenselijk is.
Graag aangeven hoeveelheid meters en op welke locatie inpandig. Wij willen dan ook graag toestemming voor het plaatsen van de meters inpandig en toestemming tot toegang van het gebouw.

Hoor graag van je. Hier is zeker spoed bij gebaat aangezien wij maandag willen starten met het werk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkvoorbereider

H.v. Steenwijk b.v.

Spaar[redacted]
[redacted]

E-mail | **Website** | **Kaart**

Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail

kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 9:19
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: trillingsmeter Grimburgwal

[redacted]

Hierbij de locatie:

- op 4 plekken bevestigingspunten aanbrengen (zie geel in onderstaand figuur) en dan de trillingsmeter met de werkzaamheden mee verplaatsen.

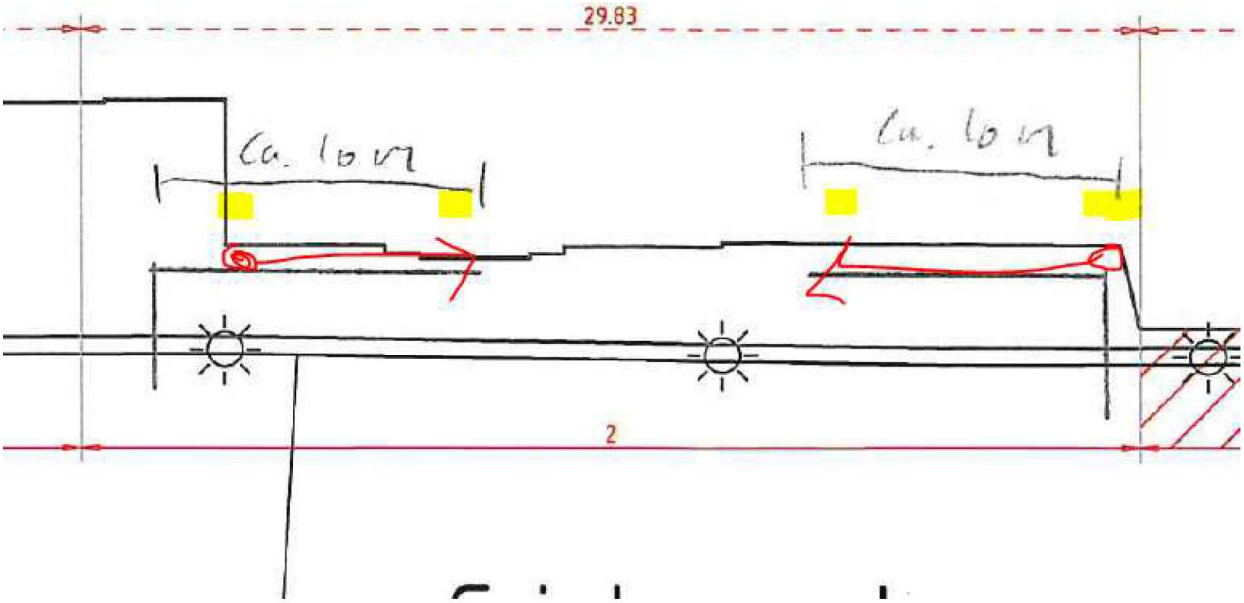

Ps: wij hebben toestemming van bevoegd gezag en UVA.

Groet,

[redacted]
[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 10:43
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: trillingsmeter Grimburgwal

Fe[redacted]

Nadere info volgt nog, maar zoals gezegd kan je eea wel al inplannen met Bouwrisk.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:59
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: trillingsmeter Grimburgwal

[redacted]

Kun jij nog aangeven waar dit dan moet? Ik neem aan dat dit vanuit de verzekeraar een vereiste is? Zij stellen daar normaal gezien eisen aan, het is handig te weten wat de bandbreedte is om te weten of we aan hun eisen voldoen. Voldoen we dat niet, dan is het een zinloze exercitie namelijk.

Ik zal [redacted] vragen dit bij bouwrisk te leggen of wij dit maandag aan kunnen brengen.
Hebben jullie al een toestemming van het UvA om deze trillingsmeters in het gebouw aan te brengen? Deze zie ik ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.

[redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:38
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: trillingsmeter Grimburgwal

[redacted]

Ivm het intrillen van het prolock scherm tpv Grimburgwal. Deze komt niet heel diep te staan maar gezien de dichte nabijheid van de monumentale panden is het voor de zekerheid verstandig om hierbij toch een trillingsmeter te laten plaatsen (1 stuks die dan verplaatst kan worden per kant) en de trillingen te monitoren.

Bij deze alvast het verzoek om maandag ook een trillingsmeter op te hangen aan UVA/ GBW. Post 802010

Grenswaarde aanhouden voor cat 2 monumentaal (onderste regels)

Tabel 3: Grenswaarden conform SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken 2017

SBR-bouwwerk-categorie	Staat	Frequentie [Hz]	Grenswaarde schade (rekenwaarde) [mm/s]	Grenswaarde voor meting (rekenwaarde) [mm/s]
1	Normaal	30	12	7,5
		40	16	10
1	Monumentaal/ gevoelig	30	7,1	4,4
		40	9,4	5,8
2	Normaal	30	4,0	2,5
		40	5,0	3,1
2	Monumentaal/ gevoelig	30	2,3	1,4
		40	2,9	1,8

Groet,

[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.
