Gemeente
Amsterdam

[redacted]


Bespreking BLVC-verlenging (na 1 okt 2022)

Samenvatting van het samenkomen op maandag 20 september 2021


[redacted]

22-09-2021

Faseringen

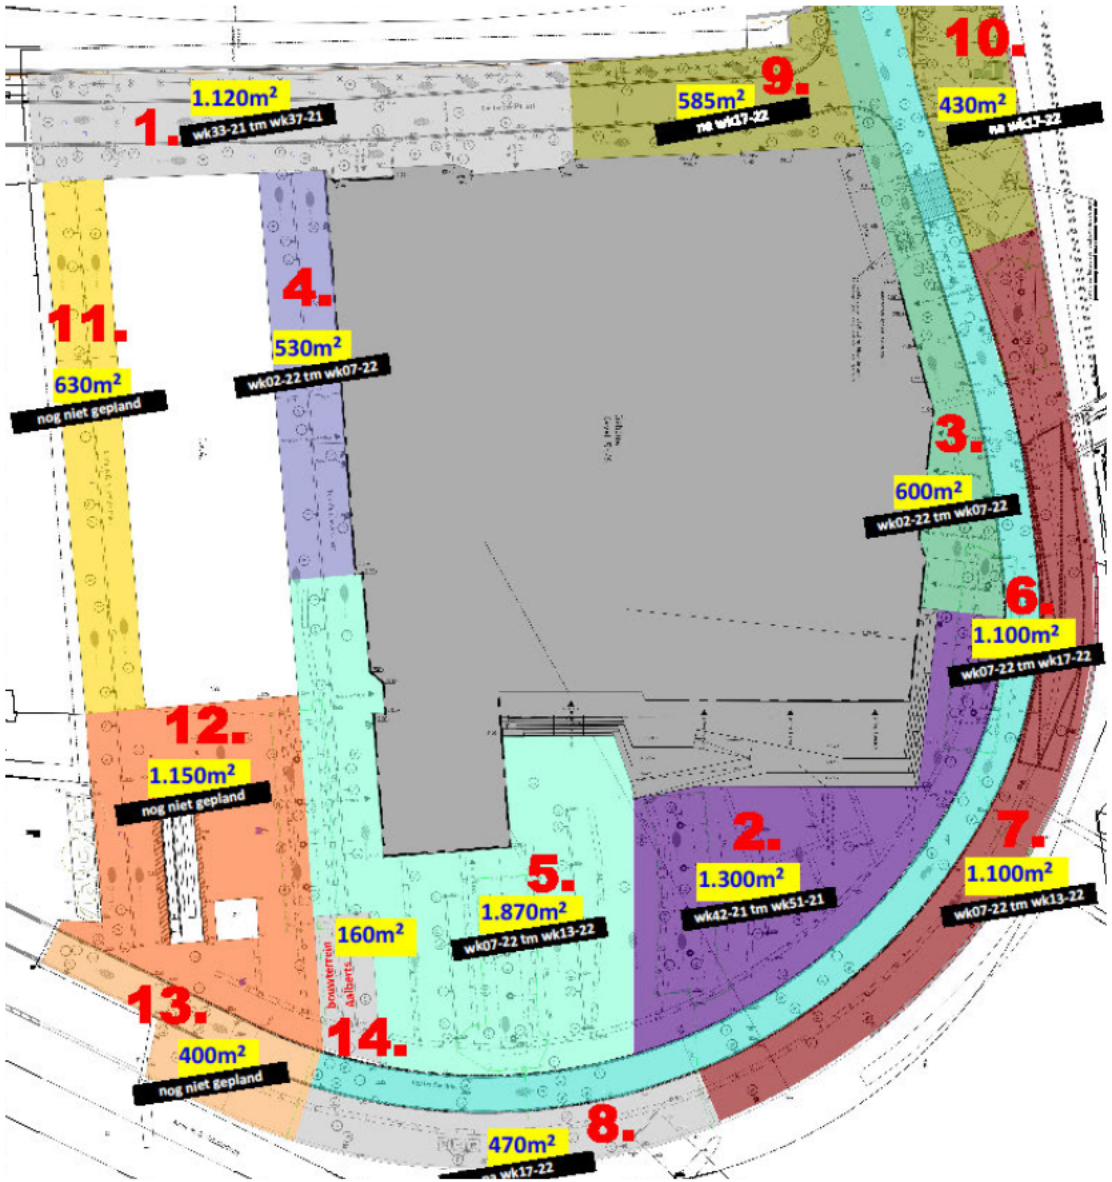
1.
1.120m²
wk33-21 tm wk37-21
9.
585m²
na wk17-22
10.
430m²
na wk17-22
11.
630m²
nog niet gepland
4.
530m²
wk02-22 tm wk07-22
3.
600m²
wk02-22 tm wk07-22
6.
1.100m²
wk07-22 tm wk17-22
12.
1.150m²
nog niet gepland
2.
1.300m²
wk42-21 tm wk51-21
7.
1.100m²
wk07-22 tm wk13-22
5.
1.870m²
wk07-22 tm wk13-22
160m²
13.
400m²
nog niet gepland
14.
8.
470m²
wk17-22


Faseringen

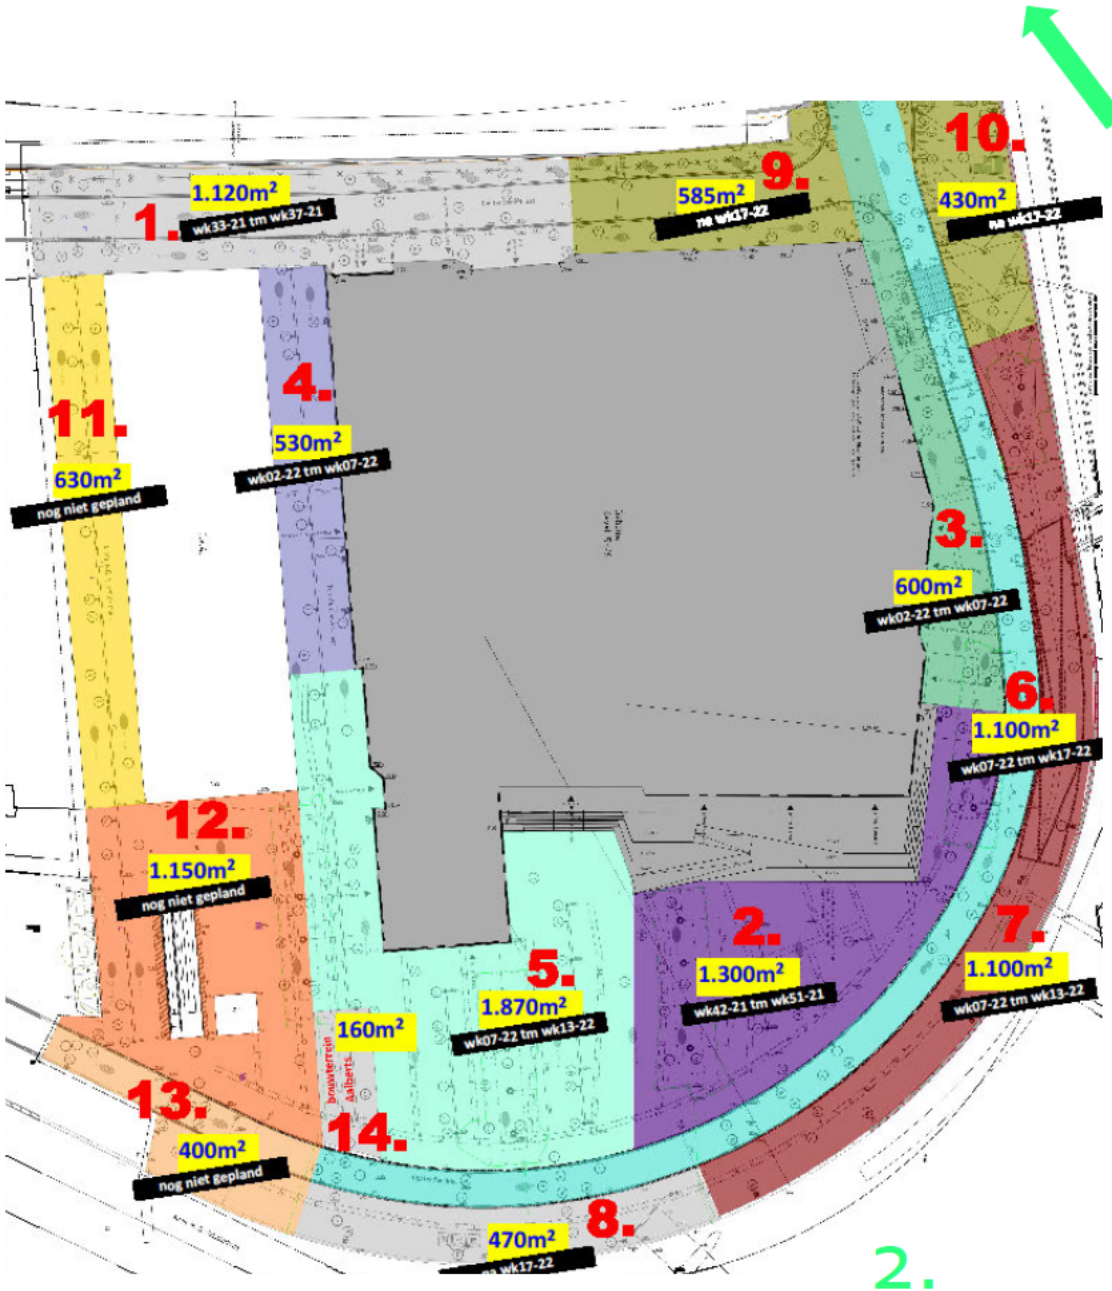

Gemeente vertegenwoordigd belangen stakeholders:

1. Voetgangers & fietsers over Oostertoegangsbrug.
2. Recreatieve kade rand
3. Hotel Brugwachtershuisje
4. Touringcars Ruijterkade oost


Faseringen

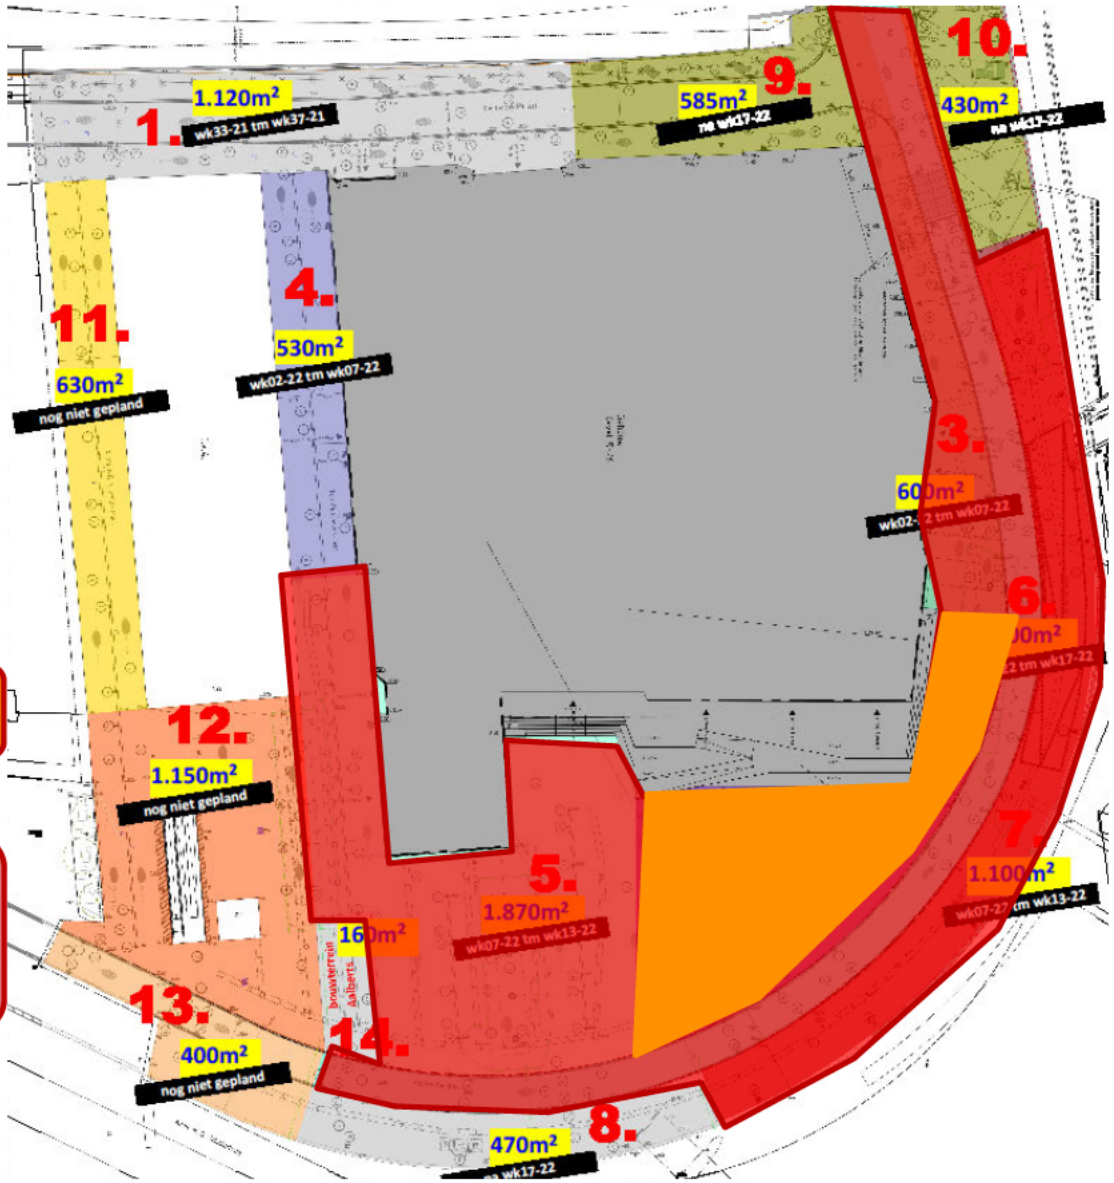

Begin Q4 wordt begonnen met fase 2. (paars -> hier oranje)

Na wegrijden bouwkraan. Kan in week zeven gestart worden met faseringswerkzaamheden week 7-22.Totaal 15 weken.

Faseringen

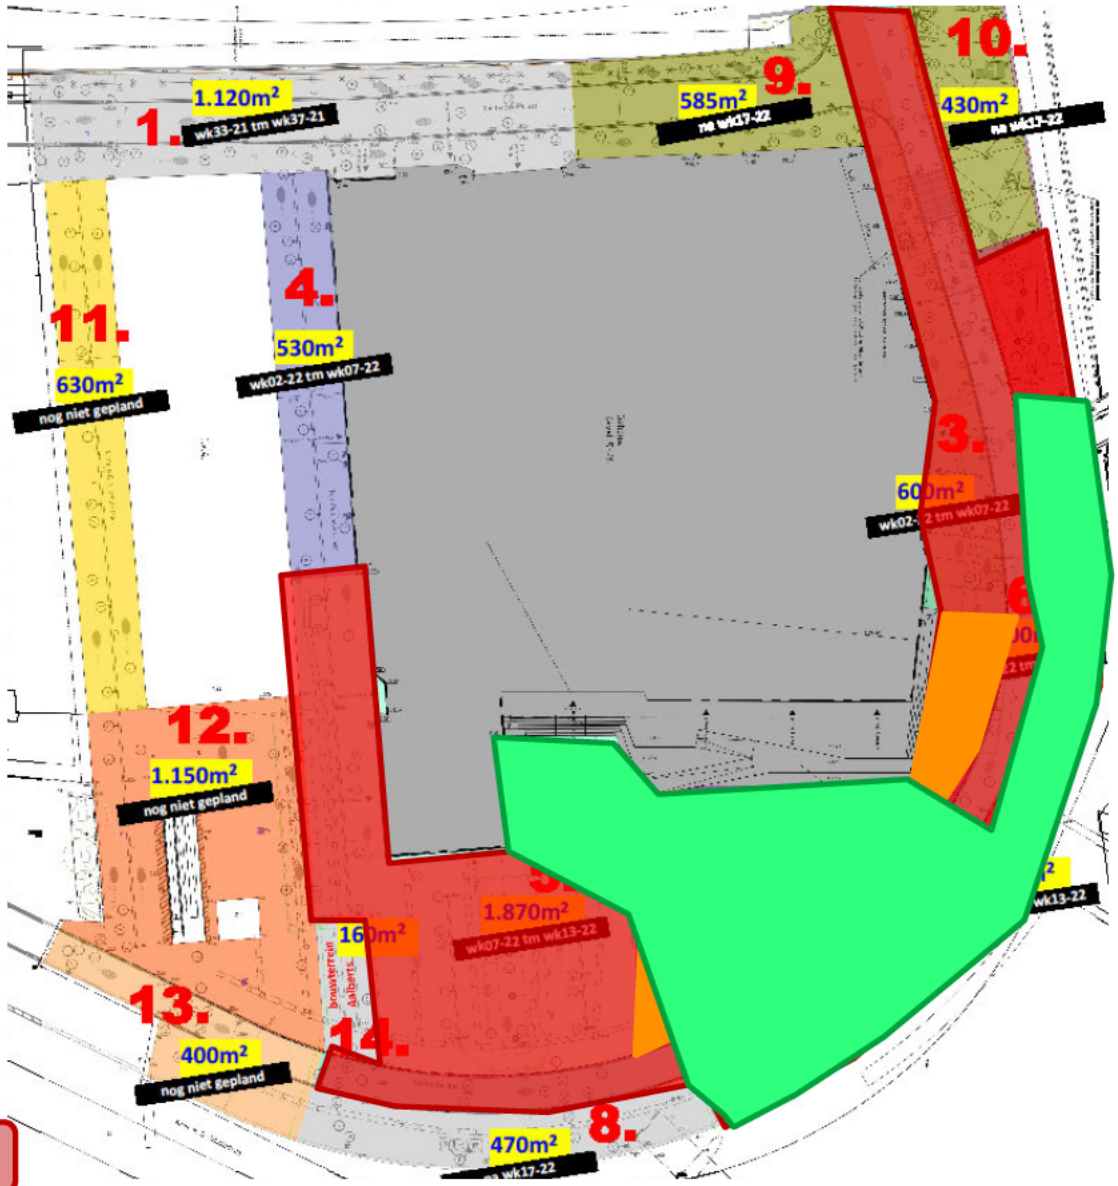

Aannemer gaat kijken of het mogelijk om minder dan de helft eerder op te leveren. Voor week 14 en de rest pas week 22.

werkzaamheden week 7-13.
Opleveren week 13
Totaal 5 weken

Werkzaamheden tot week 22

Faseringen

Gemeente vertegenwoordigd belangen stakeholders:

1. Voetgangers & fietsers over Oostertoegangsbrug.
2. Recreatieve kade rand
3. Hotel Brugwachtershuisje
4. Touringcars Ruijterkade oost

Naast opleveren Openbare Ruimte tbv Oosterdraaibrug. Worden op deze manier ook de kade en Brugwachtershuisje sneller bereikbaar.
Voor de Touringcars kunnen vanaf oktober 3/5 van de betonblokken weg en vanaf week 10 alle blokken weg.

werkzaamheden week 7-13.
Opleveren week 13
Totaal 5 weken

Werkzaamheden tot week 22
Totaal 8 weken + de weken voor de 7de week. (Q4 2021)

