Gemeente Amsterdam

Definitief
Versie 1
22 april 2025

Opsteller	Goedgekeurd en vrijgegeven	Paraaf	Datum
5.1, 2, e	5.1, 2, e		22-04-2025

Notitie: wijziging op BLVC-uitvoeringsplan:

Tijl Uilenspiegelbuurt: Groot Onderhoud
Wijziging: fase 1, Vervangen gasleiding
WIOR-nummer: W21022220

Inleiding

Vanuit het laatste coördinatieoverleg met de diensten en bedrijven voor startuitvoering is aangegeven door Liander Gas meer ruimte nodig te hebben dan vooraf was aangegeven. Het betreft de gietijzeren gasleiding in het voetpad die in fase 1 wordt vervangen. Vanwege de grote diameter van de gasleiding dienen t.h.v. voetpad Bos en Lommerweg, twee blazen te worden geplaatst. Dit neemt dermate veel werkruimte in beslag dat het voetpad volledig wordt gestremd evenals het fietspad voor oostelijke richting langs de Bos en Lommerweg, voor drie dagen wordt gestremd. Dit heeft als gevolg/wijziging dat de voetgangers worden omgeleid en dat het (brom)fietsverkeer langs het werkterrein wordt geleid.

In deze notitie wordt ingegaan op de nog te plaatsen elementen met daar bij de nieuwe eindoplevering.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in fase 1 conform huidige planning week 23, 2 juni 2025 t/m week 30, 24 juli 2026.
Wijziging: De aanpassen van werkterrein vindt plaats van 30 juni t/m 18 juli. Het voetpad wordt voor deze periode afgesloten. Het fietspad wordt afgesloten van 1 t/m 3 juli.

Omgevingsprojecten en evenementen

De wijziging heeft geen invloed op de reeds opgenomen omgevingsprojecten en evenementen.

Wijziging: Aanpassen werkterrein vervangen gasleiding

Afsluiting voetpad: Uitvoeringsduur en planning: 9 weken, 30 juni t/m 18 juli
Afsluiting fietspad: Uitvoeringsduur en planning: 3 dagen, 1 juli t/m 3 juli
Beschrijving werkzaamheden: opnemen verharding, opnemen fundering, grondwerk, aanbrengen blazen, vervangen gasleiding, aanbrengen fundering en aanbrengen tijdelijke verharding.

Afsluiting voetpad: 30 juni t/m 18 juli
Wanneer de gaswerkzaamheden worden uitgevoerd wordt het voetpad tot de gevel afgesloten en is er geen doorgang voor voetgangers. De voetgangers worden om het werkterrein geleid, zie figuur 1.

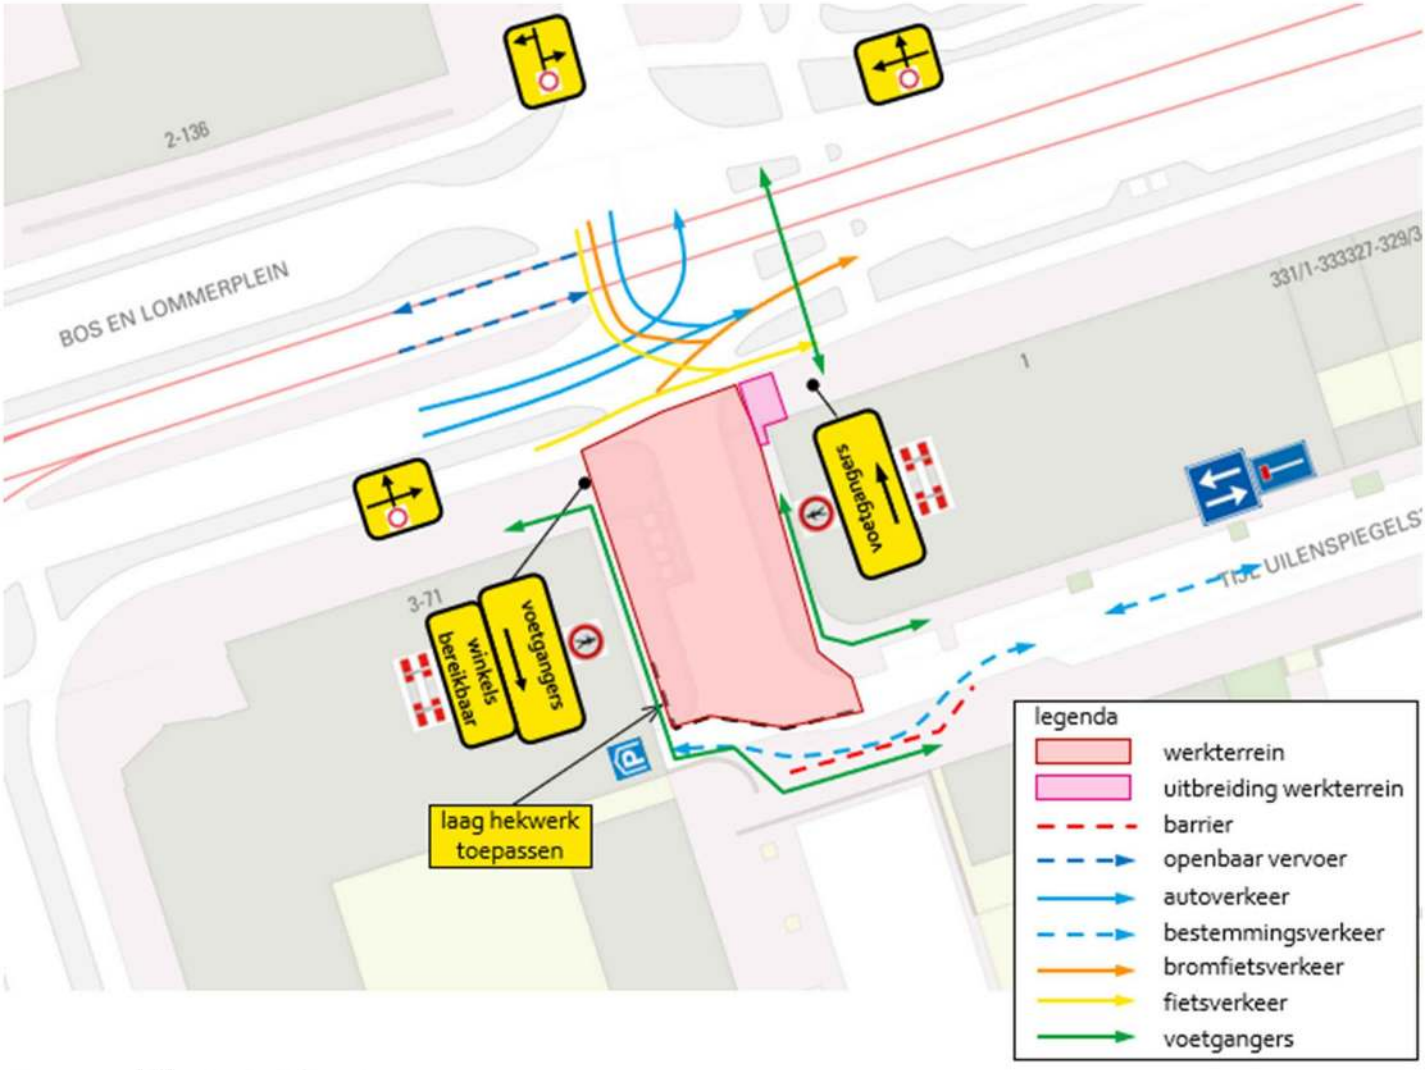

Figuur 1: Tijdelijke situatie tijdens uitvoering

Afsluiting fietspad: 1 juli t/m 3 juli

Tijdens het aanbrengen van de blazen wordt naast het voetpad ook het fietspad Bos en Lommerweg afgesloten. Om doorgang voor (brom)fietsverkeer te houden wordt de middengeleider vrijgemaakt van de twee palen met bebording en toegankelijk gemaakt voor (brom)fietsverkeer. Op de haaientanden langs de rijbaan worden betonnen barriers geplaatst als fysieke scheiding en deze sluiten aan op de spanmast zodat hier niet tegenaan gereden wordt. Het middeneiland wordt deels verlaagd. Het fietsverkeer komt weer terug op het fietspad voor de voetgangersoversteek. Deze blijft dan ook in bedrijf, zie figuur 2.

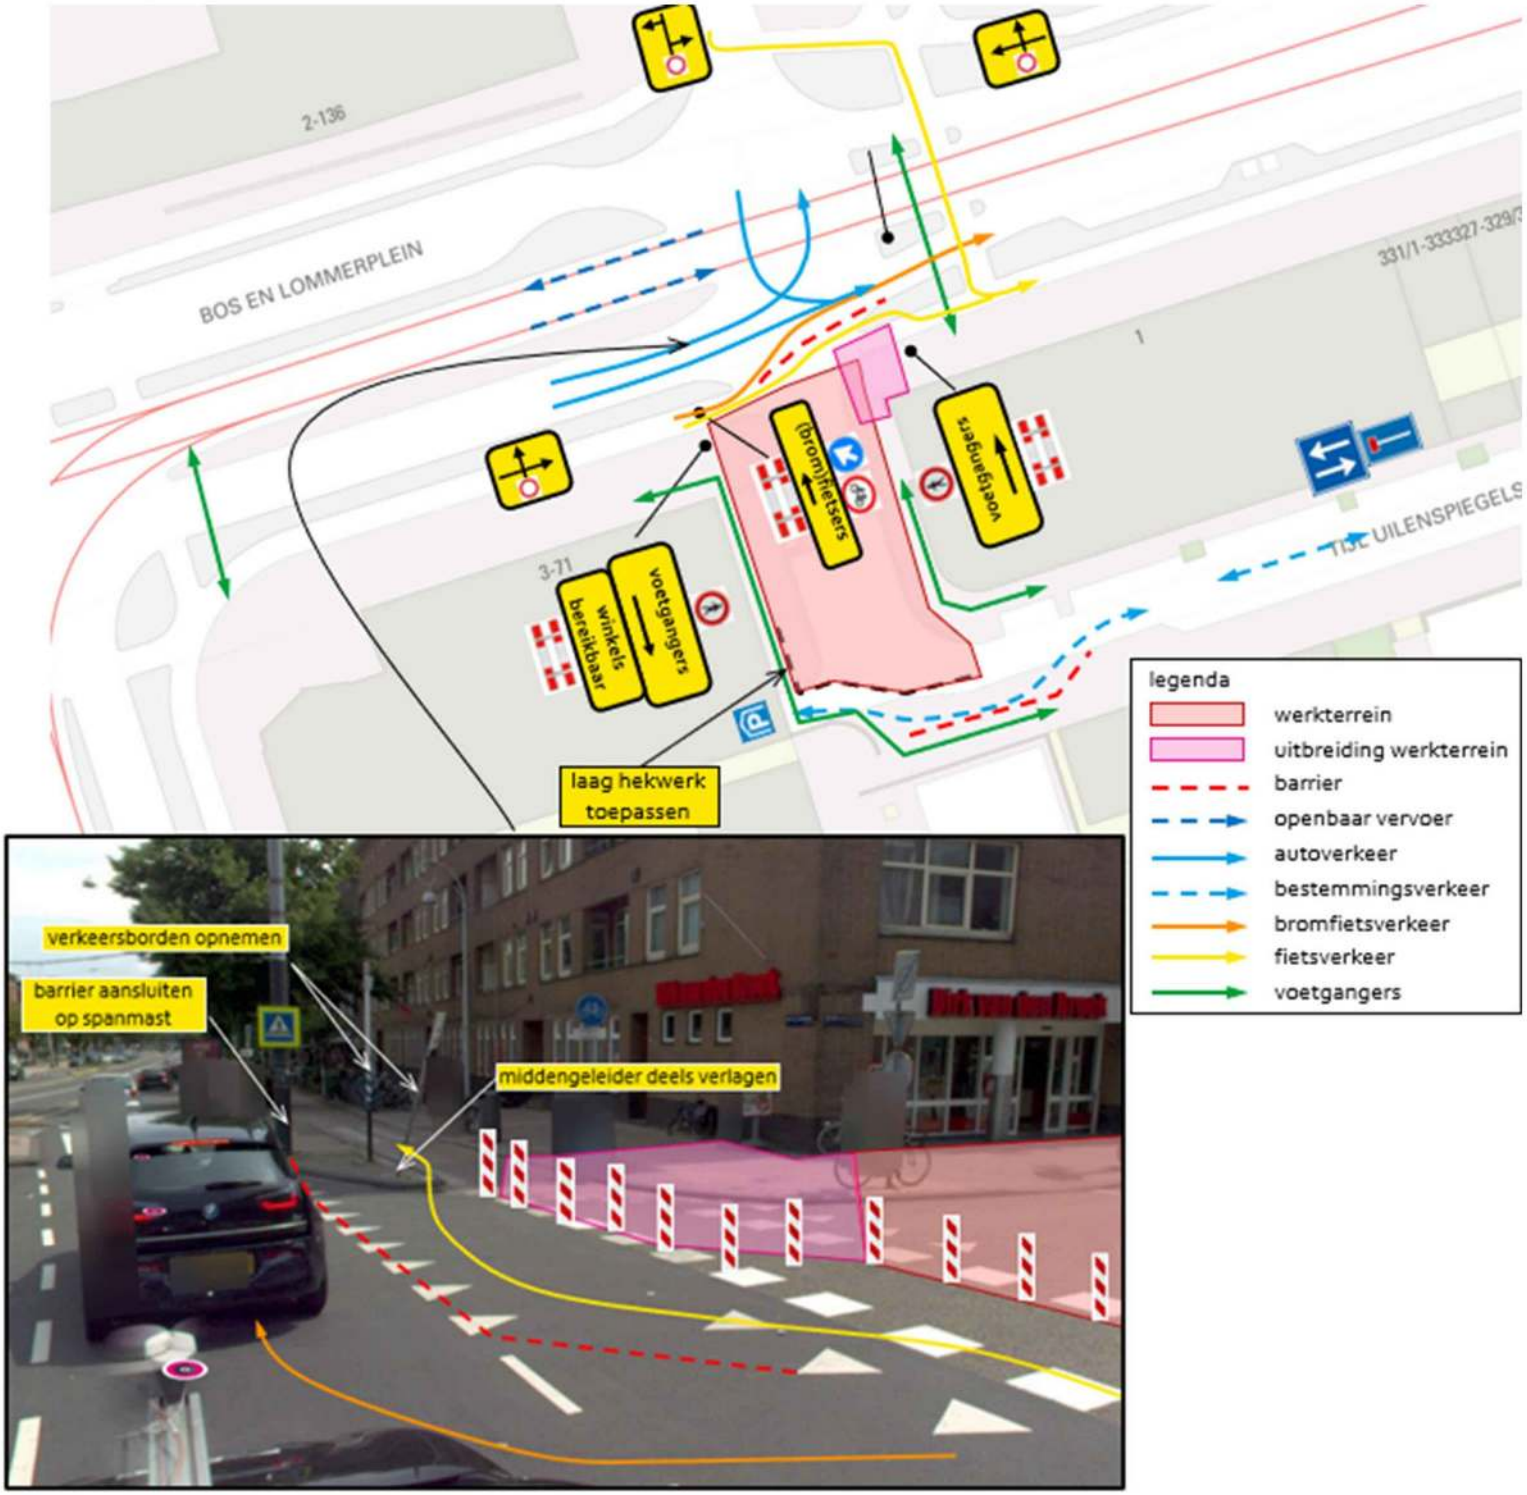

Figuur 2: Tijdelijke situatie tijdens uitvoering

Verkeerssituatie
Het werkvak wordt rondom met bouwhekken afgezet. Op de kopse kanten van het werkterrein komt een schrikhek voorzien van verbodsbord (geslotenverklaring).

Voetgangers
De voetgangers op Bos en Lommerweg met bestemming Dirk van den Broek kunnen de winkel bereiken via Tijl Uilenspiegelstraat. Voetgangers vanuit west kunnen om het werkterrein en de voetgangers vanuit oost worden omgeleid via de onderdoorgang, zie figuur 3.



Fietsers
Het fietsverkeer behoudt doorgang.

Verkeersregelaar
Op Bos en Lommerweg t.h.v. kruisval trambaan Tijl Uilenspiegelstraat worden 2 verkeersregelaars ingezet, van 7.00 tot 19:00 uur, om het verkeer te begeleiden.

Communicatie

Communicatie geschied zoals opgenomen in BLVC-uitvoeringsplan.

Contactgegevens:
Contactpersoon voor vragen/opmerkingen is omgevingsmanager 5.1, 2, e ,
5.1, 2, e @amsterdam.nl, 5.1, 2, e te benaderen.
