**Verslag 18 overleg M&A + Omgevingsdienst**

| | Datum | Referentie |
|---|---|---|
| | 9 mei 2023 | 2203-17228- v 0.18 |
| **Behandeld door** | **Project** | |
| 5.1, 2, e | S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM | |

| **Aanwezig: 9-05-2023** | **Namens:** | **Afwezig:** |
|---|---|---|
| 5.1, 2, e | ARTIS | |
| | M&A Amsterdam | 5.1, 2, e |
| 5.1, 2, e | M&A Amsterdam | |
| 5.1, 2, e | Omgevingsdienst Amsterdam | |
| 5.1, 2, e | Verlaan en Bouwstra | |
| | OTH | 5.1, 2, e |
| 5.1, 2, e | Salverda | |
| | Salverda | 5.1, 2, e |
| 5.1, 2, e | BBN directievoerder | |
| | Salverda | 5.1, 2, e |
| 5.1, 2, e | Salverda | |
| 5.1, 2, e | Venema | |
| 5.1, 2, e | Rijksdienst cultureel erfgoed | |

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

| Punt | *Agendapunt* | *Actie door* |
|---|---|---|
| **18.01** | **Opening en mededelingen** | |
| 18.01 | 5.1, 2, e heet iedereen welkom en licht kort de nieuwe agendapunten voor dit overleg toe. | |
| 18.01.1 | 5.1, 2, e geeft complimenten aan het team over de benaderingen van diverse onderwerpen en overleggen bij het Aquarium project, dit is een voorbeeld binnen ARTIS hoe het bij andere projecten in de dierentuin zou moeten gaan. | Mededeling |
| **18.02** | **Verslag vorige verslag** | |
| | Verslag 18-04-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord. | |
| **18.03** | **Werkplannen** | |
| | Geen nieuwe meldingen. | |
| **18.04** | **Natuursteen gevel** | |
| | Onderzoek zandsteen, TNO maakt hiervan een rapportage. Deze zal t.z.t. gedeeld worden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan hier nogmaals achteraan. | 5.1, 2, e |
| | Bij de start van de werkzaamheden worden bij bewerking (uithakken voegen, reinigen en bepalen van voegkleuren) M&A uitgenodigd om dit te beoordelen, kansen zijn bij deze beoordeling om e.e.a. eventueel bij te kunnen sturen. | Salverda |

| | | |
|---|---|---|
| 18.04.1 | Het testen van reinigen met laser is uitgevoerd, de resultaten van de diverse gradaties zijn in het werk bekeken. Er is gekozen voor reiniging klasse 1 & 2. De vakman start binnenkort met het reinigen, de startdatum wordt gedeeld zodat het werk  Beoordeeld kan worden vanaf de start om wellicht nog kleine wijzingen te kunnen bespreken. | Vaststelling |
| 18.04.2 | Ook een proef met luchtgommen is uitgevoerd, deze is in het werk ook beoordeeld en akkoord bevonden. | Vaststelling |
| 18.04.3 |  | |

| | | |
|---|---|---|
| **18.05** | **Stucwerkgevel** | |
| 17.05.1 | Tijdens de rondgang zijn hier geen bijzonderheden opgemerkt, voortgang gaat volgens planvorming, kwaliteit van het werk is akkoord. | Vaststelling |
| **18.06** | **Daken** | |
| | Attiek: wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B | Salverda 5.1, 2, e |
| 17.06.1 | Het dak veiligheidssysteem (Irata) is akkoord met uitzondering van de positie van de koker op het middelste dakvlak (dak timpaan)<br>Positie hiervan wordt van te voren afgestemd. | Salverda |
| 18.06.1 | De kleur van de gootlijst is opgezet. De definitieve kleur is bepaald op Keim S107 . | Vaststelling |

| | | |
|---|---|---|
| 18.06.2 | De hoge vels volgens onderstaand detail is niet maakbaar in de praktijk, in het werk is een proefstuk gemaakt met de maximale hoogte in combinatie met ronde dak. De vels kan maximaal 75mm worden opgezet. Op locatie is dit bekeken en de wijziging is akkoord bevonden 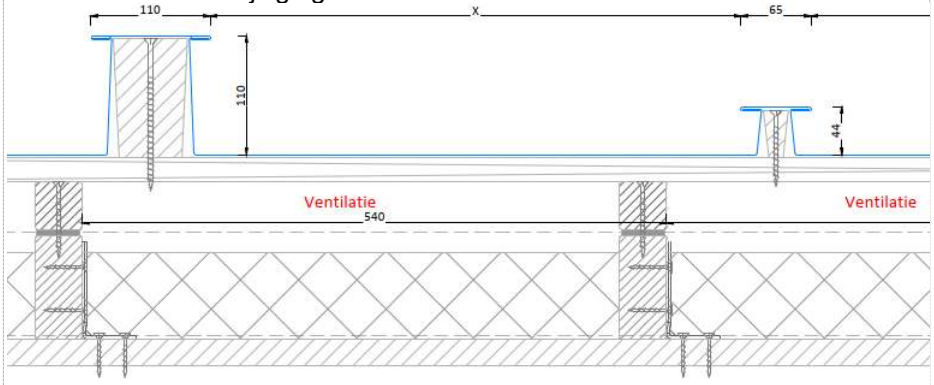  | Vaststelling |
| **18.07** | **Binnenafbouw** | |
| 16.07.1 | De schoren t.b.v. het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. Detail nog aanleveren. | Salverda |
| 17.07.1 | Stukwerk: delen stukwerk worden verwijderd ivm loszittende lagen, nieuwe afwerkingen, zoutbelaste onderdelen. Vooraf met V&B doornemen waar wat verwijderd wordt en waar wat kan worden gehandhaafd.<br>Momenteel worden hiervoor onderzoeken uitgevoerd, de komende periode moet dit meer inzicht geven. | |
| **18.08** | **Glas/Kozijnen** | |
| | Achter kozijnen ruimte Stramien 22-26 / A (nabij ruimte -1.18) zit een betonvloer, Uitzoeken hoe we hier mee omgaan en een voorstel aan 5.1, 2, e doen. Figuurglas, Overloop van transparantie, er is bepaald door OTH dat er standaard glas wordt geplaatst, in de praktijk gaan we bekijken of het hinderlijk is dat er een constructie zichtbaar is en wellicht dan nog toevoegingen nodig zijn. | vaststelling |
| 18.08.1 | De kleur van de kozijnen is opgezet, de definitieve kleur is bepaald op RAL 1015 romig beige-geel. | Vaststelling |
| 18.08.2 | De kleur van het raamhout is opgezet, de definitieve kleur is bepaald op Sikkens S 4550-Y40R. | Vaststelling |
| **18.09** | **Overige bespreekpunten** | |
| | | |
| **18.10** | **Rondgang bouw** | |
| | Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. | |
