
Planning Centrum Nieuw West / Meervaart

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
331	**Meervaart**			
332	**Locatieonderzoek en Programmering**			
333	**Locatieonderzoek 1**			
334	opstellen opdrachtformulering	4 wkn	11-2-19	8-3-19
335	DB akkoord	3 wkn	11-3-19	29-3-19
336	Staf KC + RD akkoord	3 wkn	11-3-19	29-3-19
337	opstellen uitvraag	4 wkn	11-3-19	5-4-19
338	opdracht uit	0 wkn	6-5-19	6-5-19
339	locatieonderzoek / inpassing + raming 1	26 wkn	6-5-19	1-11-19
340	advies van SIRK + SAP	0 wkn	1-11-19	1-11-19
341	brainstormsessie	0 wkn	29-8-19	29-8-19
342	inspraakavond	0 wkn	9-7-18	9-7-18
343	**Programmering**			
344	opstellen programma / invulling gebruik Meervaart / raming	26 wkn	6-5-19	1-11-19
345	**Bestuurlijke afstemming**			
346	SG Meervaart	1 wk	2-10-19	8-10-19
347	Staf KC + RD (informatief)	0 wkn	17-10-19	17-10-19
348	**Locatieonderzoek + haalbaarheid optie 3a**			
349	Locatieonderzoek en haalbaarheid optie 3a (concept)	19 wkn	17-10-19	26-2-20
350	**Vaststelling Programmering + Voorkeurslocatie**			
351	SG Meervaart	0 wkn	2-3-20	2-3-20
352	locatiebezoek	0 wkn	6-3-20	6-3-20
353	advies CIRK	4 wkn	27-2-20	25-3-20
354	Staf KC + RD	0 wkn	6-4-20	6-4-20
355	RvT Meervaart	0 wkn	1-4-20	1-4-20
356	Staf Mauer / Bobeldijk	0 wkn	13-4-20	13-4-20
357	SD cie	4 wkn	13-4-20	8-5-20
358	Staf KC + RD	0 wkn	18-5-20	18-5-20
359	B&W akkoord	0 wkn	2-6-20	2-6-20
360	Commissie 1+2	3 wkn	2-6-20	22-6-20
361	Gemeenteraad	3 wkn	23-6-20	13-7-20



Planning Centrum Nieuw West / Meervaart

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
362	**Programma van Eisen Meervaart**			
363	**Opstellen PvE + kostenraming**			
364	opstellen ruimtelijk PvE + Technisch PvE + kostenraming	18 wkn	2-6-20	5-10-20
365	**Vaststelling Programma van Eisen Meervaart + financiele paragraaf**			
366	SG Meervaart	1 wk	13-10-20	19-10-20
367	Staf KC + RD akkoord	2 wkn	20-10-20	2-11-20
368	**Bouwkundig Ontwerp**			
369	**Aanbesteding en Gunning Ontwerp Nieuwe Meervaart**			
370	opstellen aanbestedingsdocumenten / uitvraag	9 wkn	6-10-20	7-12-20
371	samenstellen jury / beoordelingscommissie	9 wkn	6-10-20	7-12-20
372	voorselectie architecten / adviseurs	4 wkn	8-12-20	4-1-21
373	opstellen ontwerpvoorstel / SO	9 wkn	5-1-21	8-3-21
374	beoordeling	4 wkn	9-3-21	5-4-21
375	gunning en opdracht	0 wkn	5-4-21	5-4-21
376	**Bouwkundig Ontwerp**			
377	opstellen VO + raming	17 wkn	6-4-21	2-8-21
378	toetsing VO	4 wkn	3-8-21	30-8-21
379	SG Meervaart	1 wk	31-8-21	6-9-21
380	Staf KC + RD akkoord	2 wkn	7-9-21	20-9-21
381	opstellen DO + raming	17 wkn	31-8-21	27-12-21
382	toetsing DO	4 wkn	28-12-21	24-1-22
383	SG Meervaart	1 wk	25-1-22	31-1-22
384	Staf KC + RD akkoord	2 wkn	1-2-22	14-2-22
385	**Bestemmingsplan / Omgevingsvergunning**			
386	start uitgebreid WABO procedure	0 wkn	14-2-22	14-2-22
387	Afwijkingsbesluit	14 wkn	15-2-22	23-5-22
388	Omgevingsvergunning	14 wkn	24-5-22	29-8-22
389	Bzwaaar en beroep	6 wkn	30-8-22	10-10-22
390	OVG met rechtskracht	0 wkn	10-10-22	10-10-22
391	**Realisatie**			
392	Start realisatie nieuwbouw de Meervaart	0 wkn	24-10-22	24-10-22

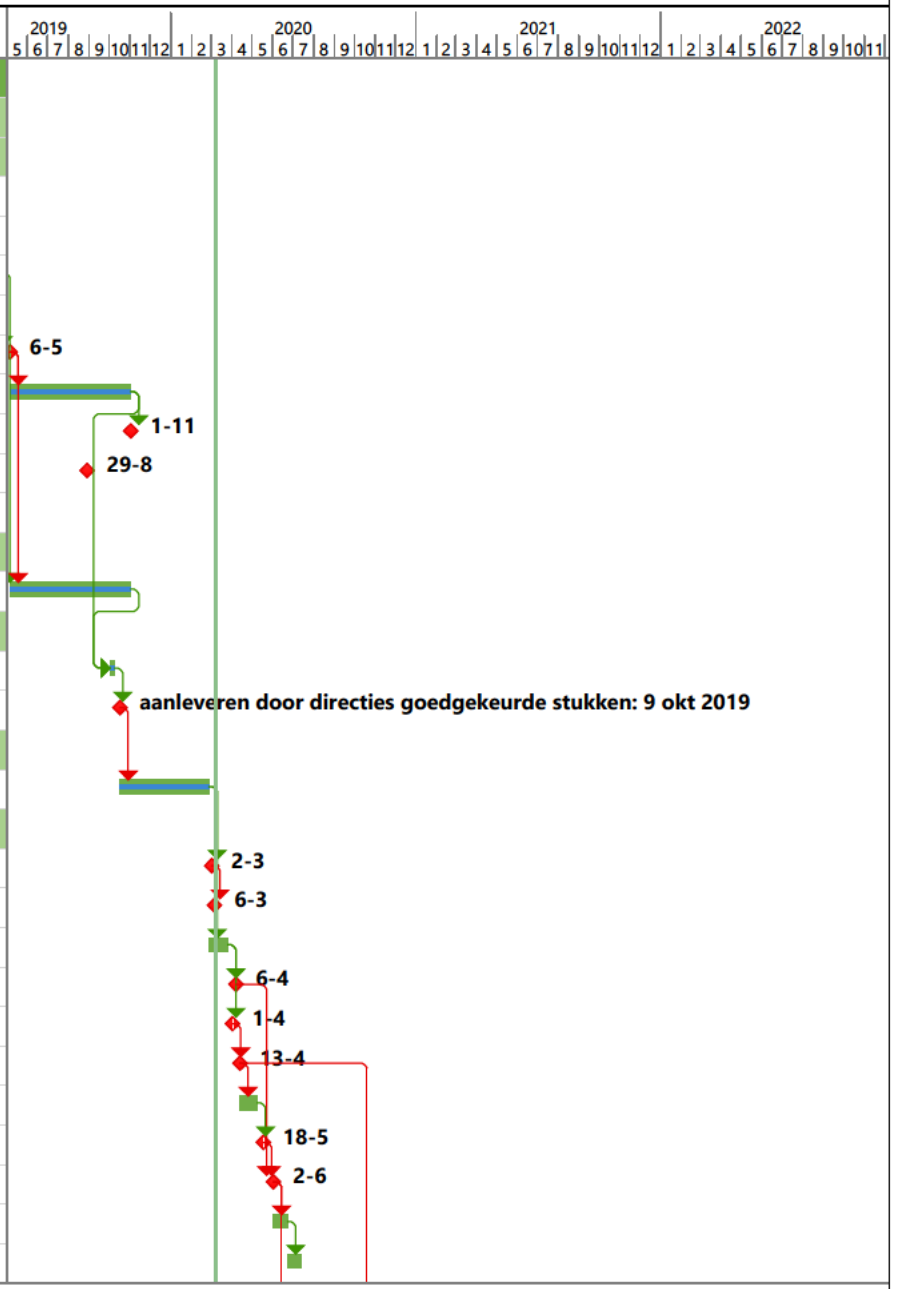
